



## ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. PF/AN-IV/010/16

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 01 DE JUNIO DE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAX., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL C. ING. LUIS ALBERTO CUEVAS PEREZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

EL ING. FAUSTO JESÚS CISNEROS HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA "SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS S.A. DE C.V."

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

### I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NÚMERO DE CONTRATO:	PF/AN-IV/010/16
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	20 DE ENRO DEL 2016
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD" UBICADA EN SAN JOSÉ XICOTÉNCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA, TRABAJOS CONSISTENTES: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 323,102.71 (TRECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO DOS PESOS 71/100 M.N.), INCLUYE EL 16% DE I.V.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	45 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	21 DE ENERO DEL 2016
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	05 DE MARZO DEL 2016

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





## II.- MODIFICACIONES.

CONVENIO MODIFICATORIO	-
A LO ORIGINALMENTE PACTADO	-
MONTO REAL EJERCIDO:	\$ 318,343.15 (TRECIENTOS DIECIOCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO
FECHA DE INICIO REAL:	21 DE ENERO DEL 2016
FECHA DE TERMINACION REAL:	05 DE MARZO DEL 2016
PLAZO DE EJECUCION REAL:	45 DIAS NATURALES

## III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIÓN NO.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO	FECHA DE PAGO
		DEL		AL				
1	16-MAR-2016	DEL	21/ENE/16	AL	04/FEB/16	\$ 59,238.30	\$ 59,238.30	TRAMITE DE PAGO
2	16-MAR-2016	DEL	05/FEB/16	AL	19/FEB/16	\$60,468.99	\$119,707.29	TRAMITE DE PAGO
3	13-ABR-2016	DEL	20/FEB/16	AL	29/FEB/16	\$137,753.76	\$257,461.05	
4	26-ABR-2016	DEL	01/MAR/16	AL	05/MAR/16	\$60,882.10	\$318,343.15	
<b>TOTAL</b>							<b>\$318,343.15</b>	
<b>MONTO A CANCELAR:</b>							<b>\$4,759.56</b>	

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1914



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$13,766.51 (TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.) INCLUYE EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 1.

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCION DE VOLUMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$79,408.15 (SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 15/100 M.N.) INCLUYE EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 2.

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CONCEPTOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$60,882.08 (SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.) INCLUYE EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 3.

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1. SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA, QUE SE DETERMINARON DE LA VERIFICACION DE LA OBRA SIENDO ESTOS LOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN Y QUE SE SOPORTA CON SUS CORRESPONDIENTES NÚMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRÁFICO, CROQUIS, Y AUTORIZACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES P.U. ANEXO NÚMERO 3.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD ESTIMADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD EJECUTADA REAL	DIFERENCIA A PAGA	IMPORTE
40901	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO EN COLOR GRIS PERLA DE 3" 1/2" SEGÚN PROYECTO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE GALERÍA, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	\$407.98	9.47	\$3,863.57	11.75	2.28	\$930.14

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011-2014

**SECODUVI**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

51701	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO, INCLUYE REHABILITACIÓN DE CANALIZACIÓN, REVISIÓN Y/O CAMBIO DE CONDUCTORES (CABLE THW NOS. 10 Y 12 CONDUMEX O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN), CABLE DE PUESTA A TIERRA DE CONTACTO CAL. 12 CON FORRO BLANCO O GRIS CLARO, CAMBIO DE APAGADOR Y/O CONTACTO Q TICINO LINEA MAGIC O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA O REPOSICIÓN DE TAPAS FALTANTES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	\$611.52	1	\$611.52	4	3	\$1,834.56
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$2,764.70</b>
<b>I.V.A.</b>								<b>\$442.35</b>
<b>TOTAL</b>								<b>\$3,207.05</b>

2. SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA QUE SE DETERMINARON UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION DE LA OBRA Y SE OBSERVA QUE HAY VOLÚMENES COBRADOS QUE SE DEDUCEN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD ESTIMADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD EJECUTADA REAL	DIFERENCIA A DEDUCIR	IMPORTE
31887	ALACENA DE MADERA HASTA 0.80 M DE ANCHO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MARCO METÁLICO O MADERA Y CHAMBRANA, PUERTAS CORREDIZAS O ABATIBLES, HASTA DOS ENTREPAÑOS POR METRO DE ALTURA, GUÍAS, CARRETILLAS, BISAGRAS, BIBELES, ENTREPAÑO INTERMEDIO Y SOPORTES O MÉNSULAS, RESANES, DOS CAPAS DE PINTURA O BARNIZ, MANIJAS, CHAPA, RESBALÓN, INSTALACIÓN, AJUSTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (SEGÚN PLANO).	M2	\$4,395.56	1.20	\$5,274.67	0.72	0.48	\$2,109.86
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$2,109.86</b>
<b>I.V.A.</b>								<b>\$337.57</b>
<b>TOTAL</b>								<b>\$2,447.43</b>

POR LO ANTERIOR SE OBSERVA QUE LA DIFERENCIA ENTRE DE SALDOS A FAVOR Y SALDOS EN CONTRA EXISTE UN IMPORTE A FAVOR DEL CONTRATISTA POR LA CANTIDAD DE \$ 759.62 (SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.) MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE DICHO IMPORTE FALTANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, MANIFIESTA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LA MENCIONADA CANTIDAD A SU VEZ EL CONTRATISTA MENCIONA QUE DICHO IMPORTE NO TIENE INCONVENIENTE EN QUE NO SEA LIQUIDADO POR LO QUE ACEPTA Y RECONOCE QUE LA SECODUVI NO LE ADEUDA ALGUN IMPORTE DEL CONTRATO DE OBRA MENCIONADO CON ANTELACION PROCEDIENDOSE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**Desarrollo para Todos**

**IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, QUE DA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, FIANZA NÚMERO:2008081 EXPEDIDA POR "FIANZAS SOFIMEX, S.A DE C.V."** PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDANO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE DE LA CONTRATISTA, **ING. FAUSTO JESÚS CISNEROS HERNÁNDEZ**, SUPERINTENDENTE DE OBRA MANIFIESTA NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO **PF/AN-IV/010/16** ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

**MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**


LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DÍA **01 DE JUNIO DEL 2016**, EN LA CD. DE **TLAXCALA, TLAXCALA**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DEPENDENCIA O ENTIDAD

POR EL CONTRATISTA:

  
**ING. LUIS ALBERTO GUEVAS PEREZ**  
RESIDENTE DE OBRA O SERVICIOS

  
**ING. FAUSTO JESÚS CISNEROS HERNÁNDEZ**  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



00029

OBRA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD  
UBICACIÓN: SAN JOSE XICORTENCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA  
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA INSTALACIONES  
CONTRATO: PF/AN-IV/010/16  
PERIODO DE CONTRATO: 21 DE ENERO DE 2016 A 05 DE MARZO DE 2016

CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
	EDIFICIO				
	CAPÍTULO 1 PRELIMINARES				
10692	DEMOLICION DE PISO DE LOSETA CERÁMICA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 60 m. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	m <sup>2</sup>	38.40	\$ 23.68	\$ 909.31
	CAPÍTULO 3 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS				
31201	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD EN MUROS Y PLAFON DE COLOR AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD. INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MÍNIMO. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES.	m <sup>2</sup>	897.92	\$ 54.35	\$ 48.801.95
31205	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS DE PINTURA MÍNIMO. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m <sup>2</sup>	30.41	\$ 74.50	\$ 2.265.55
31209	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDÁLICO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD EN HERRERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE FIERRO O MADERA POR AMBAS CARAS A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE PREP. DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE PINTURA MÍNIMO EN AMBAS CARAS. RETIRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m <sup>2</sup>	43.51	\$ 85.58	\$ 3.723.59
31221	SUM. Y APLICACIÓN DE ESMALTE EPÓXICO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, PRIMARIO SELLADOR, TRES CAPAS DE PINTURA MÍNIMO, RESINA, CATALIZADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m <sup>2</sup>	61.31	\$ 155.92	\$ 9.559.46
31480	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, MODELO Y COLOR AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: JUNTA A HUESO, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	m <sup>2</sup>	38.40	\$ 315.58	\$ 12.118.27
31641	ROTULO EN FACHADA CON PINTURA VINILICA EN APLANADOS CONFORME A INDICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD. INCLUYE LEYENDA, LOGOTIPO, PREPARACION DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN HASTA 2 NIVELES.	m <sup>2</sup>	13.94	\$ 301.72	\$ 4.205.98
31643	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE SEÑALIZACIÓN FABRICADO EN TROVICEL DE 3 mm DE ESPESOR DE 30 cm DE LARGO Y 25 cm DE ALTURA EN 3 TONOS RPBI CONFORME A DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD. INCLUYE CINTA CINTA AUTOADHERIBLE DOBLE CARA PARA SU INSTALACIÓN.	PZ	2.00	\$ 153.75	\$ 307.50
31644	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE SEÑALIZACIÓN FABRICADO EN TROVICEL DE 3 mm DE ESPESOR DE 30 cm DE LARGO Y 10 cm DE ALTURA EN COLOR AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y CARACTERES DE VINIL BLANCO. INCLUYE CINTA CINTA AUTOADHERIBLE DOBLE CARA PARA SU INSTALACIÓN.	pz	16.00	\$ 71.88	\$ 1.150.08

Este programa es público y no es a favor de cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

*Agustín Alberto Cuevas Pérez*

**OBRA:** CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD  
**UBICACION:** SAN JOSE XICOHTENCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA  
**CONSISTENTE EN:** PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA INSTALACIONES  
**CONTRATO:** PFI/AN-IV/010/16  
**PERIODO DE CONTRATO:** 21 DE ENERO DE 2016 A 05 DE MARZO DE 2016

**CATALOGO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
31887	ALACENA DE MADERA HASTA 0.80 m DE ANCHO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MARCO METÁLICO O MADERA Y CHAMBRANA, PUERTAS CORREDIZAS O ABATIBLES, HASTA DOS ENTREPAÑOS POR METRO DE ALTURA, GUÍAS, CARRETIILLAS, BISAGRAS, BIBELES, ENTREPAÑO INTERMEDIO Y SOPORTES O MENSULAS, RESANES, DOS CAPAS DE PINTURA O BARNIZ, MANIJAS, CHAPA, RESBALÓN, INSTALACIÓN, AJUSTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (SEGÚN PLANO).	m <sup>2</sup>	1.20	\$ 4,395.56	\$ 5,274.67
31896	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MOSTRADOR DE MADERA DE PINO DE 120 cm Y 75 cm DE ALTURA Y 70 cm DE ANCHO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MARCO DE MADERA, ENTREPAÑO INFERIOR, RESANES, DOS CAPAS DE BARNIZ, TINTE INDICADO EN PROYECTO, INSTALACIÓN, AJUSTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (SEGÚN PLANO).	mL	1.50	\$ 4,198.25	\$ 6,297.38
<b>CAPÍTULO 4 HERRERÍA</b>					
40584	REHAB. Y COLOC. DE PUERTAS DE ALUMINIO EXISTENTES A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE CHAPA SIMILAR A LA EXISTENTE O INDICADA POR LA SUPERVISIÓN, ACCESORIOS, AJUSTES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	m <sup>2</sup>	2.07	\$ 637.90	\$ 1,320.45
40801	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO DE 8 mm A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	m <sup>2</sup>	50.36	\$ 507.80	\$ 25,572.81
40901	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO EN COLOR GRIS PERLA DE 3" 1/2" SEGÚN PROYECTO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE GALERÍA, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m <sup>2</sup>	9.47	\$ 407.93	\$ 3,863.57
41202	SUM. Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN PHILLIPS TULIP MODELO 6100, 6101 (BAÑO) O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ 395.26	\$ 1,185.78
41527	PUERTA DE ACCESO VEHICULAR DE 4.00 M DE ANCHO HASTA 2.5 M DE ALTURA LIBRE, A DOS HOJAS A BASE DE TUBO MECANICO DE ACERO DE 2.5" DE DIAMETRO, CEDULA 30 Y @ 15 CM LIBRE DE SEPARACION, HASTA UNA ALTURA DE 2.50 A 3.00 MTS. REMATADO CON TAPA DE LAMINA CAL. 18 SOLDADA CON CORTE DE "PLUMA", CON DOS LARGUEROS HORIZONTALES DE TUBERIA BISELADA EN CORTE A BOCA DE PESCADO Y SOLDADA EN LOS EXTREMOS, ASI COMO DOS POSTES Y/O TUBOS DE ACERO DE 8" PARA SOPORTE DE PORTON, HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M. LIBRE CON UN ANCLAJE DE 1.00 CM. SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, SECCION 60X60X1.00 DE PROFUNDIDAD ARMADO CON VAR. NO. 4 @ 20 CM EN CAJA, CONCRETO F' C=200 KG/CM2, TERMINADA CON DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE, INCLUYE BALEROS, CERROJOS, CADENA DE ACERO, ACCESORIOS MENORES, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EXCAVACION, RELLENO EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 25,059.80	\$ 25,059.80
43106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA LIGERA A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR 76 x 76 mm Y COMERCIAL CAL. 18 C-200 50 x 50 mm Y R-300 38 x 75 mm A CUALQUIER NIVEL CONFORME A DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE, NIVELACIÓN, PLOMEO, RESANES, ANCLAJES, SOLDADURA Y/O TORNILLOS, DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m <sup>2</sup>	50.36	\$ 701.64	\$ 35,334.59

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

*Alfredo Alberto Cuevas Pérez*

00027

OBRA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD  
UBICACIÓN: SAN JOSE XICHTENCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA  
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA INSTALACIONES  
CONTRATO: PF/AN-IV/010/16  
PERIODO DE CONTRATO: 21 DE ENERO DE 2016 A 05 DE MARZO DE 2016

**CATALOGO**

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los contemplados en el programa.*

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	-------	---------

<b>CAPÍTULO 5 INSTALACIONES</b>					
50168	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD FLUORESCENTE DE SOBREPONER 2 x 28 W MATERIA PRIMA, LAMINA DE ACERO, TERMINADO PINTURA COLOR BLANCO PANTALLA LOUVER/ALUMINIO MARCA TECNOLITE MODELO MONTISI LTL-2282/41. TIPO DE LAMPARA 2XF28T5 INCLUYE ESTANADO DE CABLES Y CAPUCHON. 2 TUBOS DE 28 WATTS BLANCO FRÍO 4100 K CABLE No. 12. BALASTRO ELECTRÓNICO 2 x 28 W, 100-127V. BASE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO.	Pz	21 00	\$ 1,229 42	\$ 25 817 82
51701	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO. INCLUYE REHABILITACIÓN DE CANALIZACIÓN, REVISIÓN Y/O CAMBIO DE CONDUCTORES (CABLE THW Nos. 10 Y 12 CON DUMEX O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN), CABLE DE PUESTA A TIERRA DE CONTACTO CAL. 12 CON FORRO BLANCO O GRIS CLARO, CAMBIO DE APAGADOR Y/O CONTACTO Q TICINO LINEA MAGIC O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA O REPOSICIÓN DE TAPAS FALTANTES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	1 00	\$ 611 52	\$ 611 52
51704	REUBICACIÓN DE SALIDA DE CENTRO O CONTACTO CON TUBERÍA Y/O CANALETA, CAJAS DE REGISTRO Y CHALUPAS GALVANIZADAS, INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA O CONTACTO EXISTENTE, RANURADO, RESANES, CABLE THW 10 Y 12, CABLE DE PUESTA A TIERRA DE CONTACTO CAL. 12 CON FORRO BLANCO O GRIS CLARO, APAGADOR SENCILLO, DE ESCALERA O CONTACTO Q TICINO LINEA MAGIC O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, TAPAS, COLOCACIÓN DE LUMINARIA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	4 00	\$ 760 69	\$ 3 042 76
52103	SALIDA HIDROSANITARIA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA MUEBLE CON TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 Y 19 mm Y DESCARGA VERTICAL DE P.V.C. SANITARIO ANGER DE 51 Y 102 mm. INCLUYE DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, ACCESORIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	1 00	\$ 1,112 28	\$ 1,112 28
52501	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LAVABO MARCA AMERICAN STANDARD MOD. HABITAT COLOR BLANCO GRADO DE CALIDAD A, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA HELVEX MODELO PRIMMA MI-02, CÉSPOL DE LATON CROMADO TV-017, CONTRA TH-059, MANGUERA TRAMADA FLEXIBLE, VALVULA ANGULAR, SOPORTES LAMINADOS, CONJUNTO COMPLETO SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZ	1 00	\$ 4 414 09	\$ 4 414 09
<b>EXTRAORDINARIOS</b>					
N-008-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S. DE 3.5 MM DE ESPESOR MARCA FESTER, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO, APLICACIÓN DE PRIMER MATERIAL TAPA PORO, ANCLADOR Y AMALGADOR (0.20 LT/M2 PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, APLICACION DE MATERIAL PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO DE 3.5 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO, ACABADO CON GRAVILLA APARENTE, COLOR TERRACOTA ADHERIDO POR TERMOFUSION CON GAS BUTANO, TIEMPO DE GARANTIA DE 5 AÑOS.	M2	282.77	\$ 155.70	\$ 44 027 29
N-008-002	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE POR MEDIOS MANUALES A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGA, ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 60.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	282.77	\$ 18 23	\$ 5,154 90

*Ingeniero Alberto Cuevas Pérez*

*[Firma]*

00026

**OBRA:** CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD  
**UBICACIÓN:** SAN JOSE XICHTENCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA.  
**CONSISTENTE EN:** PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA INSTALACIONES  
**CONTRATO:** PF/AN-IV/010/16  
**PERIODO DE CONTRATO:** 21 DE ENERO DE 2016 A 05 DE MARZO DE 2016

**CATALOGO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
N-008-003	REJA A BASE DE TUBO MECANICO DE ACERO DE 2.5 DE DIAMETRO CED. 30 @ 15 CM LIBRES DE SEPARACION , HASTA UNA ALTURA DE 1.85 A 2.50 M. REMATADO CON TAPA DE LAMINA CAL 18, SOLDADA CON CORTE DE PLUMA, FIJADA A MUROS CON SOPORTES O CEJAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR DE 5 CM DE ANCHO Y TAQUETES DE EXPANSION CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL SOLDADOS TERMINADA CON DOS CAPAS DE PRIMERO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE: ACCESORIOS MENORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2 10	\$ 1.572 56	\$ 3.302 37
SUBTOTAL :					\$ 274 433 75
16 % IVA :					\$ 43 909 40
TOTAL :					\$ 318 343 15

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.*

*Ingeniero Alberto Cuevas Perez*

OBRA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: SAN JOSE XICOHTENCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA INSTALACIONES

CONTRATO: PF/AN-IV/010/16

PERIODO DE CONTRATO: 21 DE ENERO DE 2016 A 05 DE MARZO DE 2016

**EXCEDENTES**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
	<b>EDIFICIO</b>				
	<b>CAPÍTULO 3 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>				
31209	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDÁLICO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD EN HERRERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE FIERRO O MADERA POR AMBAS CARAS A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE PREP. DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO EN AMBAS CARAS, RETIRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m <sup>2</sup>	1.57	\$ 85.58	\$ 134.36
31221	SUM. Y APLICACIÓN DE ESMALTE EPÓXICO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, PRIMARIO SELLADOR, TRES CAPAS DE PINTURA MINIMO, RESINA, CATALIZADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m <sup>2</sup>	45.60	\$ 155.92	\$ 7,109.95
	<b>CAPÍTULO 4 HERRERÍA</b>				
40801	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO DE 8 mm A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	m <sup>2</sup>	3.31	\$ 507.80	\$ 1,680.82
40901	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO EN COLOR GRIS PERLA DE 3" 1/2" SEGÚN PROYECTO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE GALERÍA, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m <sup>2</sup>	1.52	\$ 407.93	\$ 620.13
43106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA LIGERA A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR 76 x 76 mm Y COMERCIAL CAL. 18 C-200 50 x 50 mm Y R-300 38 x 75 mm A CUALQUIER NIVEL CONFORME A DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE, NIVELACIÓN, PLOMEO, RESANES, ANCLAJES, SOLDADURA Y/O TORNILLOS, DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALKIDÁLICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m <sup>2</sup>	3.31	\$ 701.64	\$ 2,322.42
<b>SUBTOTAL:</b>					\$ 11,667.63
16 % IVA:					\$ 1,833.83
<b>TOTAL:</b>					\$ 13,766.51

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.*

Ing. Luis Alberto Cuevas Perez  


**OBRA:** CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD  
**UBICACIÓN:** SAN JOSE XICOHTENCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA  
**CONSISTENTE EN:** PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA INSTALACIONES  
**CONTRATO:** PF/AN-IV/010/16  
**PERIODO DE CONTRATO:** 21 DE ENERO DE 2016 A 05 DE MARZO DE 2016

**Este programa es público, abierto a todo ciudadano, excepto los partidos políticos. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.**

**CANCELADOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
	<b>EDIFICIO</b>				
	<b>CAPÍTULO 1 PRELIMINARES</b>				
10506	RETIRO CON RECUPERACION DE HERRERIA Y CANCELERIA CON VIENTO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE PUERTAS, ACARREOS A BODEGA HASTA 60 m DE DISTANCIA.	m <sup>2</sup>	2.07	\$ 77.90	\$ 161.25
10692	DEMOLICION DE PISO DE LOSETA CERÁMICA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 60 m. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	m <sup>2</sup>	10.74	\$ 23.68	\$ 254.32
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				
	<b>CAPÍTULO 3 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</b>				
31201	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD EN MUROS Y PLAFON DE COLOR AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD. INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HASTA 2 NIVELES.	m <sup>2</sup>	143.03	\$ 54.35	\$ 7.773.63
31205	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m <sup>2</sup>	9.00	\$ 74.50	\$ 670.50
31480	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, MODELO Y COLOR AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: JUNTA A HUESO, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	m <sup>2</sup>	10.74	\$ 315.58	\$ 3.389.33
31641	ROTULO EN FACHADA CON PINTURA VINILICA EN APLANADOS CONFORME A INDICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD. INCLUYE LEYENDA, LOGOTIPO, PREPARACION DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN HASTA 2 NIVELES.	m <sup>2</sup>	7.50	\$ 301.72	\$ 2.262.90
31643	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE SEÑALIZACIÓN FABRICADO EN TROVICEL DE 3 mm DE ESPESOR DE 30 cm DE LARGO Y 25 cm DE ALTURA EN 3 TONOS RPBI CONFORME A DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE SALUD. INCLUYE CINTA CINTA AUTOADHERIBLE DOBLE CARA PARA SU INSTALACIÓN.	PZ	2.00	\$ 153.75	\$ 307.50
31644	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE SEÑALIZACIÓN FABRICADO EN TROVICEL DE 3 mm DE ESPESOR DE 30 cm DE LARGO Y 10 cm DE ALTURA EN COLOR AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y CARACTERES DE VINIL BLANCO. INCLUYE CINTA CINTA AUTOADHERIBLE DOBLE CARA PARA SU INSTALACIÓN.	pz	14.00	\$ 71.88	\$ 1.006.32
	<b>CAPÍTULO 4 HERRERÍA</b>				
40146	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN A BASE DE TUBO DE FIERRO MECANICO C-30 DE 19 mm DE DIÁMETRO CONFORME A DISEÑO EN PUERTAS Y CANCELERIA A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TUBO A CADA 15 cm DE SEPARACIÓN EFECTIVA, ACABADO SUPERIOR BISELADO A 45°, SOLDADURA, BASTIDOR PARA ANCLAJE Y SOPORTERÍA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANCLAJE, NIVELACIÓN, PLCMO, RESANES, DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m <sup>2</sup>	8.38	\$ 828.71	\$ 6.944.59

*Ing. Luis Alberto Cuevas Perez*

OBRA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD

UBICACIÓN: SAN JOSE XICOHTENCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA INSTALACIONES

CONTRATO: PFIAN-IV/010/16

PERIODO DE CONTRATO: 21 DE ENERO DE 2016 A 05 DE MARZO DE 2016

**CANCELADOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
41525	EDIFICIO PUERTA DE ACCESO PEATONAL CON SECCION DE 2.50 MTS. DE ANCHO Y 2.50 MTS. DE ALTURA LIBRE A DOS HOJAS, A BASE DE TUBO MECANICO DE ACERO DE 2.5" DE DIAMETRO CED. 30 Y @ 15 CM LIBRES DE SEPARACION, HASTA UNA ALTURA DE 2.50 A 3 MTS REMATADO CON TAPA DE LAMINA CAL. 18 SOLDADA CON CORTE DE "PLUMA" CON DOS LARGUEROS HORIZONTALES EN CORTE A BOCA DE PESCADO Y SOLDADA EN LOS EXTREMOS, ASI COMO DOS POSTES Y/O TUBOS DE ACERO DE 8" CED. 30 EN LOS EXTREMOS PARA SU SUJECION, HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M. LIBRE CON UN ANCLAJE DE 1.00 M. SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, SECCION 60X60X1.00 DE PROFUNDIDAD ARMADO CON VAR. NO. 4 @ 20 CM EN CAJA, CONCRETO F' C=200 KG/CM2, TERMINADA CON REJILLA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE BALEROS, CERROJOS, CADENA DE ACERO, ACCESORIOS MENORES, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ESCAVACION, RELLENO EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 19,950.40	\$ 19,950.40
42164	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA EXTERIOR EMPOTRADA EN MURO DE A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 38 x 38 mm Y 7/64" DE ESPESOR DE 70 cm DE ANCHO SEPARADA A 16 cm DEL MURO, PELDAÑO A CADA 35 cm A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE ANCLAJE (DE 10 cm MINIMO) A BASE DEL MISMO PERFIL Y ÁNGULO DE 25 mm ABIERTO A CADA 110 cm COMO MÁXIMO, RESANE CORRESPONDIENTE, DEMOLICIONES, RESANES, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE EPÓXICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	mL	4.50	\$ 762.43	\$ 3,430.94
<b>CAPÍTULO 5 INSTALACIONES</b>					
50127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO B TICINO LINEA MODUS, INCLUYE ACCESORIOS, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	1.00	\$ 101.63	\$ 101.63
50168	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD FLUORESCENTE DE SOBREPONER 2 x 28 W MATERIA PRIMA LAMINA DE ACERO, TERMINADO PINTURA COLOR BLANCO PANTALLA LOUVER/ALUMINIO MARCA TECNOLITE MODELO MONTISI LTL-2282/41. TIPO DE LAMPARA 2X28T5 INCLUYE ESTANADO DE CABLES Y CAPUCHON. 2 TUBOS DE 28 WATTS BLANCO FRÍO 4100 K CABLE No. 12, BALASTRO ELECTRÓNICO 2 x 28 W, 100-127V, BASE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO.	Pz	1.00	\$ 1,229.42	\$ 1,229.42
51052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE PVC CAT. MIQ 16/25 ARROW HART LÍNEA QUINTELA O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE ACCESORIOS, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	mL	12.00	\$ 50.99	\$ 611.88
52514	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA ANGULAR DE 13 mm A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE, MANGUERA TRAMADA FLEXIBLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZ	3.00	\$ 182.54	\$ 547.62
52574	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE SHAMPOO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZ	7.00	\$ 634.38	\$ 4,440.66
52577	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZ	7.00	\$ 667.25	\$ 4,670.75

00022

**OBRA** CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD  
**UBICACIÓN:** SAN JOSE XICOHTENCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA.  
**CONSISTENTE EN:** PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA INSTALACIONES  
**CONTRATO:** PF/AN-IV/010/16  
**PERIODO DE CONTRATO:** 21 DE ENERO DE 2016 A 05 DE MARZO DE 2016

**CANCELADOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
54327	EDIFICIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO HELVEX PRIMMA MOD. MI-02 CON MANERALES, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE, LIMPIEZA, RETIRO, CONEXIONES CON MANGUERA TRAMADA FLEXIBLE VÁLVULAS ANGULARES DE 13 mm, MATERIALES CROMADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZ	1 00	\$ 3,077.25	\$ 3,077.25
54329	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE DE BRONCE EN TANQUE BAJO DE WC, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, AJUSTES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	JGO	4 00	\$ 539.18	\$ 2,156.72
54342	REHABILITACIÓN GENERAL EN TARJA, INCLUYE REHABILITACIÓN O CAMBIO DE TUBERÍAS DE SUMINISTRO Y DESCARGA, RETIRO DE LLAVES Y ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA HELVEX MOD. E-33 MANERALES C-12, CANASTA Y CONTRACANASTA, CÉSPOL DE PLOMO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZ	1.00	\$ 5,467.64	\$ 5,467.64
SUBTOTAL :					\$ 69,455.30
16% IVA :					\$ 10,952.85
TOTAL :					\$ 79,408.15

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Ing. Carlos Alberto Cuevas Perez



**OBRA** CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD  
**UBICACIÓN:** SAN JOSE XICHTENCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA.  
**CONSISTENTE EN:** PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA INSTALACIONES  
**CONTRATO:** PF/AN-IV/010/16  
**PERIODO DE CONTRATO:** 21 DE ENERO DE 2016 A 05 DE MARZO DE 2016

**EXTRAORDINARIOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
N-008-001	EDIFICIO EXTRAORDINARIOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S. DE 3.5 MM DE ESPESOR MARCA FESTER. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO, APLICACION DE PRIMER MATERIAL TAPA PORO, ANCLADOR Y AMALGADOR (0.20 LTM <sup>2</sup> PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. APLICACION DE MATERIAL PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO DE 3.5 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO, ACABADO CON GRAVILLA APARENTE COLOR TERRACOTA ADHERIDO POR TERMOFUSION CON GAS BUTANO, TIEMPO DE GARANTIA DE 5 AÑOS.	M2	282.77	\$ 155.70	\$ 44 027.29
N-008-002	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE POR MEDIOS MANUALES A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGA ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 60.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	282.77	\$ 18.23	\$ 5,154.90
N-008-003	REJA A BASE DE TUBO MECANICO DE ACERO DE 2.5 DE DIAMETRO CED. 30 @ 15 CM LIBRES DE SEPARACION, HASTA UNA ALTURA DE 1.85 A 2.50 M. REMATADO CON TAPA DE LAMINA CAL 18. SOLDADA CON CORTE DE PLUMA, FIJADA A MUROS CON SOPORTES O CEJAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR DE 5 CM DE ANCHO Y TAQUETES DE EXPANSION CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL SOLDADOS TERMINADA CON DOS CAPAS DE PRIMERO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE: ACCESORIOS MENORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.10	\$ 1,572.56	\$ 3,302.37
				SUBTOTAL :	\$ 52 484.55
				16 % IVA :	\$ 8 397.53
				TOTAL :	\$ 60 882.08

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

*Ing. Carlos Alberto Cuevas Pérez*





OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD  
 UBICACION: SAN JOSE XICCHTENCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA  
 CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA INSTALACIONES  
 CONTRATO: PF/AN/IV/010/16  
 PERIODO DE CONTRATO: 21 DE ENERO DE 2016 A 05 DE MARZO DE 2016

**NÚMEROS GENERADORES PARA EL FINIQUITO**

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	TOTAL
31897	ALACENA DE MADERA HASTA 0.80 m DE ANCHO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MARCO METALICO O MADERA Y CHAMBRANA, PUERTAS CORREDIZAS O ABATIBLES, HASTA DOS ENTREPAÑOS POR METRO DE ALTURA, GUIAS, CARRETILLAS, BISAGRAS, BIBELES, ENTREPANO INTERMEDIO Y SOPORTES O MENSULAS, RESAMIES, DOS CAPAS DE PINTURA O BARNIZ, MANIJAS, CHAPA, RESBALON, INSTALACION, AJUSTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (SEGUN PLANO).	m <sup>2</sup>			1.20		0.60	1	0.72
								<b>SUMA</b>	<b>0.72</b>
40901	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO EN COLOR GRIS PERLA DE 3" 1/2" SEGUN PROYECTO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE GALERIA, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, AYUDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m <sup>2</sup>	2	I-J	2.15		1.50	1	3.23
			J	2-3	2.04		1.40	1	2.86
			8	I-J	2.04		1.50	1	3.06
					1.74		1.50		2.61
								<b>SUMA</b>	<b>11.76</b>
51701	REVISION Y REPARACION DE SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO, INCLUYE REHABILITACION DE CANALIZACION, REVISION Y O CAMBIO DE CONDUCTORES (CABLE TRW Nos 10 Y 12 CONDUMEX O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISION), CABLE DE PUESTA A TIERRA DE CONTACTO CAL. 12 CON FERRÓ BLANCO O GRIS CLARO, CAMBIO DE APAGADOR Y/O CONTACTO O TICINO LINEA MAGIC O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA O REPOSICION DE TAPAS TALANTES, PRUEBAS Y T300 LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	1-9	A K				4	4.00
								<b>SUMA</b>	<b>4.00</b>

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

*Ingeniero Alberto Cuevas Pérez*








OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD  
UBICACION: SAN JOSE XICOMTEVCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA  
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA INSTALACIONES  
CONTRATO: PF/AN-IV/013/18

PERIODO DE CONTRATO: 21 DE ENERO DE 2016 A 05 DE MARZO DE 2016

**FOTOS PARA EL FINIQUITO**

CLAVE	CONCEPTO
31887	ALACENA DE MADERA HASTA 0.80 m DE ANCHO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MAICO METALICO O MADERA Y CHARRERANA, PUERTAS CORREDIZAS O ABATIBLES, HASTA DOS ENTREPAÑOS POR METRO DE ALTURA, GUJAS, CARRETIILLAS, BISAGRAS, BIBELES, ENTREPAÑO INTERMEDIO Y SOPORTES O MENSULAS, RESANES, DOS CAPAS DE PINTURA O BARNIZ, MANIJAS, CHAPA, RESBALÓN, INSTALACION, AJUSTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (SEGUN PLANO).

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.




*Ingeniero Alberto Lucas Perez*

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD  
 UBICACION: SAN JOSE XICOTEACATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA  
 CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES  
 CONTRATO: PE/AN/IV/013/16



PERIODO DE CONTRATO: 21 DE ENERO DE 2016 A 05 DE MARZO DE 2016

**FOTOS PARA EL FINIQUITO**

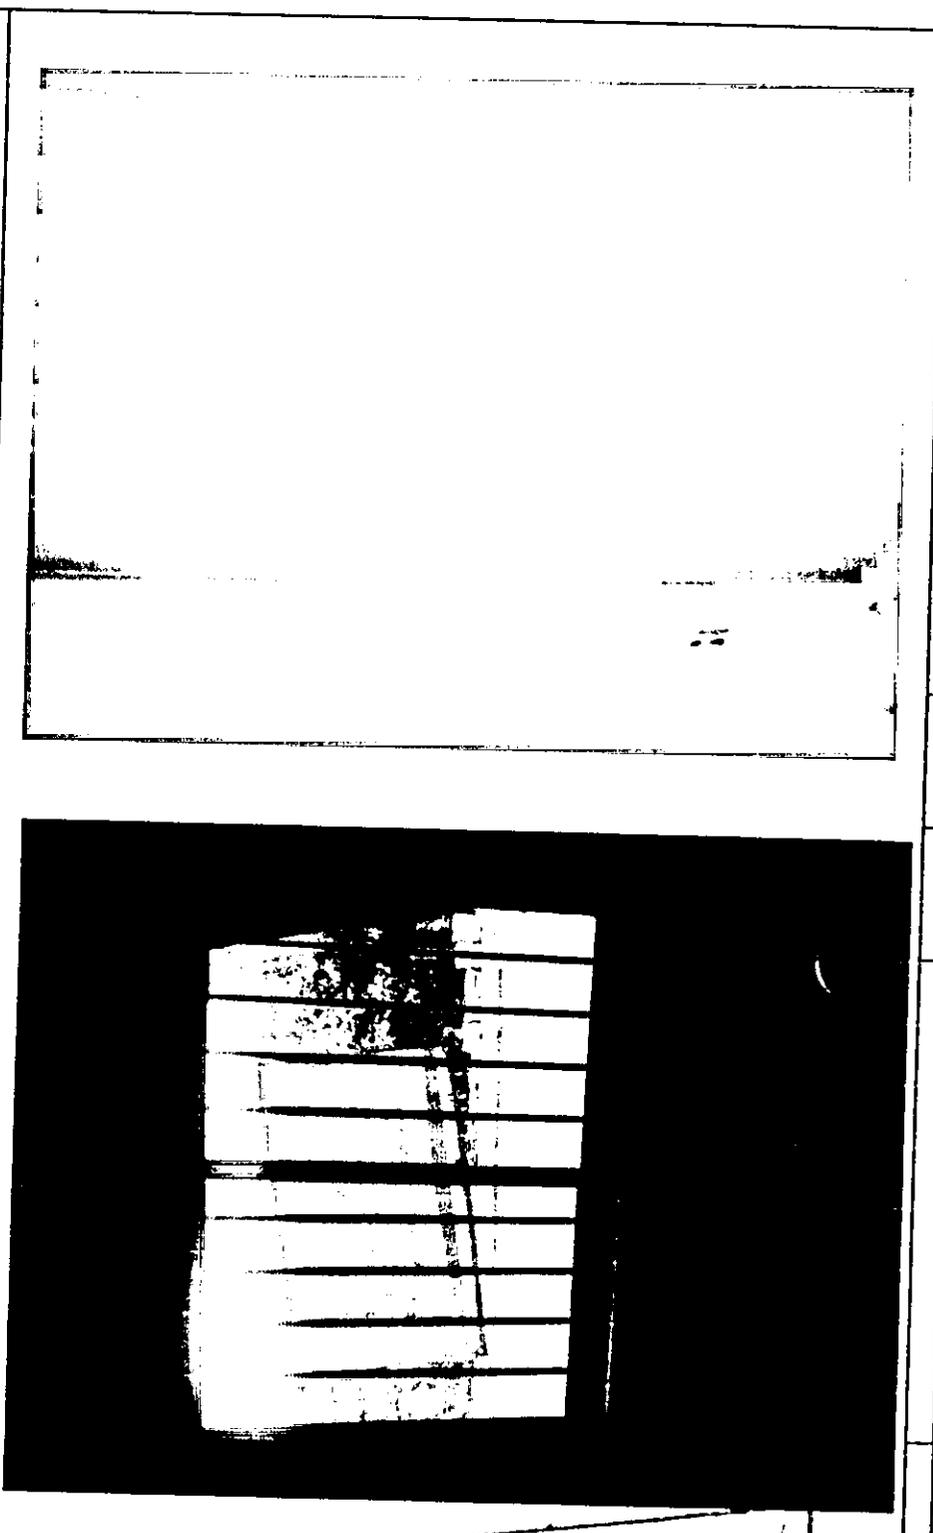CLAVE	CONCEPTO	CROQUIS
40901	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO EN COLOR GRIS PERLA DE 3" 1/2" SEGUN PROYECTO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE GALERIA, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

*Ing. hois Alberto Peres Perez*




OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD  
 UBICACION: SAN JOSE XICOTEVCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA  
 CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES  
 CONTRATO: PE/AN/IV/013/76

PERIODO DE CONTRATO: 21 DE ENERO DE 2016 A 05 DE MARZO DE 2016

**FOTOS PARA EL FINIQUITO**

CLAVE	CONCEPTO	CROQUIS
51701	REVISION Y REPARACION DE SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO, INCLUYE REHABILITACION DE CANALIZACION, REVISION Y/O CAMBIO DE CONDUCTORES (CABLE THW Nos. 10 Y 12 CONDUMEX O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISION), CABLE DE PUESTA A TIERRA DE CONTACTO CAL. 12 CON TORRO BLANCO O GRIS CLARO, CAMBIO DE APAGADOR Y/O CONTACTO Q TICINO LINEA MAGIC O SIMILAR APROBADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA O REPOSICION DE TAPAS FALTANTES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	

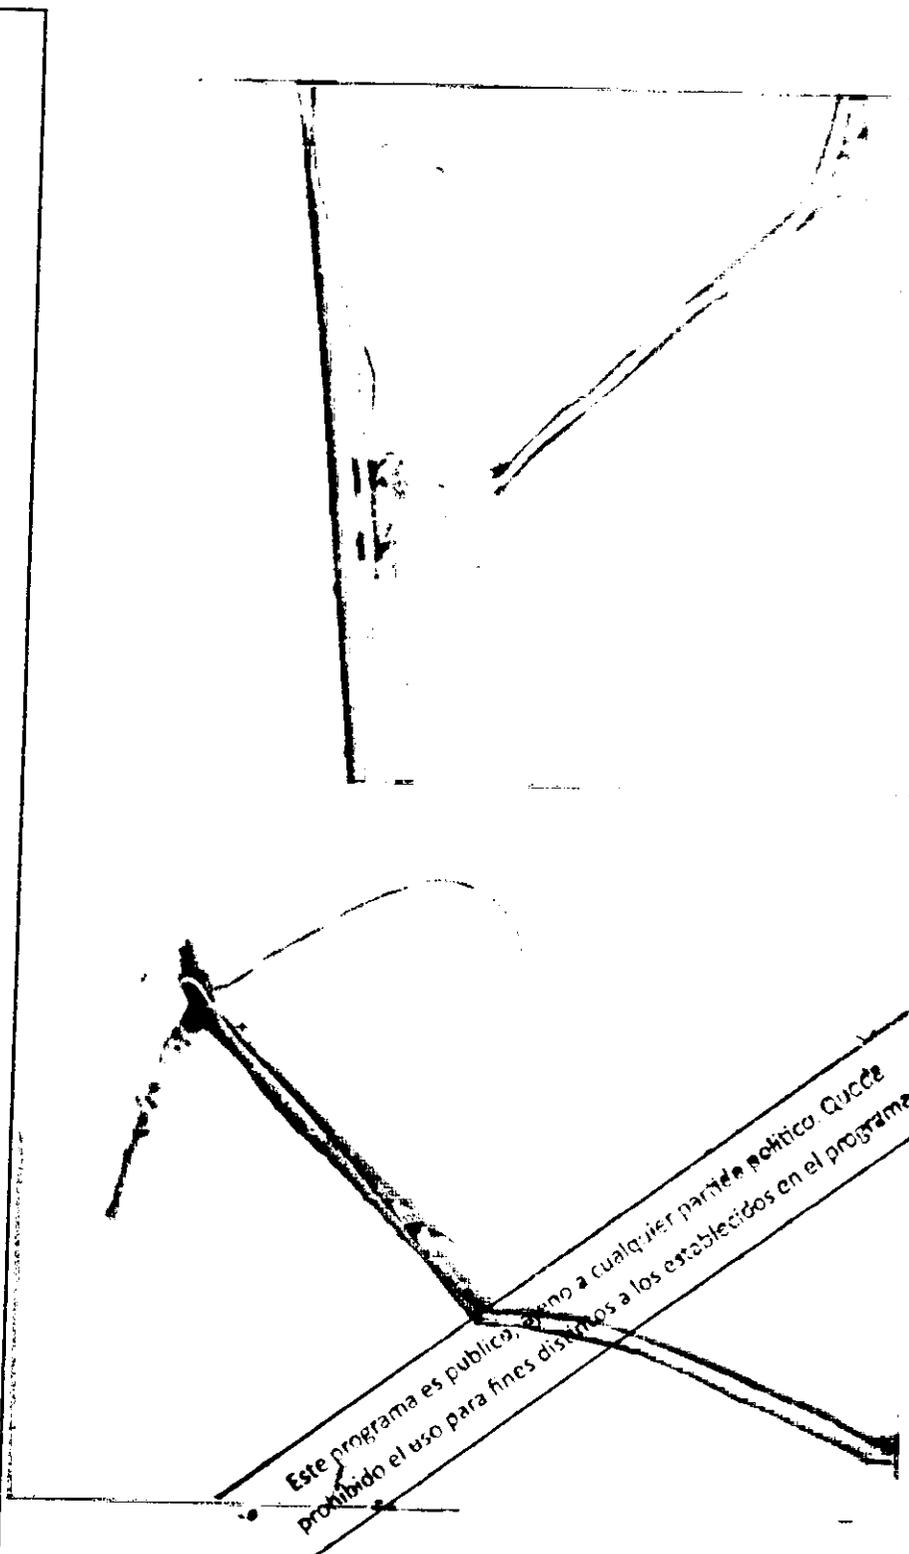

Este programa es publico, como a cualquier parte politica. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

*Ing. Luis Alberto Reyes Perez*

**MEMORANDUM**

**PARA:** ING. LEONEL LIMA LOAIZA  
JEFE DE UNIDAD Y CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRAS  
PRESENTE.

**DE:** ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
EDIFICIO.




Anexo al presente, envié a usted la documentación en original, para el expediente unitario de las obras siguientes:

NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO	DOCUMENTACIÓN ENVIADA	EMPRESA
MODERNIZACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, APIZACO Y YAUHQUEMHEAN	PF/FMTA/064/15	1.- BITACORA ELECTRONICA DE OBRA	GRUPO VERTICE 38, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DEL PUENTE ACCESO A LA UNIDAD SANTA CRUZ, CHIAUTEMPAN	PD/SECODUVI/086/15	1.- BITACORA CONVENCIONAL DE OBRA	CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V.
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PRESAS DE GAVIONES EN CAÑADA GRANDE Y BARRANCA BRIONES PARQUE NACIONAL LA MALINCHE, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	PF/APAZU/115/15	1.- ACTA DE ENTREGA RECEPCION (SECODUVI-BENEFICIARIO)	EVICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, TLAXCO	PD/PEI/174/15	1.- BITACORA CONVENCIONAL DE OBRA	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.
PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, TLAXCO	PD/PEI/222/15	1.- BITACORA CONVENCIONAL DE OBRA	CONSTRUCCION Y CAPACITACION PROYECTOS Y VIVIENDA S.A. DE C.V.
PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA 4 DE OCTUBRE, TLAXCO	PD/PEI/223/15	1.- BITACORA CONVENCIONAL DE OBRA	ING. JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO
ELECTRIFICACION DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO DE LA AV. JESUS CARRANZA A LA CALLE SEXTA, APIZACO Y YAUHQUEMHEAN	PD/SECODUVI/244/15	1.- BITACORA CONVENCIONAL DE OBRA	HUJUMAR D.C.A. S.A. DE C.V.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, HUAMANTLA	PF/AN-IV/004/16	1.- ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO CON ANEXOS	OSVAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REHABILITACION DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE AMAXAC DE GUERRERO	PD/SECODUVI/007/16	1.- BITACORA CONVENCIONAL DE OBRA	CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA KAV, S DE R.L. DE C.V.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, TOCATLAN	PF/AN-IV/009/16	1.- ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO CON ANEXOS	SERVICIOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS S.A. DE C.V.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, HUAMANTLA	PF/AN-IV/010/16	1.- ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO CON ANEXOS	SERVICIOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS S.A. DE C.V.



CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL COMUNITARIO ZACATELCO	PD/AN-IV/048/16	1.- OF. AVISO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS 2.- FECHA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 3.- ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 4.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS 5.- OF. AVISO DE ELABORACION DE FNIQUITO 6.- ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO CON ANEXOS	CONSTRUCCIONES SANBAR, S.A. DE C.V.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD, HUEYOTLIPAN	PD/AN-IV/082/16	1.- OF. AVISO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS 2.- FECHA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 3.- ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS 4.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS 5.- OF. AVISO DE ELABORACION DE FNIQUITO 6.- ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO CON ANEXOS 7.- ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	DULCE DIAZ SERRANO

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



**A T E N T A M E N T E**  
 TLAXCALA, TLAX., A 20 DE OCTUBRE 2016.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Archivo  
 ISSV/ma.



SEC-02-0F-DIU-101-02/2016

**ASUNTO: SE COMUNICA PERIODO DE ELABORACIÓN DEL FINIQUITO.**

**ING. FAUSTO ÓSCAR DE LA BARRERA VELÁZQUEZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V.**  
**P R E S E N T E.**

**CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°PF/AN-IV/010/16 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD" UBICADA EN SAN JOSÉ XICOTÉNCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA.**

**POR ESTE CONDUCTO LE NOTIFICO QUE EL PERIODO DE ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2016 AL 01 DE JUNIO, Y EL EVENTO DE FIRMA DEL MISMO, SE REALIZARÁ EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2016 A LAS 11:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ESTA DIRECCIÓN.**

**SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.**

**ATENTAMENTE**  
**TLAXCALA, TLAX. 02 DE ABRIL DEL 2016**

  
**ARQ. JORGE SANCHEZ ARROYO**  
**JEFÉ DE OFICINA DE**  
**INFRAESTRUCTURA URBANA**

**Prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.**

*Recibi Original*  


C.C.P. RESIDENTE DE OBRA  
C.C.P. ARCHIVO  
JSSV/JSALACP

