

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/PRONAPRED/166/16.

En la ciudad de Tlaxcala, siendo las 12:00 horas del día 29 de Diciembre del 2016, se reunieron en las Oficinas del Residente de Obra responsable de la ejecución de los trabajos del Departamento de Infraestructura Urbana de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en Carretera Tlaxcala-Puebla km 1.5 Tlaxcala, Tlaxcala, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

Ing. Miguel Roldán Zárate en su carácter de Residente de Obra de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda.


El C. Arq. Alejandro Guerrero Sánchez en su carácter de Superintendente de Obra representada por la empresa **ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.**

Para realizar con fundamento en los artículos Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Cláusula Décima-Octavo del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	PF/PRONAPRED/166/16
Obra:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN.
Fecha de formalización:	15/SEPTIEMBRE/2016
Objeto del Contrato:	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN.

Descripción:
PRELIMINARES, ÁREA DE GIMNASIO Y MÓDULOS LÚDICOS, CERCA PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL, TROTAPISTA, JUEGO LÚDICO, REHABILITACIÓN, DE EDIFICIO, PASILLO, MOBILIARIO, JARDINERÍA Y LIMPIEZA EN GENERAL.



00043

Monto original del contrato: \$ 1'903,657.75 (UN MILLON NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.), INC. EL I.V.A.

Plazo de ejecución contractual: 60 DIAS NATURALES.

Fecha de inicio según contrato: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha de terminación según contrato: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

II.- Modificaciones.

A lo originalmente Pactado PF/PRONAPRED/166/A/16

Monto según convenio(s): \$ 0.00.

Saldo Cancelado: \$ 14,059.37 (INCLUYE I.V.A.)

Porcentaje de modificación: 0.00 %

Monto real ejercido (1): \$ 1' 889,598.38 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.), INCLUYE. I.V.A

Monto pagado por ajuste de costos (2): \$ 0.00 (Cero Pesos)

Monto total ejercido (1+2): \$ 1' 889,598.38 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.), INCLUYE. I.V.A

Fecha de inicio real: 17/Septiembre/2016

Fecha de terminación real: 30/Noviembre/2016.

Plazo de ejecución real: 75 días naturales.

OPERADO EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016 PRONAPRED.



Desarrollo para Todos

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

• 00042

PENALIZACIÓN AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEBIDO A QUE TERMINO EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2016, ES DECIR, 7 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, APLICANDO UNA PENALIZACIÓN DE \$ 2,830.15 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 15/100 M.N.).

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda** son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado	Fecha de Pago
1 (UNO)	02/12/16	Del	17/09/16	Al	01/10/16	\$ 595,861.05	\$ 595,861.05	PENDIENTE DE PAGO
2 (DOS)	05/12/16	Del	02/10/16	Al	16/10/16	\$ 461,667.82	\$ 1'057,528.87	PENDIENTE DE PAGO
3(TRES)	05/12/16	Del	17/10/16	Al	31/10/16	\$ 289,332.18	\$ 1'346,861.05	PENDIENTE DE PAGO
4(CUATRO)	05/12/16	Del	01/11/16	Al	15/11/16	\$ 142,072.81	\$ 1'488,933.86	PENDIENTE DE PAGO
5(CINCO)	09/12/16	Del	16/11/16	Al	07/12/16	\$ 400,664.52	\$ 1'889,598.38	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL							\$ 1'889,598.38	PENDIENTE DE PAGO

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 223,778.67 Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 1.

PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016 PRONAPRED.



Desarrollo para todos

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINE DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCION DE VOLUMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 595,423.08 MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 2.

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CONCEPTOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$ 357,585.05 Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS EN LA ESTIMACIÓN No. 3, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO 3.

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **6417-51853-0** expedida por **ORIENTAL SUCOCO S.A. DE C.V.** para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA




00040


Por su parte el Superintendente de Obra el ARQ. JAVIER GARCÍA ÁNGELES a nombre y representación de **ORIENTAL SUCOCO S.A. DE C.V.**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **PF/PRONAPRED/166/16** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra de esta **Secretaría**.


Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **12:00** horas del día **29 de Diciembre del 2016**, en la ciudad de Tlaxcala, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por la **Secretaría de Obras Públicas**
Desarrollo Urbano y Vivienda

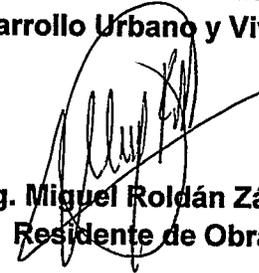
Ing. Miguel Roldán Zárate
Residente de Obra

Por la Empresa Contratista
ORIENTAL SUCOCO S.A. DE C.V.


ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SÁNCHEZ
Superintendente de Obra

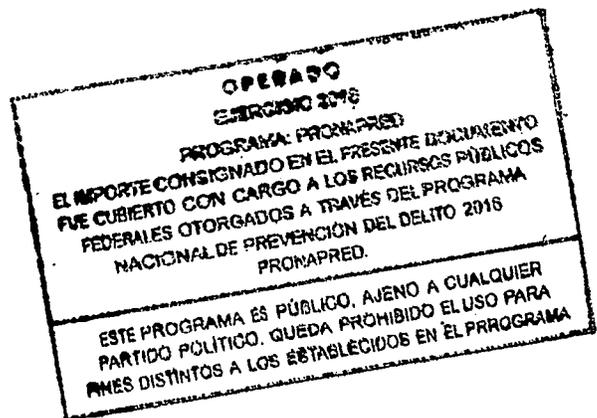

FINIQUITO

00039

COMPANIA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CUADRO ANEXO 2
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

CANTIDAD NO
EJECUTADA DEL
CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA, INCLUYE: BARROTES ESTACAS, VARILLAS, HILO CALHIDRA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	3000	\$ 15,060.00	367.20	\$1,843.34
2	DESPALME DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALEM FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M3	450	\$ 19,138.50	55.08	\$2,342.55
3	EXCAVACION EN CORTE POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA, Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION NO APROVECHABLE FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	M3	600	\$ 35,328.00	73.44	\$4,324.15
4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE), PUESTO EN OBRA EN CAPAS DE 10 CMS. COMPACTADO AL 95 % PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL, NIVELADO, HIDRATACION DEL MATERIAL PARA SU COMPACTACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	300	\$ 80,061.00	76.86	\$20,511.63

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:



C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SÁNCHEZ

Residente de Obra:



ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

COMPANIA ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.	CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO
CONTRATO N° PF/PRONAPRED/166/16	

OBRA:
REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO	CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO
-------------------------------	---

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO LINEA CLASICA DE 2.50 M DE ALTURA, CON PLIEGUES EN FORMA DE "V" CON ABERTURA DE 50 X 200 MM, CAL 6 DE 4.89 MM. INCLUYE; POSTES DE REJA ACERO CLASICA ALTURA 3.10 M. CAL 16 DE 2 1/4" X 2 1/4", ABRZADERA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/4", TAPA DE POLIPROPILENO PARA POSTE, CONCRETO PARA ANCLAJE DE F'= 150 KG/CM2, TORNILLO PARA SUJECION, NIVELACION, PLOMEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA.	ML	350	\$ 373,093.00	7.88	\$8,399.92
21	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION 30X30 CMS., CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VAR DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @15 CMS., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	40	\$ 30,701.60	40.00	\$30,701.60
22	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION DE 0.20X0.30 MTS. CON CONCRETO 200 KG/CM2 AGREGADO DE 38MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, CON ADITIVO FESTERMIX, CIMBRA, ACABADO APARENTE, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 6 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS DE # 2 @ 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	20	\$ 6,381.80	20.00	\$6,381.80

OPERADO
EJERCICIO 2016
 PROGRAMA: PRONAPRED
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUBIERTO CON CARGOS A LOS RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
 NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
 PRONAPRED.
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:

 C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:

 ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00037

COMPANIA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CUADRO ANEXO 2
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

**CANTIDAD NO
EJECUTADA DEL
CATALOGO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
23	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5 X 12 X 24 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 JUNTAS GUSANEADAS DE 1.5 CM, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 6 MTS, DETALLES DE ARCO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	35	\$ 8,796.20	35.00	\$8,796.20
24	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION DE 0.20X0.30 MTS. CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 38 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, CON ADITIVO FESTERMIX, CIMBRA, ACABADO APARENTE, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 6 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS DE # 2 @ 0.20 MTS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS ELEVADO CON BOTE, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	20	\$ 7,237.00	20.00	\$7,237.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO DE TRIDILOSA DE 30 CMS DE ALTO CON POLICARBONATO COLOR HUMO, INCLUYE: BASE DE ALUMINIO PARA RECIBIR POLICARBONATO, ANCLAS AHOGADAS EN CONCRETO, BASES DE UNION DE TRIDILOSA CON POLICARBONATO, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	20	\$ 26,085.20	20.00	\$26,085.20

OPERADO
EJERCICIO 2016

PROGRAMA: PRONAPRED

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROBBAN ZARATE

FINIQUITO

00036

COMPANIA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CUADRO ANEXO 2
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

**CANTIDAD NO
EJECUTADA DEL
CATALOGO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
26	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (VINIMEX) A 2 MANOS, SOBRE MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: CINTA DE RESTRICCIÓN DE AREA DE TRABAJO, SEÑALIZACION VIAL Y PEATONAL (CONOS, SEÑALES DE IDENTIFICACION DE AREAS DE TRABAJO, ETC.) EQUIPO DE SEGURIDAD (CASCO, CHALECOS REFLEJANTES, ETC) RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES QUE INTERVENGAN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	80.07	\$ 5,074.84	80.07	\$5,074.84
27	DESPALME DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M3	37	\$ 1,551.04	3.41	\$142.95
28	FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, COLADO EN LOSAS DE 1.50 X 2.00 MTS. REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10X10, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN EL PERIMETRO, INCLUYE: NIVELACION EN EL TERRENO, COMPACTACION MECANICA, CIMBRA FRONTERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	370	\$ 67,488.00	34.03	\$6,207.07

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED.
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Superintendente de Obra:



C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SÁNCHEZ

Residente de Obra:



ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00035

COMPANIA
ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

**CUADRO ANEXO 2
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO**

CONTRATO N°
PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:
REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
OCOTLÁN


PRESUPUESTO CONTRATADO

CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	OPERADO			CANTIDAD	IMPORTE
		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE		
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE UNIPILAS SBS 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO, TAPA PORO IMPERPRIM S" A RAZON DE 0.20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEADO DE GRIETAS Y FISURAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO "BITUPLASTIC AI" Y COLOCACION DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S. CON UN 12 % DE POLYMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS/CM2 CON UNA RESINA TERMOFIJA, EN 3.5 MM. DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIOS DE TERMOFUSION CON SOPLETE DE GAS BUTANO INCLUYE: RETIRO DEL ANTERIOR IMPERMEABILIZANTE, TRASLAPE ENTRE LIENSO Y LIENSO, SELLADO DE PUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	240	\$ 28,855.20	57.06	\$6,860.32
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE LINEA 2", INCLUYE: CRISTAL DE 6 MM, BOLSA, JUNQUILLO Y HERRAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	60	\$ 58,905.00	55.50	\$54,487.13
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE LINEA 3", INCLUYE: CRISTAL DE 8 MM, BOLSA, JUNQUILLO Y HERRAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	35	\$ 52,139.85	35.00	\$52,139.85
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA TANQUE PARA WC ELONGADO MARCA HELVEX O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: TRAMPA EXPUESTA, ASIENTO Y TAPA, BOTON ACCIONADOR, ELEMENTOS DE FIJACION MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7	\$ 23,148.02	7.00	\$23,148.02


EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016 PRONAPRED.
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:



C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:



ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00034

COMPANIA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CUADRO ANEXO 2
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

**CANTIDAD NO
EJECUTADA DEL
CATALOGO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: DISPOSITIVO TDS, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	3	\$ 16,988.22	3.00	\$16,988.22
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO TIPO OVALIN DE SOBREPONER COLOR BLANCO MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: LLAVE TEMPORIZADORA HELVEX TV-120, HERRAJES, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6	\$ 29,832.72	6.00	\$29,832.72
36	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6	\$ 6,506.10	6.00	\$6,506.10
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 4 MM DE ESPESOR DE 1.00X1.00 CON MARCO DE ALUMINIO	PZA	2	\$ 1,590.28	2.00	\$1,590.28
38	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE POLIURETANO MODELO ALCATRAZ O SIMILAR DE 0,90 X 0,90 MTS, ENDURECEDOR COLOR LAJA GRIS, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR GRIS OSCURO Y SELLADOR ACRILICO 25% SOLIDOS, BRILLO MEDIO PARA CONCRETO ESTAMPADO, FIRME DE CONCRETO 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, AGREGADO DE 38 mm, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CMS. 0.10 M DE ESPESOR, INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	66	\$ 23,041.26	66.00	\$23,041.26

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. ANEXO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

COMPANIA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CUADRO ANEXO 2
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

**CANTIDAD NO
EJECUTADA DEL
CATALOGO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
39	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE 1.10 X 1.20 PROM. INC: PLACA DE SEÑALIZACION TIPO POLYCONCRETO O SIMILAR, COLOR AZUL DE 0.40 X 0.40 M. CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO, TERMINADA CON VOLTEADOR, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4	\$ 5,895.32	4.00	\$5,895.32
42	ARRIATE A NIVEL DE PISO, COLOCADA EN FORMA CUADRADA DE PIEDRA COLOR BLANCO, ASENTADO CON MORTERO PROP.: 1:5 CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	102.1	\$ 31,880.73	102.10	\$31,880.73
44	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTAS DE ORNATO DE 20 A 40 CMS DE COLOR VARIOS, INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, TRAZO, EXCAVACION, PLANTADO, RELLENO, NIVELACION VERTICAL, PORCENTAJE DE REPOSICION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR ESPACIO DE 45 DIAS A PARTIR DE SU PLANTACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T	PZA	500	\$ 26,965.00	500.00	\$26,965.00
45	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROSAS DE VARIOS COLORES DE 20 A 30 CM INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, TRAZO, EXCAVACION, PLANTADO, RELLENO, NIVELACION VERTICAL, PORCENTAJE DE REPOSICION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR ESPACIO DE 45 DIAS A PARTIR DE SU PLANTACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	500	\$ 33,840.00	500.00	\$33,840.00

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE COMISIONADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2016
PRONAPRED.
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ABIERTO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00032

COMPANIA
ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CUADRO ANEXO 2
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO

CONTRATO N°
PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:
REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

					CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
46	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO EN ROLLO WASHINGTON BENT INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, TRAZO, EXCAVACION, TENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 10 CMS MINIMO, PLANTADO, RELLENO, NIVELACION, COLOCACION DE FERTILIZANTE ORGANICO DE BORREGO A RAZON DE 100 GR/CM2, PORCENTAJE DE REPOSICION, PRIMERA PODA, CONSERVACION, RIEGO Y MANTENIMIENTO POR ESPACIO DE 45 DIAS A PARTIR DE SU PLANTACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	2265.07	\$ 118,304.61	1,321.34	\$69,013.59
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA CON LEYENDA ALUSIVA E INFORMATICA DE LA OBRA (MONTOS DE APORTACION E INVERSION) SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1	\$ 1,188.14	1.00	\$1,188.14
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE FIERRO COLADO CON EL NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO DEL PROGRAMA Y ESCUDOS DEL ESTADO, MUNICIPIO, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1	\$ 1,870.84	1.00	\$1,870.84
					SUMA	\$513,295.76
					IVA	\$82,127.32
					TOTAL	\$595,423.08

OPERACION
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016 PRONAPRED
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDA EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00031

COMPANIA ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.					CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO	
CONTRATO N° PF/PRONAPRED/166/16						
OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN						
PRESUPUESTO CONTRATADO					CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
(Empty space for details)						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA, INCLUYE: BARROTES ESTACAS, VARILLAS, HILO CALHIDRA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	3000	\$ 15,060.00	367.20	\$1,843.34
2	DESPALME DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALEM FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M3	450	\$ 19,138.50	55.08	\$2,342.55
3	EXCAVACION EN CORTE POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA, Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION NO APROVECHABLE FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	M3	600	\$ 35,328.00	73.44	\$4,324.15
4	MEJORAMIENTO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE), PUESTO EN OBRA EN CAPAS DE 10 CMS. COMPACTADO AL 95 % PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL, NIVELADO, HIDRATACION DEL MATERIAL PARA SU COMPACTACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	300	\$ 80,061.00	76.86	\$20,511.63

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA
 NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
 PRONAPRED.
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:



C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SÁNCHEZ

Residente de Obra:



ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00030

COMPANIA
ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CUADRO ANEXO 2
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO

CONTRATO N°
PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:
REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

**CANTIDAD NO
EJECUTADA DEL
CATALOGO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO LINEA CLASICA DE 2.50 M DE ALTURA, CON PLIEGUES EN FORMA DE "V" CON ABERTURA DE 50 X 200 MM, CAL 6 DE 4.89 MM. INCLUYE; POSTES DE REJA ACERO CLASICA ALTURA 3.10 M. CAL 16 DE 2 1/4" X 2 1/4", ABRZADERA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/4", TAPA DE POLIPROPILENO PARA POSTE, CONCRETO PARA ANCLAJE DE F'= 150 KG/CM2, TORNILLO PARA SUJECION, NIVELACION, PLOMEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA.	ML	350	\$ 373,093.00	7.88	\$8,399.92
21	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION 30X30 CMS., CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VAR DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @15 CMS., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	40	\$ 30,701.60	40.00	\$30,701.60
22	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION DE 0.20X0.30 MTS. CON CONCRETO 200 KG/CM2 AGREGADO DE 38MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, CON ADITIVO FESTERMIX, CIMBRA, ACABADO APARENTE, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 6 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS DE # 2 @ 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	20	\$ 6,381.80	20.00	\$6,381.80

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016 PRONAPRED.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:
C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SÁNCHEZ

Residente de Obra:
ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00029

COMPANIA
ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CUADRO ANEXO 2
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO

CONTRATO N°
PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:
REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
23	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5 X 12 X 24 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 JUNTAS GUSANEADAS DE 1.5 CM, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 6 MTS, DETALLES DE ARCO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	35	\$ 8,796.20	35.00	\$8,796.20
24	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION DE 0.20X0.30 MTS. CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 38 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, CON ADITIVO FESTERMIX, CIMBRA, ACABADO APARENTE, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 6 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS DE # 2 @ 0.20 MTS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS ELEVADO CON BOTE, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	20	\$ 7,237.00	20.00	\$7,237.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO DE TRIDILOSA DE 30 CMS DE ALTO CON POLICARBONATO COLOR HUMO, INCLUYE: BASE DE ALUMINIO PARA RECIBIR POLICARBONATO, ANCLAS AHOGADAS EN CONCRETO, BASES DE UNION DE TRIDILOSA CON POLICARBONATO, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	20	\$ 26,085.20	20.00	\$26,085.20

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE QUIEBRO CONSIGNADO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED.
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SÁNCHEZ



Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE



COMPANÍA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CUADRO ANEXO 2
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

**CANTIDAD NO
EJECUTADA DEL
CATALOGO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
26	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (VINIMEX) A 2 MANOS, SOBRE MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: CINTA DE RESTRICCIÓN DE AREA DE TRABAJO, SEÑALIZACION VIAL Y PEATONAL (CONOS, SEÑALES DE IDENTIFICACION DE AREAS DE TRABAJO, ETC.) EQUIPO DE SEGURIDAD (CASCO, CHALECOS REFLEJANTES, ETC) RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES QUE INTERVENGAN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	80.07	\$ 5,074.84	80.07	\$5,074.84
27	DESPALME DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M3	37	\$ 1,551.04	3.41	\$142.95
28	FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, COLADO EN LOSAS DE 1.50 X 2.00 MTS. REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10X10, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN EL PERIMETRO, INCLUYE: NIVELACION EN EL TERRENO, COMPACTACION MECANICA, CIMBRA FRONTERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	370	\$ 67,488.00	34.03	\$6,207.07

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED.
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SÁNCHEZ

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

COMPANIA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CUADRO ANEXO 2
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

**REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
OCOTLÁN**

PRESUPUESTO CONTRATADO

**CANTIDAD NO
EJECUTADA DEL
CATALOGO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	OPERADO CANTIDAD 2016	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE UNIPILAS SBS 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO, TAPA PORO IMPERPRIM S" A RAZON DE 0.20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEADO DE GRIETAS Y FISURAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO "BITUPLASTIC AI" COLOCACION DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S. CON UN 12 % DE POLYMEROS Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS/CM2 CON UNA RESINA TERMOFIJA, EN 3.5 MM. DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIOS DE TERMOFUSION CON SOPLETE DE GAS BUTANO INCLUYE: RETIRO DEL ANTERIOR IMPERMEABILIZANTE, TRASLAPE ENTRE LIENSO Y LIENSO, SELLADO DE PUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	240	\$ 28,855.20	57.06	\$6,860.32
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE LINEA 2", INCLUYE: CRISTAL DE 6 MM, BOLSA, JUNQUILLO Y HERRAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	60	\$ 58,905.00	55.50	\$54,487.13
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE LINEA 3", INCLUYE: CRISTAL DE 8 MM, BOLSA, JUNQUILLO Y HERRAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	35	\$ 52,139.85	35.00	\$52,139.85
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA TANQUE PARA WC ELONGADO MARCA HELVEX O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: TRAMPA EXPUESTA, ASIENTO Y TAPA, BOTON ACCIONADOR, ELEMENTOS DE FIJACION MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7	\$ 23,148.02	7.00	\$23,148.02

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:

ING. MIGUEL BOLDAN ZARATE

COMPANIA
ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

**CUADRO ANEXO 2
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO**

CONTRATO N°
PF/PRONAPRED/166/16


OBRA:
REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

PRESUPUESTO CONTRATADO					CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: DISPOSITIVO TDS, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	3	\$ 16,988.22	3.00	\$16,988.22
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO TIPO OVALIN DE SOBREPONER COLOR BLANCO MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: LLAVE TEMPORIZADORA HELVEX TV-120, HERRAJES, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6	\$ 29,832.72	6.00	\$29,832.72
36	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS MARCA HELVEX INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6	\$ 6,506.10	6.00	\$6,506.10
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 4 MM DE ESPESOR DE 1.00X1.00 CON MARCO DE ALUMINIO	PZA	2	\$ 1,590.28	2.00	\$1,590.28
38	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE POLIURETANO MODELO ALCATRAZ O SIMILAR DE 0,90 X 0,90 MTS, ENDURECEDOR COLOR LAJA GRIS, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR GRIS OSCURO Y SELLADOR ACRILICO 25% SOLIDOS, BRILLO MEDIO PARA CONCRETO ESTAMPADO, FIRME DE CONCRETO 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, AGREGADO DE 38 mm, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, 0.10 M DE ESPESOR, INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	66	\$ 23,041.26	66.00	\$23,041.26

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED.

Superintendente de Obra:



C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SÁNCHEZ

Residente de Obra:



ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

COMPANIA
ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

**CUADRO ANEXO 2
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO**

CONTRATO N°
PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:
REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
OCOTLAN

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
ESTÁ SUJETO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
NACIONALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED.
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

PRESUPUESTO CONTRATADO

**CANTIDAD NO
EJECUTADA DEL
CATALOGO**


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
39	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE 1.10 X 1.20 PROM. INC: PLACA DE SEÑALIZACION TIPO POLYCONCRETO O SIMILAR, COLOR AZUL DE 0.40 X 0.40 M. CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO, TERMINADA CON VOLTEADOR, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4	\$ 5,895.32	4.00	\$5,895.32
42	ARRIATE A NIVEL DE PISO, COLOCADA EN FORMA CUADRADA DE PIEDRA COLOR BLANCO, ASENTADO CON MORTERO PROP.: 1:5 CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	102.1	\$ 31,880.73	102.10	\$31,880.73
44	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTAS DE ORNATO DE 20 A 40 CMS DE COLOR VARIOS, INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, TRAZO, EXCAVACION, PLANTADO, RELLENO, NIVELACION VERTICAL, PORCENTAJE DE REPOSICION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR ESPACIO DE 45 DIAS A PARTIR DE SU PLANTACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T	PZA	500	\$ 26,965.00	500.00	\$26,965.00
45	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROSAS DE VARIOS COLORES DE 20 A 30 CM INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, TRAZO, EXCAVACION, PLANTADO, RELLENO, NIVELACION VERTICAL, PORCENTAJE DE REPOSICION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR ESPACIO DE 45 DIAS A PARTIR DE SU PLANTACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	500	\$ 33,840.00	500.00	\$33,840.00

Superintendente de Obra:



C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:



ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

COMPANIA ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.					CUADRO ANEXO 2 DEL FINIQUITO DE CONTRATO	
CONTRATO N° PF/PRONAPRED/166/16						
OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN						
PRESUPUESTO CONTRATADO						CANTIDAD NO EJECUTADA DEL CATALOGO
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
46	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO EN ROLLO WASHINGTON BENT INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, TRAZO, EXCAVACION, TENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 10 CMS MINIMO, PLANTADO, RELLENO, NIVELACION, COLOCACION DE FERTILIZANTE ORGANICO DE BORREGO A RAZON DE 100 GR/CM2, PORCENTAJE DE REPOSICION, PRIMERA PODA, CONSERVACION, RIEGO Y MANTENIMIENTO POR ESPACIO DE 45 DIAS A PARTIR DE SU PLANTACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	2265.07	\$ 118,304.61	1,321.34	\$69,013.59
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA CON LEYENDA ALUSIVA E INFORMATICA DE LA OBRA (MONTOS DE APORTACION E INVERSION) SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1	\$ 1,188.14	1.00	\$1,188.14
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE FIERRO COLADO CON EL NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO DEL PROGRAMA Y ESCUDOS DEL ESTADO, MUNICIPIO, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1	\$ 1,870.84	1.00	\$1,870.84
SUMA						\$513,295.76
IVA						\$82,127.32
TOTAL						\$595,423.08

OPERADO
EJERCICIO 2016
 PROGRAMA PRONAPRED
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUANTO CUAL CANCELADO A LOS RECURSOS PUBLICOS
 FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
 NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
 PRONAPRED
 ESTE PROGRAMA ES VÁLIDO AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00023

COMPAÑIA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN

PRESUPUESTO ADICIONAL

				CANTIDADES ADICIONALES AL CONTRATO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
N-139-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS TIPO LOUVER PARA SANITARIOS DE 1.40 X 2.40 M. HECHAS A BASE DE AR 1 1/2", CELOSIA LOUVER, ANGULO DE 1 1/2", INCLUYE: CHAPA, BISAGRAS 5/8" SOLDADURA, COLOCACION, PRIMER, ESMALTE, TAQUETES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	\$5,208.75	\$ 41,670.00
N-139-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO DE 3" NATURAL, CON VIDRIO NATURAL ESMERILADO DE 6 MM, DE SECCION 2.40 X .90 M, INCUYE: COLOCACION, CALAFATEO, CHAPA PHILLIPS 549, DUELA 5 ONDAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$3,098.80	\$ 9,296.40
N-139-003	PORTONES EN ACCESOS A SANITARIOS DE 3.80X2.40 M. HECHOS A BASE DE AR DE 2" Y R200, INCLUYE: BIBELES, TEJUELOS, CHAPA, ELEVADORES, SOLDADURA, PRIMER, ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$11,348.62	\$ 22,697.24
N-139-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAGUAN, HECHO A BASE DE PERFILES TUBULARES Y REJACERO, AR DE 2" CON TEJUELO DE 2 1/2" , BIBELES DE 2 1/2" INCLUYE: TEJUELOS, BIBELES, CERROJO 1", PASADORES, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	22.48	\$1,560.59	\$ 35,082.06
N-139-005	"PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE SANITARIOS DE 2.40 X 1.40 M CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL 1750 DE 1 3/4" X 1 3/4" INCLUYE : UN FIJO DE 40 CMX 2.40 M DE ALTO, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA."	PZA	2.00	\$5,626.99	\$ 11,253.98
N-139-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE GRADAS A BASE DE MONTENES EN CAJA DE 12" C-14 Y MONTENES EN CAJA DE 6", AR DE 3"X2" Y LAMINA GALVANIZADA DE 6.10M DE LARGO, INCLUYE: MATERIAL, PRIMER, ESMALTE, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	63.34	\$654.48	\$ 41,454.76

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
PROPÓSITOS AJENOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO

Residente de Obra

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00022

COMPAÑIA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN

PRESUPUESTO ADICIONAL

CANTIDADES
ADICIONALES
AL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
N-139-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD FLUORESCENTE DE EMPOTRAR 2 x 28 W MATERIA PRIMA LAMINA DE ACERO, TERMINADO PINTURA COLOR BLANCO PANTALLA LOUVER/ALUMINIO MARCA TECNOLITE MODELO MONTISI LTL-2281/41. TIPO DE LAMPARA 2XF28T5 CON ESTAÑADO DE CABLES Y CAPUCHON. 2 TUBOS DE 28 WATTS BLANCO FRÍO 4100 K CABLE No. 12, BALASTRO ELECTRÓNICO 2 x 28 W, 100-127V, INCLUYE : ADAPTACIÓN DE ESPACIO EN PLAFON DE TABLAROCA Y RETIRO DE LAMPARA EXISTENTE, BASE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	26.00	\$1,226.43	\$ 31,887.18
N-139-008	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, INCLUYE: SOLVENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL.	ML	344.26	\$31.17	\$ 10,730.58
N-139-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARBOTANTE TECNOLITE CAT. SL-20 MODELO VITORIO, INCLUYE (FOCO AHORRADOR) DE 26 WATTS 120 V., CABLE No. 12, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	\$489.19	\$ 5,381.09
N-139-010	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE SOBRE GRADAS, INCLUYE: RESANADOR EN GRIETAS, PREPERACION DE LA SUPERFICIE (BOTAR PINTURA EXISTENTE), MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	97.17	\$70.83	\$ 6,882.55
N-139-011	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, INCLUYE: 2 MANOS DE PRIMER, ESMALTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	69.29	\$86.56	\$ 5,997.74

OPERADO
EJECUCION
PROGRAMA PRONAPRED
EL IMPORTE COMENZADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE COBERTO POR CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVES DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00021

COMPAÑIA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN

PRESUPUESTO ADICIONAL

				CANTIDADES ADICIONALES AL CONTRATO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
N-139-012	RELLENO DE MORTERO CEMENTO-ARENA-CACAHUATILLO PROP. 1:2:9 EN AZOTEA DE 7.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FINO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: CHAFLAN PERIMETRAL DE 10 X 10 CM. , ELEVACION DEL MATERIAL A 5.00 M. ACARREO, TENDIDO, NIVELACION, APISONADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	153.39	\$160.11	\$ 24,559.27
N-139-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA Y PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL, DE 75 MM, INCLUYE: TABLERO DE ALUMINIO, HERRAJES, PASADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	\$4,208.26	\$ 29,457.82
N-139-014	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN, INCLUYE: DEMOLICION DE CADENAS, CASTILLOS Y COLUMNAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A PRIMERA ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	8.73	\$51.40	\$ 448.72
N-139-015	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	190.50	\$78.65	\$ 14,982.83
N-139-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA LAVABO, INCLUYE: CESPOL CROMADO, LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	8.00	\$1,510.92	\$ 12,087.36
N-139-017	RETIRO DE LAMPARAS CON RECUPERACION EN LOSA Y PLAFON, INCLUYE: ACARREO A BODEGA HASTA 60 M. , MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	37.00	\$118.74	\$ 4,393.38
				SUMA	\$308,262.97
				IVA	\$49,322.08
				TOTAL	\$357,585.05

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGOS Y LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL 2014
PRONAPRED
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

COMPAÑIA ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.				00020	
CONTRATO N° PF/PRONAPRED/166/16					
OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN					
PRESUPUESTO ADICIONAL					
					CANTIDADES ADICIONALES AL CONTRATO
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
N-139-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS TIPO LOUVER PARA SANITARIOS DE 1.40 X 2.40 M. HECHAS A BASE DE AR 1 1/2", CELOSIA LOUVER, ANGULO DE 1 1/2", INCLUYE: CHAPA, BISAGRAS 5/8" SOLDADURA, COLOCACION, PRIMER, ESMALTE, TAQUETES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	\$5,208.75	\$ 41,670.00
N-139-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO DE 3" NATURAL, CON VIDRIO NATURAL ESMERILADO DE 6 MM, DE SECCION 2.40 X .90 M, INCUYE: COLOCACION, CALAFATEO, CHAPA PHILLIPS 549, DUELA 5 ONDAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$3,098.80	\$ 9,296.40
N-139-003	PORTONES EN ACCESOS A SANITARIOS DE 3.80X2.40 M. HECHOS A BASE DE AR DE 2" Y R200, INCLUYE: BIBELES, TEJUELOS, CHAPA, ELEVADORES, SOLDADURA, PRIMER, ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$11,348.62	\$ 22,697.24
N-139-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAGUAN, HECHO A BASE DE PERFILES TUBULARES Y REJACERO, AR DE 2" CON TEJUELO DE 2 1/2" , BIBELES DE 2 1/2" INCLUYE: TEJUELOS, BIBELES, CERROJO 1", PASADORES, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	22.48	\$1,560.59	\$ 35,082.06
N-139-005	"PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE SANITARIOS DE 2.40 X 1.40 M CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL 1750 DE 1 3/4" X 1 3/4" INCLUYE : UN FIJO DE 40 CMX 2.40 M DE ALTO, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA."	PZA	2.00	\$5,626.99	\$ 11,253.98
N-139-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE GRADAS A BASE DE MONTENES EN CAJA DE 12" C-14 Y MONTENES EN CAJA DE 6", AR DE 3"X2" Y LAMINA GALVANIZADA DE 6.10M DE LARGO, INCLUYE: MATERIAL, PRIMER, ESMALTE, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	63.34	\$654.48	\$ 41,454.76

OPERADO
EJERCICIO 2016

PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
ESTRATEGIA POLÍTICA. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00019

COMPañIA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN

PRESUPUESTO ADICIONAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDADES ADICIONALES AL CONTRATO	
				P.U.	IMPORTE
N-139-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD FLUORESCENTE DE EMPOTRAR 2 x 28 W MATERIA PRIMA LAMINA DE ACERO, TERMINADO PINTURA COLOR BLANCO PANTALLA LOUVER/ALUMINIO MARCA TECNOLITE MODELO MONTISI LTL-2281/41. TIPO DE LAMPARA 2XF28T5 CON ESTAÑADO DE CABLES Y CAPUCHON. 2 TUBOS DE 28 WATTS BLANCO FRÍO 4100 K CABLE No. 12, BALASTRO ELECTRÓNICO 2 x 28 W, 100-127V, INCLUYE : ADAPTACIÓN DE ESPACIO EN PLAFON DE TABLAROCA Y RETIRO DE LAMPARA EXISTENTE, BASE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	26.00	\$1,226.43	\$ 31,887.18
N-139-008	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, INCLUYE: SOLVENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL.	ML	344.26	\$31.17	\$ 10,730.58
N-139-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARBOTANTE TECNOLITE CAT. SL-20 MODELO VITORIO, INCLUYE (FOCO AHORRADOR) DE 26 WATTS 120 V., CABLE No. 12, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO ANDAMIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	\$489.19	\$ 5,381.09
N-139-010	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE SOBRE GRADAS, INCLUYE: RESANADOR EN GRIETAS, PREPERACION DE LA SUPERFICIE (BOTAR PINTURA EXISTENTE), MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	97.17	\$70.83	\$ 6,882.55
N-139-011	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, INCLUYE: 2 MANOS DE PRIMER, ESMALTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	69.29	\$86.56	\$ 5,997.74

OPERA
EJERCICIO 2016

PROGRAMA PRONAPRED

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
ESTÁ SUJETO AL CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
RECURSOS OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
PROCESO LEGAL. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

COMPAÑIA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

00018

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN

PRESUPUESTO ADICIONAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDADES ADICIONALES AL CONTRATO	
				P.U.	IMPORTE
N-139-012	RELLENO DE MORTERO CEMENTO-ARENA-CACAHUATILLO PROP. 1:2:9 EN AZOTEA DE 7.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FINO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: CHAFLAN PERIMETRAL DE 10 X 10 CM. , ELEVACION DEL MATERIAL A 5.00 M. ACARREO, TENDIDO, NIVELACION, APISONADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	153.39	\$160.11	\$ 24,559.27
N-139-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA Y PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL, DE 75 MM, INCLUYE: TABLERO DE ALUMINIO, HERRAJES, PASADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	\$4,208.26	\$ 29,457.82
N-139-014	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN, INCLUYE: DEMOLICION DE CADENAS, CASTILLOS Y COLUMNAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A PRIMERA ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	8.73	\$51.40	\$ 448.72
N-139-015	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	190.50	\$78.65	\$ 14,982.83
N-139-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA LAVABO, INCLUYE: CESPOL CROMADO, LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	8.00	\$1,510.92	\$ 12,087.36
N-139-017	RETIRO DE LAMPARAS CON RECUPERACION EN LOSA Y PLAFON, INCLUYE: ACARREO A BODEGA HASTA 60 M. , MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	37.00	\$118.74	\$ 4,393.38
				SUMA	\$308,262.97
				IVA	\$49,322.08
				TOTAL	\$357,585.05

PROGRAMA PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUENTRO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED.

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

FINIQUITO

00017

COMPAÑIA	ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.	CUADRO ANEXO 1 DEL FINIQUITO DE CONTRATO
CONTRATO N°	PF/PRONAPRED/166/16	

OBRA:
REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO	
					CANTIDAD	IMPORTE
5	FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, COLADO EN LOSAS DE 1.50 X 2.00 MTS. REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10X10, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN PERIMETRO, INCLUYE: NIVELACION EN EL TERRENO, COMPACTACION MECANICA, CIMBRA FRONTERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	56.45	\$ 12,199.41	222.48	\$48,080.15
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EVER GREEN PLAYGARDEN DE POLIETILENO DE 22 MM ALTURA DESFIBRILADO THOLON, INCLUYE: ARENA SILICA, HULE TRITURADO NEGRO, PROTECCION CONTRA RAYOS UV, INSTALACION Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	56.45	\$ 17,862.47	222.48	\$70,399.35
17	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	21.00	\$ 1,186.08	21.10	\$1,191.73
18	GUARNICIONES DE SECCION 0.20 X 0.20 X 0.50 MTS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45 GRADOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	350.00	\$ 82,484.50	0.93	\$219.17
19	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	18.00	\$ 1,034.46	3.05	\$175.28

OPERADO
EJERCICIO 2016
 PROGRAMA: PRONAPRED
 EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
 NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
 PRONAPRED
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
 PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA


 Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SÁNCHEZ


 Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00016

COMPAÑIA ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.	CUADRO ANEXO 1 DEL FINIQUITO DE CONTRATO
CONTRATO N° PF/PRONAPRED/166/16	

OBRA:
REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

					VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATÁLOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
29	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (VINIMEX) A 2 MANOS, SOBRE MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: CINTA DE RESTRICCIÓN DE AREA DE TRABAJO, SEÑALIZACIÓN VIAL Y PEATONAL (CONOS, SEÑALES DE IDENTIFICACION DE AREA DE TRABAJO, ETC) EQUIPO DE SEGURIDAD (CASCO, CHALECOS REFLEJANTES, ETC) RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES QUE INTERVENGAN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	950.10	\$ 60,217.34	894.50	\$56,693.41
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL NEGRA, INCLUYE: TENDIDO, NIVELACION Y ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T	M3	30.00	\$ 7,528.20	64.37	\$16,153.01
49	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DE DEMOLICIONES, CORTES, EXCAVACIONES Y ESCOMBRO EN GENERAL, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M2	3,000.00	\$ 16,290.00	0.10	\$0.54
SUMA						\$192,912.64
IVA						\$30,866.02
TOTAL						\$223,778.67

**OPERADO
EJERCICIO 2016**

PROGRAMA: PRONAPRED

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016 PRONAPRED.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA



Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SÁNCHEZ



Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00015

COMPAÑIA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CUADRO ANEXO 1
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

VOLUMENES
ADICIONALES
AL DE CATALOGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5	FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, COLADO EN LOSAS DE 1.50 X 2.00 MTS. REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10X10, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN PERIMETRO, INCLUYE: NIVELACION EN EL TERRENO, COMPACTACION MECANICA, CIMBRA FRONTERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	56.45	\$ 12,199.41	222.48	\$48,080.15
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EVER GREEN PLAYGARDEN DE POLIETILENO DE 22 MM ALTURA DESFIBRILADO THOLON, INCLUYE: ARENA SILICA, HULE TRITURADO NEGRO, PROTECCION CONTRA RAYOS UV, INSTALACION Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	56.45	\$ 17,862.47	222.48	\$70,399.35
17	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMUN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	21.00	\$ 1,186.08	21.10	\$1,191.73
18	GUARNICIONES DE SECCION 0.20 X 0.20 X 0.50 MTS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO APARENTE, PULIDO EN CORONA CON VOLTEADOR, JUNTA CONSTRUCTIVA A 45 GRADOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	350.00	\$ 82,484.50	0.93	\$219.17
19	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	18.00	\$ 1,034.46	3.05	\$175.28

OPERADO
EJERCICIO 2016

PROGRAMA: PRONAPRED

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED.

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

FINIQUITO

00014

COMPAÑIA

ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.

CUADRO ANEXO 1
DEL FINIQUITO DE
CONTRATO

CONTRATO N°

PF/PRONAPRED/166/16

OBRA:

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN

PRESUPUESTO CONTRATADO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMENES ADICIONALES AL DE CATALOGO	
					CANTIDAD	IMPORTE
29	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (VINIMEX) A 2 MANOS, SOBRE MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: CINTA DE RESTRICCIÓN DE AREA DE TRABAJO, SEÑALIZACIÓN VIAL Y PEATONAL (CONOS, SEÑALES DE IDENTIFICACION DE AREA DE TRABAJO, ETC) EQUIPO DE SEGURIDAD (CASCO, CHALECOS REFLEJANTES, ETC) RESANES DE HASTA EL 5% DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES QUE INTERVENGAN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	950.10	\$ 60,217.34	894.50	\$56,693.41
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL NEGRA, INCLUYE: TENDIDO, NIVELACION Y ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T	M3	30.00	\$ 7,528.20	64.37	\$16,153.01
49	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DE DEMOLICIONES, CORTES, EXCAVACIONES Y ESCOMBRO EN GENERAL, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M2	3,000.00	\$ 16,290.00	0.10	\$0.54
SUMA						\$192,912.64
IVA						\$30,866.02
TOTAL						\$223,778.67

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED.
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Superintendente de Obra:

C. ARQ. ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ

Residente de Obra:

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE

SEC-OF-DIU-411/2016

00013

ASUNTO: SE COMUNICA PERIODO DE ELABORACIÓN DEL FINIQUITO.

TLAXCALA, TLAX. A 22 DE DICIEMBRE DE 2016

USE

ARQ. JAVIER GARCIA ANGELES
REPRESENTANTE LEGAL
ORIENTAL SUCOCO, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° PF/PRONAPRED/166/16 RELATIVO A LA OBRA: **REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLAN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA.**

POR ESTE CONDUCTO LE NOTIFICO QUE EL PERIODO DE ELABORACION DEL FINIQUITO DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2016, Y EL EVENTO DE FIRMA DEL MISMO, SE REALIZARÁ EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 11:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ESTA SECRETARÍA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRONAPRED
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES OTORGADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016
PRONAPRED.

ATENTAMENTE

ARG. JORGE SÁNCHEZ ARROYO
JEFE DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Recibido
Alejandro Guerrero
22/Dec/2016

C.C.P. RESIDENTE DE OBRA

