



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

Tlaxcala, Tlax., a 06 de diciembre de 2022
Oficio. - SI-DA-3068-B/2022

MTRO. RODRIGO CERDA CORNEJO
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN
DE LA COORDINACIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
P R E S E N T E

Con relación al programa Integración Regional Ordena y Sustentable para el presente Ejercicio Fiscal y para dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar de forma impresa el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable de los indicadores generados por el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), correspondientes al mes de noviembre del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CGPI

COORDINACIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

7 DIC 2022

RECIBIDO

c.c.p. Arq. Alfonso Sánchez García. – Titular de la Secretaria de Infraestructura. – Para su Conocimiento.
c.c.p. Archivo
AAB/RPA

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



6jgjmY0rcYDehuNyWFOYIV9SQ

1918

REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: 250. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) 2022

PERIODO: NOVIEMBRE

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA ADMINISTRADOS.		
1.2	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS REALIZADOS.		
1.3	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS.		



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 250 / 6Y. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) 2022

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 2231. SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION.

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 2571. PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA ADMINISTRADOS.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS/CONTRATOS - ACUERDOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONSTANTE UNIVERSAL3)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CAA	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS	0.42	CONTRATO
CONSTANTE	CAAPPCU3	CONTRATOS - ACUERDOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONSTANTE UNIVERSAL3)	3.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 250 / 6Y. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) 2022

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

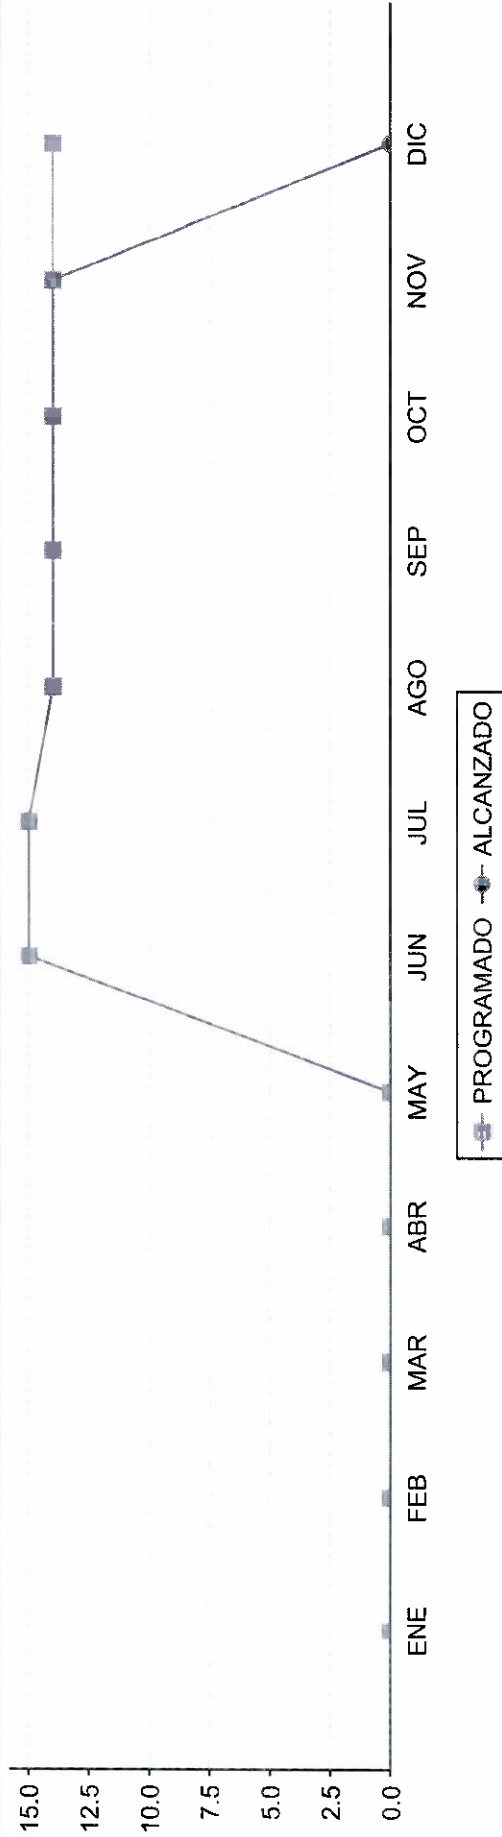

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARG. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARG. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



REPORTE DE VARIABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 250-PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) 2022 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 2231-SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 2571-PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA ADMINISTRADOS.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTP://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES](http://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES)
VARIABLE: CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

ELABORÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DEL PROYECTO
ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ
ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 250 / 6Y. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) 2022

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 2232. EJECUCIÓN DE CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION.

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 2572. PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS REALIZADOS.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(CONTRATOS EJECUTADOS/TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONSTANTE UNIVERSAL3)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CE	CONTRATOS EJECUTADOS	0.42	CONTRATO
CONSTANTE	TCAPPCU3	TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONSTANTE UNIVERSAL3	3.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 250 / 6Y. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) 2022

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

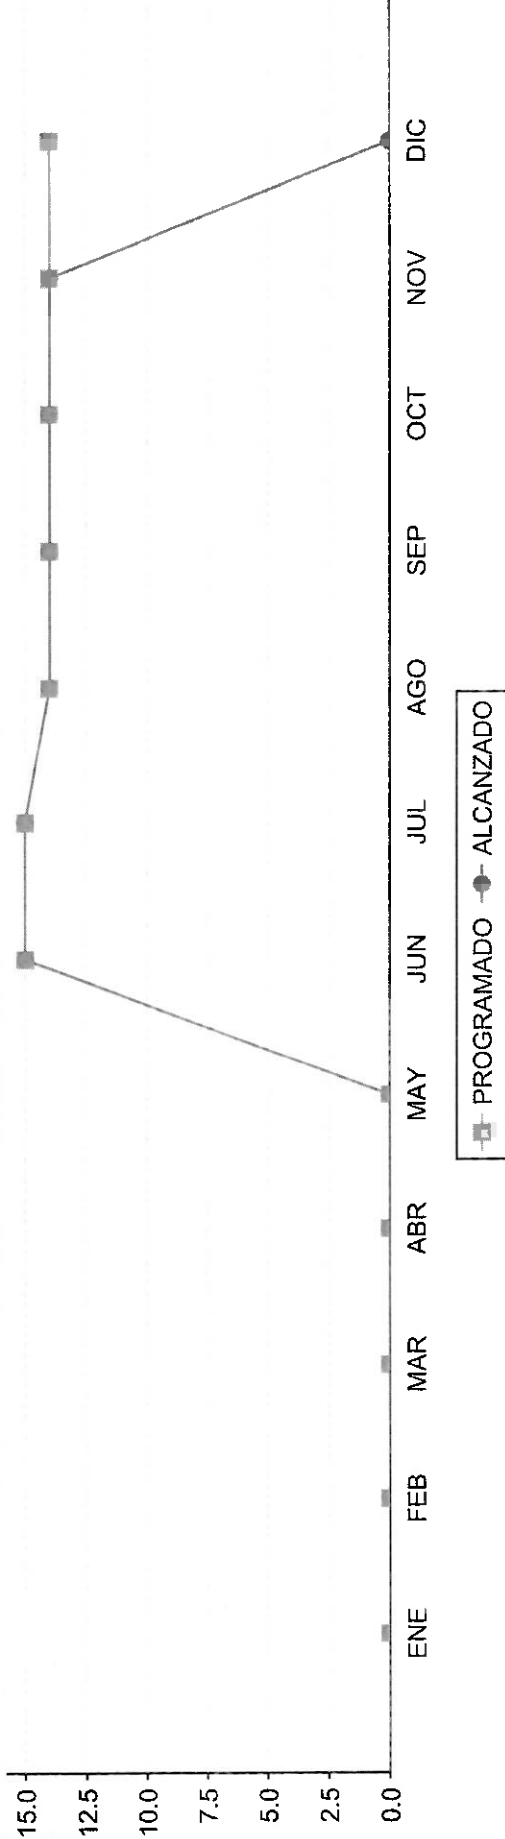

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARC. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARC. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 250-PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) 2022 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVOS: 2232-EJECUCIÓN DE CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION. UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

INDICADOR: 2572-PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS REALIZADOS.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTP://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES](http://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/seguimiento-de-indicadores)

VARIABLE: CONTRATOS EJECUTADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARG. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARG. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
PROYECTO: 250 / 6Y. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) 2022 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVO: 2233. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION. **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO
INDICADOR: 2573. PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(EXPEDIENTES ELABORADOS/TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONSTANTE UNIVERSAL3)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	EE	EXPEDIENTES ELABORADOS	0.42	EXPEDIENTE
CONSTANTE	TEAPPCU3	TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONSTANTE UNIVERSAL3	3.00	EXPEDIENTE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 250 / 6Y. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) 2022

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

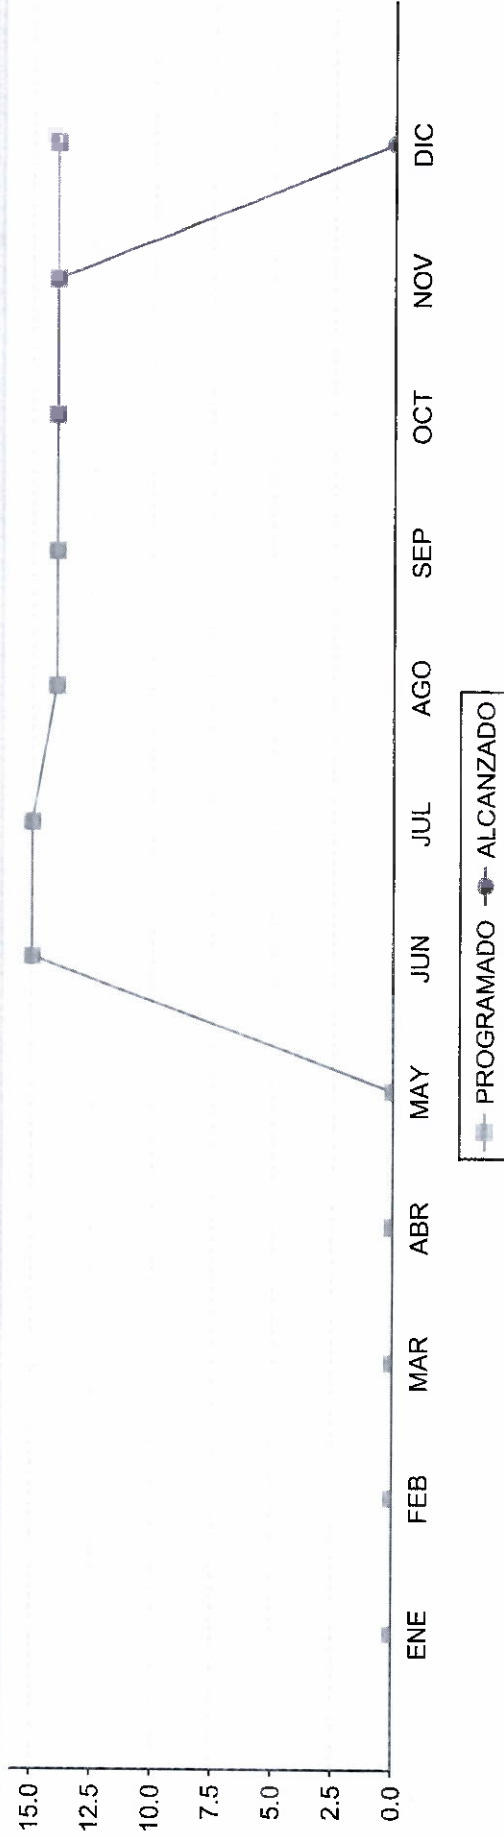

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA





TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA
DE FINANZAS

REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 250-PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) 2022 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 2233-ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 2573-PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTP://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES](http://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES)

VARIABLE: EXPEDIENTES ELABORADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

