



Tlaxcala, Tlax., a 13 de enero de 2026

DESPACHO-SI-0016/2026

ASUNTO: ENVÍO DE INDICADORES.

ACUSE

DR. NOÉ RODRIGUEZ ROLDÁN
COORDINADOR GENERAL DE
PLANEACIÓN E INVERSIÓN
PRESENTE



23 ENE 2026

RECIBIDO



En relación a los programas de obra pública que ejecuta esta Secretaría para el presente Ejercicio Fiscal, y con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar a usted en forma digital firmado a través de la Plataforma de Cero Papel, el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable de los indicadores, generados por el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), correspondientes al mes de diciembre de 2025, conforme al siguiente listado:

NO. DE OFICIO: 0016		NO. DE OBRA ESPECÍFICA	NOMBRE DE LA OBRA
1	A	49/1D	Control Administrativo Secretaría de Infraestructura (SI)
2	B	51/1F	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF
3	C	53/1H	Infraestructura
4	D	329/95	Rehabilitación de Carretera La Soledad - Las Cuevas
5	E	330/96	Reconstrucción del Camino Real Papalotla-Tepeyanco (Primera Etapa)
6	F	331/97	Rehabilitación de Carretera Espíritu Santo-Alpotzonga
7	G	332/98	Rehabilitación de Carretera Perimetral Malintzi San Isidro Buen Suceso-Altamira Guadalupe (Primera Etapa)
8	H	333/99	Rehabilitación de Carretera Muñoz-La Trasquila
9	I	334/9A	Reconstrucción de Carretera Acceso a Tzompantepec (Primera Etapa)
10	J	338/9E	Reingeniería de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tlatempan (Segunda Etapa) y Construcción de Ecoparque y Zonas Recreativas Medioambientales
11	K	341/9H	Construcción de Puente Vehicular Almoloya, en Sección Tercera

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala - Puebla, Tlaxcala. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

2021 - 2027

12	L	348/9O	Rehabilitación del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud "ITAES" (Primera Etapa)
13	M	360/A0	Construcción del Laboratorio de la Secretaría de la Función Pública (Primera Etapa)
14	N	361/A1	Construcción de Barda Perimetral en el Zoológico del Altiplano
15	Ñ	362/A2	Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de Salas de Oralidad Civiles y Familiares
16	O	363/A3	Construcción de la Ciudad Administrativa de Tlaxcala (CIAT) (Tercera Etapa)
17	P	364/A4	Construcción del CRIT (Cuarta Etapa)
18	Q	366/A6	Rehabilitación de Carretera de Conexión Periférico-Carretera La Soledad
19	R	367/A7	Reconstrucción de Carretera Tlacomulco-Santa Cruz Tetela (Primera Etapa)
20	S	368/A8	Construcción de Infraestructura en Camino de Acceso al Banco de Alimentos
21	T	369/A9	Construcción de la Ciudad de la Cultura y del Entretenimiento (Segunda Etapa)
22	U	372/AC	Construcción de Infraestructura en Calle Sin Nombre
23	V	373/AD	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Adoquín en Calle 6 de Agosto, en Colonia 1901
24	W	375/AF	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples
25	X	376/AG	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Adoquín y Alcantarillado Sanitario en Calle Jacarandas
26	Y	377/AH	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
27	Z	378/AI	Sustitución de Pavimento con Adoquín, Alcantarillado Sanitario y Alumbrado Público en Calle de Los Misterios (Primera Etapa)
28	AA	382/AM	Construcción de Casa del Abuelo, en Chipilo
29	AB	383/AN	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Adoquín en Calle Lázaro Cárdenas
30	AC	384/AO	Adecuación de Inmueble para Cancha de Fútbol Rápido
31	AD	388/AS	Construcción de Pavimento con Adoquín en Calle Miguel Hidalgo (Primera Etapa)

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala - Puebla, Tlaxcala. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

2021 - 2027

32	AE	389/AT	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Adoquín y Agua Potable en Calle 16 de Septiembre (Tercera Etapa)
33	AF	390/AU	Construcción de Pavimento con Adoquín en Calle Domingo Arenas (Primera Etapa)
34	AG	391/AV	Construcción de Gimnasio Multideportivo en Unidad Deportiva "Tlahuicole" (Primera Etapa)
35	AH	392/AW	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Adoquín, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Calle Revolución (Primera Etapa), en Sección Tercera
36	AI	393/AX	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Repavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle Cañada Morelos (Primera Etapa), en Barrio Xaltipa
37	AJ	394/AY	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Adoquín y Alumbrado Público en Calle Xicohtécatl
38	AK	395/AZ	Sustitución de Pavimento con Adoquín, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Calle Primero de Mayo
39	AL	396/B0	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Concreto Hidráulico, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Calle Sin Nombre
40	AM	397/B1	Ampliación y Rehabilitación de Presidencia Municipal (Primera Etapa)
41	AN	398/B2	Sustitución de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle Galeana (Primera Etapa)
42	AÑ	401/B5	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Adoquín y Alumbrado Público en Prolongación Los Linderos
43	AO	402/B6	Rehabilitación de Plaza de la Constitución, Plaza Xicohtécatl y Portales
44	AP	403/B7	Iluminación Arquitectónica de la Basílica de Ocotlán
45	AQ	404/B8	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Adoquín y Agua Potable en Calle Lucio Cabañas, en N.C.P. Álvaro Obregón
46	AR	405/B9	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Adoquín y Alcantarillado Sanitario en Calle Fresnos (Primera Etapa)
47	AS	406/BA	Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Próspero Cahuantzi"
48	AT	408/BC	Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)
49	AU	409/BD	Construcción de Barda Perimetral y Rehabilitación de Almacén en Inmueble del Gobierno del Estado

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala – Puebla, Tlaxcala. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

2021 - 2027

50	AV	410/BE	Sustitución de Pavimento con Adoquín en Calle Progreso (Primera Etapa)
51	AW	411/BF	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Adoquín, Agua Potable y Alumbrado Público en Calle División del Norte, en Colonia Venustiano Carranza
52	AX	412/BG	Construcción de guarniciones y pavimento con adoquín en calle 21 de Marzo (Primera Etapa)
53	AY	413/BH	Construcción de guarniciones, banquetas, pavimento con adoquín, agua potable y alcantarillado sanitario en calle Francisco I. Madero
54	AZ	414/BI	Construcción de pavimento con adoquín en calle 2 de Noviembre
55	BA	415/BJ	Construcción de gradas, sanitarios y empastado de cancha de fútbol
56	BB	416/BK	Rehabilitación y construcción de espacios en Unidad Deportiva (Primera Etapa), en Sección Cuarta
57	BC	417/BL	Sustitución de guarniciones y banquetas en calle República de Argentina (Primera Etapa), en Sección Primera Actipac y Sección Segunda Teotlalpan
58	BD	420/BO	Ampliación de Presidencia Municipal (Primera Etapa)
59	BE	421/BP	Sustitución de Pavimento con Adoquín en Calle Francisco I. Madero
60	BF	422/BQ	Construcción de Pavimento con Adoquín en Prolongación Reforma
61	BG	425/BT	Sustitución de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Concreto Hidráulico en Avenida 5 de Mayo y Calle Ciudadano Cuéllar Abaroa
62	BH	426/BU	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Adoquín y Alumbrado Público en Calle Iturbide (Primera Etapa), en Barrio de San José
63	BI	427/BV	Construcción de la Central de Abastos y Rehabilitación de Mercado (Segunda Etapa)
64	BJ	428/BW	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Adoquín en Calle Álamos (Primera Etapa)
65	BK	429/BX	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Calle Santa Cruz (Segunda Etapa)
66	BL	430/BY	Rehabilitación de Panteón Municipal
67	BM	431/BZ	Sustitución y Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle y Cerrada Blanca Estela Pavón
68	BN	432/CO	Participación Social (Contraloría Social) Localidades Rurales

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala - Puebla, Tlaxcala. C.P. 90000

Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

2021 - 2027

69	BÑ	433/C1	Supervisión Técnica - Localidades Rurales
70	BO	434/C2	Proyectos Ejecutivos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
71	BP	435/C3	Proyectos Ejecutivos del Sistema de Agua Potable y Captación y Conducción de Aguas Residuales a Colectores y Emisores a PTAR Apizaco "A" y PTAR Tlatempan
72	BQ	436/C4	Proyecto Ejecutivo para la Captación y Conducción de Aguas Residuales a Colector y Emisor de la Margen Derecha del Río Zahuapan a PTAR Tlaxcala
73	BR	437/C5	Equipamiento de Pozo para Agua Potable, Electrificación, Tren de Descarga, Línea de Conducción, Red de Distribución, Caseta y Cercado
74	BS	438/C6	Equipamiento de Pozo para Agua Potable, Electrificación, Tren de Descarga, Línea de Conducción, Red de Distribución, Caseta, Cercado y Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento
75	BT	439/C7	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Calle Jardín de las Bugambilias, en Barrio de Dolores Aquiahuac
76	BU	440/C8	Sustitución de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle 3 Norte
77	BV	441/C9	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Concreto Hidráulico y Empedrado en Calle Emiliano Zapata
78	BW	442/CA	Sustitución de Banquetas y Pavimento con Adoquín en Acceso a Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente
79	BX	443/CB	Mejoramiento de Imagen Urbana en Autopista Tlaxcala-Textmelucan, Tramo 23 Zona Militar-EI Trébol
80	BY	446/CE	Sustitución de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Concreto Hidráulico y Agua Potable en Avenida Revolución (Primera Etapa)
81	BZ	448/CG	Sustitución de Guarniciones y Banquetas y Repavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle Emiliano Zapata, en Sección Séptima
82	CA	449/CH	Rehabilitación de Unidad Deportiva (Primera Etapa)
83	CB	450/CI	Construcción de Barda Perimetral y Suministro y Colocación de Un Juego Infantil y Bancas en Unidad Deportiva
84	CC	451/CJ	Construcción de Panteón Municipal (Primera Etapa)
85	CD	452/CK	Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Alumbrado en Unidad Deportiva

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala – Puebla, Tlaxcala. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

2021 - 2027

86	CE	453/CL	Construcción de Pavimento con Adoquín en Calle Emilio Sanchez Piedras (Segunda Etapa), en Barrio Xolalpan
87	CF	456/CO	Sustitución de Pavimento con Adoquín, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Calle Gavillero
88	CG	457/CP	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Adoquín y Alumbrado Público en Calle San Miguel Cuentla, en Sección Primera
89	CH	458/CQ	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Avenida Adolfo Ruiz Cortinez (Segunda Etapa)
90	CI	459/CR	Rehabilitación del Área de Recepción y Despacho de la Secretaría de Gobierno, Salón Verde, Salón Juárez y Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas
91	CJ	460/CS	Equipamiento de Pozo para Agua Potable, Electrificación, Tren de Descarga, Línea de Conducción, Red de Distribución, Caseta, Cercado y Tanque de Almacenamiento
92	CK	461/CT	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Ampliación de Alcantarillado Sanitario
93	CL	466/CY	Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo de Alto Rendimiento Tlaxcala (CEDDART) (Tercera Etapa)
94	CM	467/CZ	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Adoquín en Calle 20 de Noviembre (Segunda Etapa)
95	CN	468/D0	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Adoquín en Calle y Prolongación 10 de Mayo (Primera Etapa), en Barrio Estocapa
96	CÑ	469/D1	Construcción de Panteón Municipal (Primera Etapa)
97	CO	470/D2	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Calle 29 de Agosto
98	CP	471/D3	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Adoquín en Calle Sin Nombre (Primera Etapa)
99	CQ	474/D6	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Calle Primera 5 de Mayo (Primera Etapa), en Barrio México
100	CR	475/D7	Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) (Primera Etapa)
101	CS	476/D8	Sustitución de Pavimento con Adoquín en Entronque de Calles Abasolo y Niños Héroes, en Barrio Guadalupe
102	CT	477/D9	Sustitución de Pavimento con Adoquín en Calle Venustiano Carranza (Primera Etapa)

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala – Puebla, Tlaxcala. C.P. 90000

Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

2021 - 2027

103	CU	478/DA	Rehabilitación y Ampliación de Pavimento Asfáltico y Construcción de Guarniciones en Calle Hidalgo
104	CV	479/DB	Alumbrado Público en Calles Independencia, Escolar y 4 Sur (Primera Etapa)
105	CW	480/DC	Rehabilitación de UBR
106	CX	481/DD	Repavimentación y Ampliación de Pavimento Asfáltico en Calle La Luz (Primera Etapa), en Sección Doceava
107	CY	482/DE	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Calle Quimixtla (Primera Etapa)
108	CZ	483/DF	Construcción de Guarniciones y Alumbrado Público en Avenida Fundadores Hermanos Vázquez
109	DA	484/DG	Construcción de Pavimento con Adoquín en Calle Centenario (Primera Etapa), en Sección Tercera
110	DB	485/DH	Construcción de Cancha de Fútbol 7 en Unidad Deportiva
111	DC	486/DI	Construcción de Barda Perimetral en Unidad Deportiva "José Brindis"
112	DD	487/DJ	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Adoquín y Alumbrado Público en Calles Tapia y Francisco I. Madero (Segunda Etapa)
113	DE	488/DK	Construcción de Museo Arqueológico de Tepeticpac
114	DF	489/DL	Sustitución de Alcantarillado Sanitario en Calles Colima, Francisco I. Madero y Aquiles Serdán
115	DG	491/DN	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Adoquín y Alumbrado Público en Prolongación Ignacio Zaragoza
116	DH	492/DO	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Privada Los Pinos
117	DI	493/DP	Construcción de Pavimento con Adoquín en Calle Ignacio Zaragoza (Primera Etapa)
118	DJ	494/DQ	Construcción del C2 (Primera Etapa)
119	DK	495/DR	Rehabilitación de Azotea y Muros Interiores en Casa de Gobierno y Construcción de Andadores
120	DL	496/DS	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento Asfáltico en Calle 7 de Marzo
121	DM	497/DT	Rehabilitación de Campo de Fútbol

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala – Puebla, Tlaxcala. C.P. 90000

Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

2021 - 2027

122	DN	498/DU	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Adoquín, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Calle Río Bravo (Primera Etapa)
123	DN	499/DV	Sustitución de Guarniciones, Banquetas y Alumbrado Público en Calles Cuauhtémoc, 5 de Mayo y Sin Nombre
124	DO	500/DW	Construcción Arco de Bienvenida a la Ciudad de la Seguridad
125	DP	501/DX	Construcción de Unidad de Radioterapia y Radiocirugía (Segunda Etapa)
126	DQ	502/DY	Ampliación de Agua Potable en 3 Calles Sin Nombre
127	DR	503/DZ	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples y Rehabilitación de Muro
128	DS	504/E0	Rehabilitación del Centro de Convenciones (Primera Etapa)
129	DT	508/E4	Construcción de la Ciudad de la Juventud (Primera Etapa)
130	DU	514/EA	Rehabilitación de Azotea del Instituto de Catastro y Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado
131	DV	515/EB	Sustitución de Cancha de Basquetbol por Cancha de Usos Múltiples
132	DW	516/EC	Rehabilitación del Centro Cultural Huamantla (Primera Etapa)
133	DX	517/ED	Construcción de Guarniciones y Sustitución de Pavimento con Adoquín en Calle Berriozabal (Primera Etapa)
134	DY	518/EE	Ampliación de Unidad Deportiva (Primera Etapa)
135	DZ	524/EK	Perforación de Pozo para Agua Potable
136	EA	525/EL	Construcción Arco de Bienvenida a la Ciudad de la Salud
137	EB	526/EM	Construcción de Pavimento con Adoquín en Calle Progreso, en Barrio San Nicolás
138	EC	527/EN	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Adoquín y Alumbrado Público en Calle Reforma (Primera Etapa)
139	ED	528/E0	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Emiliano Zapata
140	EE	529/EP	Construcción de Pavimento con Adoquín en Calle Chichicazac (Primera Etapa)
141	EF	530/EQ	Construcción de Fuente Interactiva en Parque Municipal
142	EG	531/ER	Construcción de Cancha de Fútbolito y Parque (Primera Etapa)

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala – Puebla, Tlaxcala. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

143	EH	532/ES	Construcción de Infraestructura en Calle Encinos de Ciudad Industrial Xicohténcatl III
144	EI	533/ET	Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Calles Bugambillas, Margaritas, Girasoles y Prolongación Negrete Sur
145	EJ	534/EU	Construcción de Gradas y Rehabilitación de Baños en Unidad Deportiva
146	EK	535/EV	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Adoquín, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Libramiento en Colonias Iturbide - El Sabinal
147	EL	536/EW	Construcción de Techumbre en Casa del Abuelo, en Sección Primera Poxtla
148	EM	537/EX	Sustitución de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Calle Hidalgo (Primera Etapa), en Barrio Tenantitla
149	EN	538/EY	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Tercera Privada Álvaro Obregón, en Barrio San Sebastián
150	EN	539/EZ	Construcción de Pavimento con Adoquín en Calle 3 de Mayo (Primera Etapa)
151	EO	540/F0	Construcción de Pavimento con Adoquín en Calle Adolfo López Mateos (Primera Etapa), en Barrio de Teotlalpan
152	EP	541/F1	Construcción de Kiosco y Fuente Interactiva en Parque
153	EQ	542/F2	Rehabilitación del Museo de Arte de Tlaxcala
154	ER	543/F3	Rehabilitación del Museo de la Memoria
155	ES	544/F4	Construcción y Rehabilitación del Complejo Polideportivo "Mayahuel" (Primera Etapa)
156	ET	545/F5	Rehabilitación del Recinto Ferial (Primera Etapa)
157	EU	546/F6	Reparación de Daños Causados por Vandalismo en Edificios y Espacios Públicos
158	EV	547/F7	Sustitución de Pavimento con Concreto Hidráulico y Alcantarillado Sanitario en Calle Antonio Carvajal (Primera Etapa), en Colonia Las Ánimas
159	EW	548/F8	Construcción de Reductores de Velocidad y Señalamiento Vial en las Laterales de la Carretera Tlaxcala - Apizaco
160	EX	549/F9	Construcción de Muros de Contención, Lavaderos y Obras Complementarias en Zonas Afectadas por Lluvias Atípicas de las Carreteras Atzayanca - Santa Cruz Pocitos, Xipetzinco - Huiloapan y Tepeyanco - Teolochoico

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala - Puebla, Tlaxcala. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906




SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

2021 - 2027

161	EY	550/FA	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Adoquín en Avenida El Rastro (Primera Etapa)
162	EZ	554/FE	Rehabilitación de la Casa de la Cultura y Construcción de Techo
163	FA	555/FF	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Agua Potable en Calle Palo Huerfano
164	FB	556/FG	Ampliación y Rehabilitación de la Presidencia Municipal (Primera Etapa)
165	FC	557/FH	Reconstrucción de Avenidas Ocotelulco y Tepeticpac, en Colonias San Isidro y Loma Xicohténcatl
166	FD	558/FI	Construcción de Panteón Municipal (Primera Etapa)
167	FE	559/FJ	Construcción de Bocas de Tormenta y Rejillas para Drenaje Pluvial y Obras Complementarias en Calles Aledañas al Río Zahuapan
168	FF	560/FK	Reconstrucción y Repavimentación Carretera de Acceso a Santiago Cuauila
169	FG	561/FL	Rehabilitación del Estadio "Tlahuicole" (Primera Etapa)
170	FH	563/FN	Demolición de las Estructuras Existentes dentro del Inmueble que ocupa el Centro de Seguridad Social (CSS)
171	FI	564/FO	Rehabilitación de Losas de Azotea en los Edificios A y B de CORACYT
172	FJ	565/FP	Construcción de Teatro al Aire Libre en Parque Municipal, 2 Paraderos de Transporte Público y Obras Complementarias
173	FK	567/FR	Sustitución de Pavimento con Adoquín, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Calle Manuel Doblado
174	FL	568/FS	Sustitución de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Calle Tlaxcala (Primera Etapa)
175	FM	569/FT	Sustitución de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle 16 de Septiembre (Primera Etapa)
176	FN	571/FV	Rehabilitación del C5i por Lluvias Atípicas
177	FN	572/FW	Construcción de Cubierta en Patio Interior y Rehabilitación de Oficinas de Impuestos Estatales de la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas
178	FO	573/FX	Construcción de Pavimento con Adocsped y Drenaje Pluvial en Clínica de Bienestar Animal (Primera Etapa)
179	FP	574/FY	Construcción de Portales y Oficinas Gubernamentales (Primera Etapa)
180	FQ	575/FZ	Construcción de Fuente Interactiva en Parque de Comunidad

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala – Puebla, Tlaxcala. C.P. 90000

Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

181	FR	576/G0	Construcción y Rehabilitación de Unidad Deportiva (Primera Etapa)
182	FS	577/G1	Rehabilitación de la Secretaría de Turismo (Segunda Etapa)
183	FT	578/G2	Construcción de Techo del Lienzo Charro de Tlaxcala
184	FU	579/G3	Construcción de Parque Fundadores (Primera Etapa)
185	FV	581/G5	Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Gustavo Díaz Ordaz
186	FW	582/G6	Rehabilitación de Plaza Principal
187	FX	584/G8	Iluminación Arquitectónica de la Capilla del Pocito y Calle del Agua Santa

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SI



**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA**

ARQ. EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

c.c.p.-

- ✓ C.P. Julio Cesar Meneses Guerrero. – Director Administrativo de la SI - Para su Conocimiento
- ✓ Expediente
- ✓ ERHT/JCMG/RPA/mbrc

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala – Puebla, Tlaxcala. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA**



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS



REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: 49. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)

PERIODO: DICIEMBRE

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1	FIN	PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED		
1	PROPÓSITO	PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SUS MODIFICACIONES		
1	COMPONENTE	PORCENTAJE DE INDICADORES CON CUMPLIMIENTO ADECUADO CON RESPECTO DEL TOTAL DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS		
1.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO		
1.2	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO		
1.3	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN		

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de firma digital del funcionario competente. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <https://validador.ceropapel.mx/> para lo cual será necesario capturar el UUID asentado al margen izquierdo del documento que desea verificar. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR visible en el registro de consentimiento.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA			
DEPENDENCIA:	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO
PROYECTO:	49 / 1D. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)		DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
OBJETIVO:	527. CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MEDIANTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES, ELEVAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		FRECUENCIA DEL INDICADOR: ANUAL
INDICADOR:	937. PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED		UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
MÉTODO DE CÁLCULO			
RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PBR-SED			


ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
TIPO	ELEMENTO		DESCRIPCIÓN								VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	RDPBRSED		RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PBR-SED								63.50	PORCENTAJE
ADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA		
DEPENDENCIA:	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO
PROYECTO:	49 / 1D. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR		

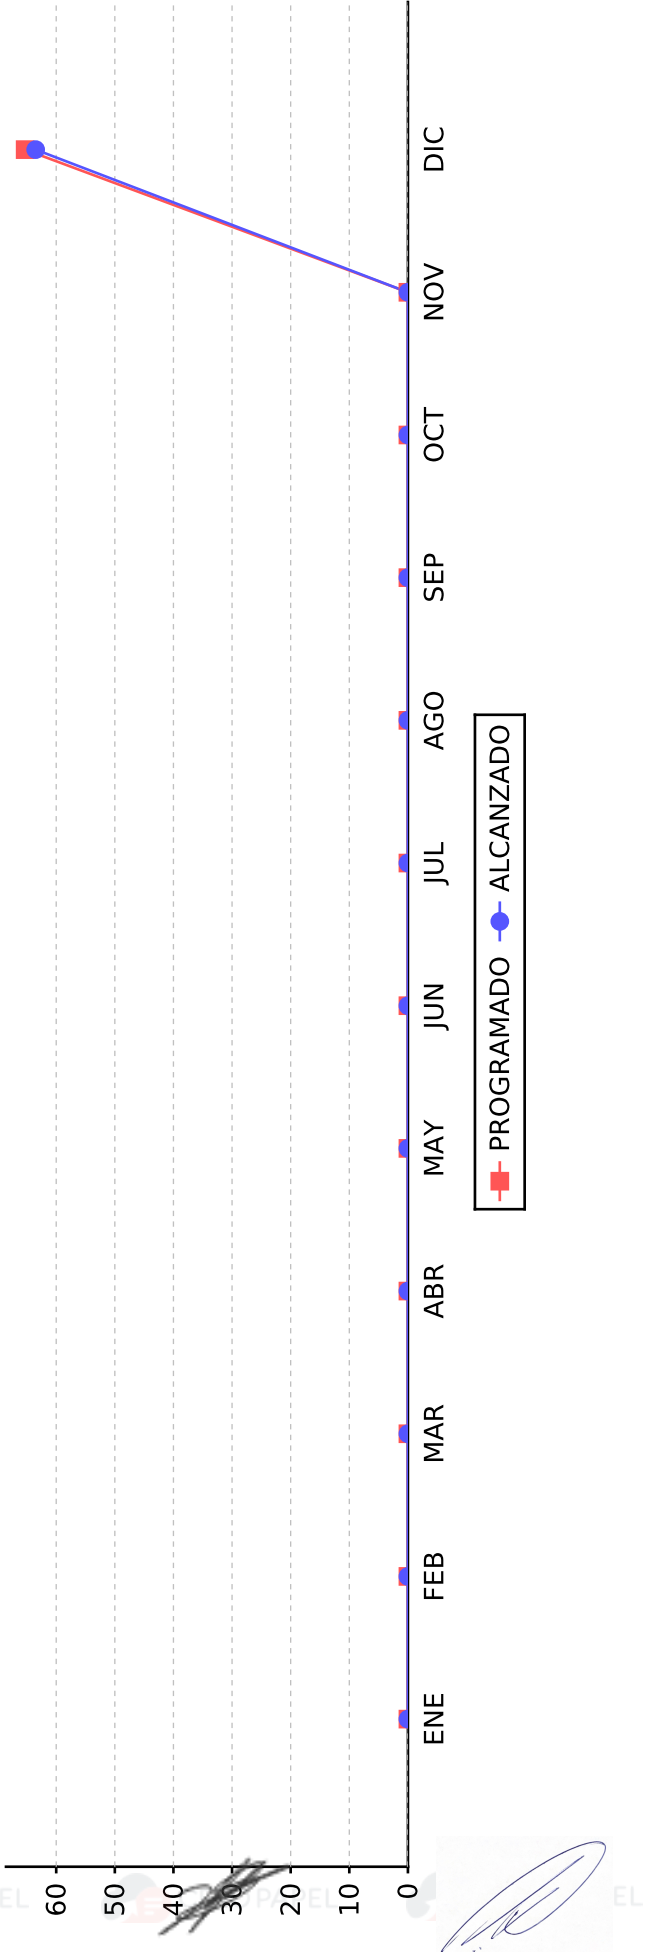

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												
DEPENDENCIA:		13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO				
PROYECTO:		49-CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)						DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA				
OBJETIVOS:		527-CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MEDIANTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES, ELEVAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA						UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE				
INDICADOR:		937-PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED										
MEDIO DE VERIFICACIÓN:		TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/entidades-federativas										
VARIABLE:		RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PBR-SED										
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50
INCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.24

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA			
DEPENDENCIA:	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO
PROYECTO:	49 / 1D. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)		DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA
OBJETIVO:	528. LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS		FRECUENCIA DEL INDICADOR: ANUAL
INDICADOR:	944. PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SUS MODIFICACIONES		UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
MÉTODO DE CÁLCULO			


(PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO/TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO (+O-) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PTE	PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS
CONSTANTE	TPAMP	TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO (+O-) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PESOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

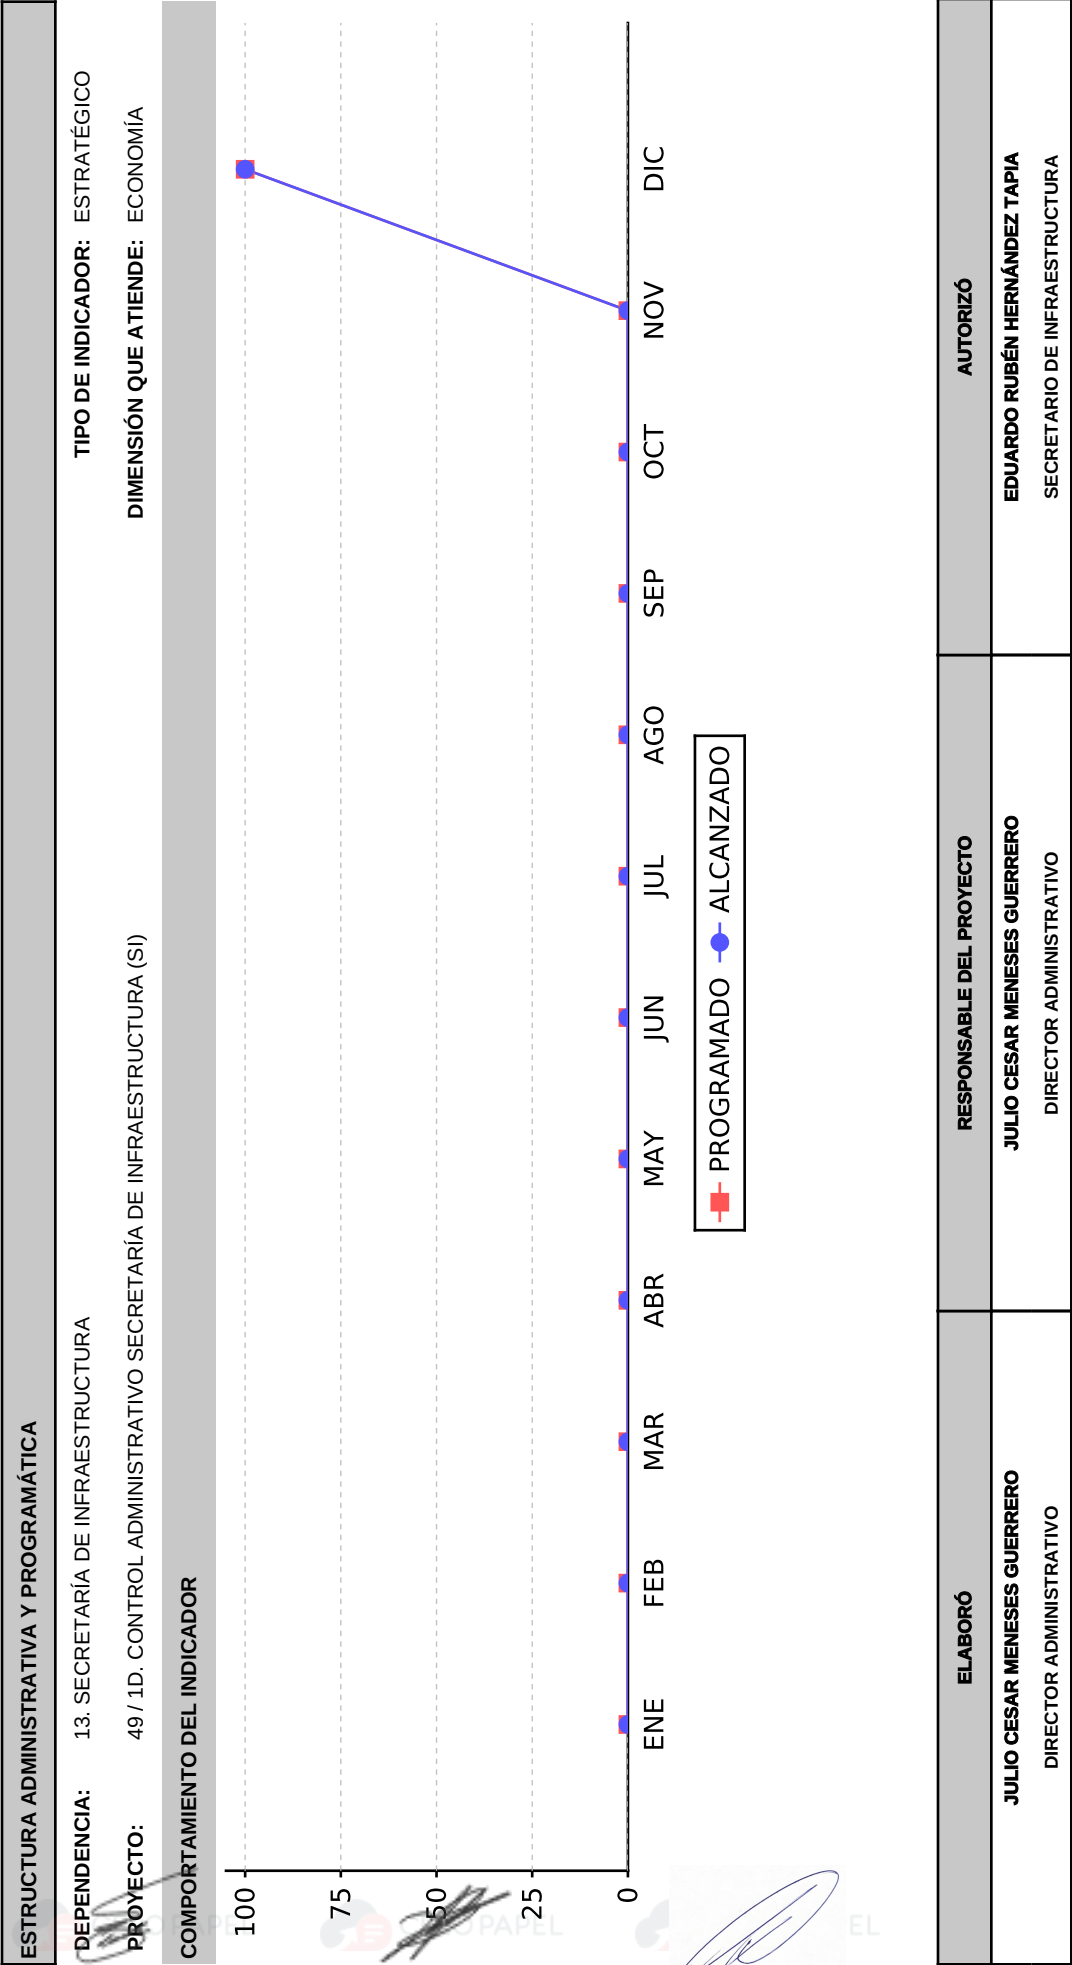



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
DEPENDENCIA:	13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO:	49-CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)
OBJETIVOS:	528-LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
INDICADOR:	944-PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SUS MODIFICACIONES
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	CUENTA PÚBLICA TRANSPARENTADA PÁGINA GOBIERNO CENTRAL https://www.finanzastlax.gob.mx/portalsf/index.php/cuenta-publica-2024
VARIABLE:	PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,357,264.12
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,357,264.12
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR




ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA				
DEPENDENCIA:	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
PROYECTO:	49 / 1D. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)		DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA
OBJETIVO:	529. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EVALUADO		FRECUENCIA DEL INDICADOR:	OTRO PERIODO
INDICADOR:	949. PORCENTAJE DE INDICADORES CON CUMPLIMIENTO ADECUADO CON RESPECTO DEL TOTAL DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS		UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE
MÉTODO DE CÁLCULO				
(NUMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE/NUMERO TOTAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO)*100				

ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NIEGCV	NUMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	25.00	INDICADOR
CONSTANTE	NTIEGPE	NUMERO TOTAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO	25.00	INDICADOR

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

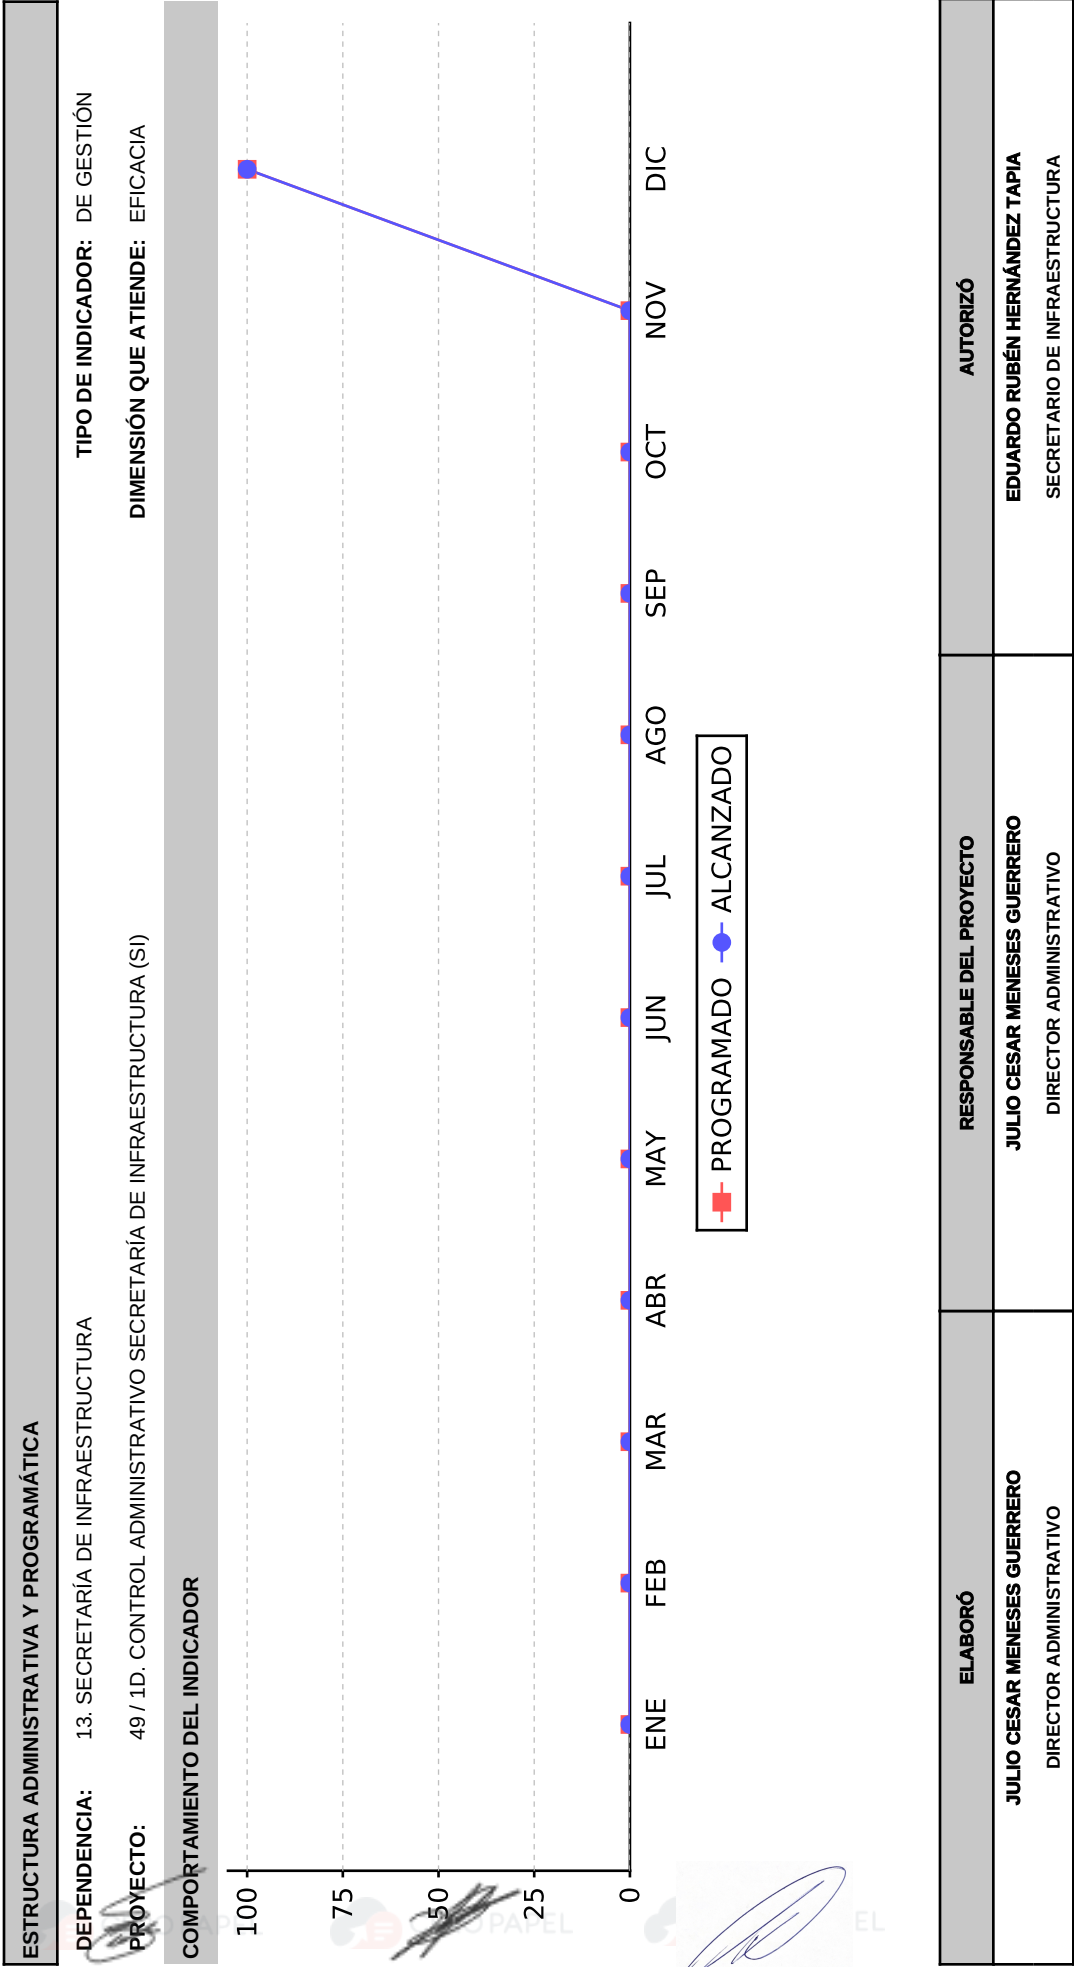



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
DEPENDENCIA:	13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
PROYECTO:	49-CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)										DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
OBJETIVOS:	529-PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EVALUADO										UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
INDICADOR:	949-PORCENTAJE DE INDICADORES CON CUMPLIMIENTO ADECUADO CON RESPECTO DEL TOTAL DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS										
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	SEGUIMIENTO DE INDICADORES https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/seguimiento-de-indicadores										
VARIABLE:	NUMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE										

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



Título / Title

indicadores diciembre 2025 A-1

Cero Papel ID

f5902639-720b-43fd-9c99-8fa259ef4500

Folio

SI-JDDPF-2026-1848

Formato de fecha / Format date

DD / MM / YYYY

Historial de documento / Document history



14 / 01 / 2026

10:21:49 UTC

Creado por / Created by

Ricardo Perez Angelino

perez.angelino.ricardo@hotmail.com

IP: 189.167.19.184



14 / 01 / 2026

10:21:49 UTC

Firmado por / Signed by

Ricardo Perez Angelino

perez.angelino.ricardo@hotmail.com

IP: 189.167.19.184



20 / 01 / 2026

06:55:05 UTC

Leído por / Read by

JULIO CÉSAR MENESES

jmeneses.si@tlaxcala.gob.mx

IP: 189.167.19.184



20 / 01 / 2026

06:55:12 UTC

Firmado por / Signed by

JULIO CÉSAR MENESES

jmeneses.si@tlaxcala.gob.mx

IP: 189.167.19.184



20 / 01 / 2026

11:06:24 UTC

Leído por / Read by

Eduardo Ruben Hernandez Tapia

eduar_ruben@hotmail.com

IP: 189.167.19.184



20 / 01 / 2026

11:06:49 UTC

Firmado por / Signed by

Eduardo Ruben Hernandez Tapia

eduar_ruben@hotmail.com

IP: 189.167.19.184



21 / 01 / 2026

07:52:10 UTC

Leído por / Read by

Vicente Mazorra Herrera

vicente.mazorra@gmail.com

IP: 189.167.19.184



21 / 01 / 2026

07:53:04 UTC

Firmado por / Signed by

Vicente Mazorra Herrera

vicente.mazorra@gmail.com

IP: 189.167.19.184

Título / Title

indicadores diciembre 2025 A-1

Cero Papel ID

f5902639-720b-43fd-9c99-8fa259ef4500

Folio

SI-JDDPF-2026-1848

Formato de fecha / Format date

DD / MM / YYYY

documentHistory**21 / 01 / 2026**
07:53:04 UTC**Documento completado / Document is completed**



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR




ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA			
DEPENDENCIA:	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
PROYECTO:	49 / 1D. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)	DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA
OBJETIVO:	531. LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	FRECUENCIA DEL INDICADOR:	MENSUAL
INDICADOR:	1014. PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE
MÉTODO DE CÁLCULO			

(NUMEROS DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES/TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN					VALOR	UNIDAD DE MEDIDA				
VARIABLE	NPOM	NUMEROS DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES					202.00	PLAZA				
CONSTANTE	TPAD	TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO					202.00	PLAZA				
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

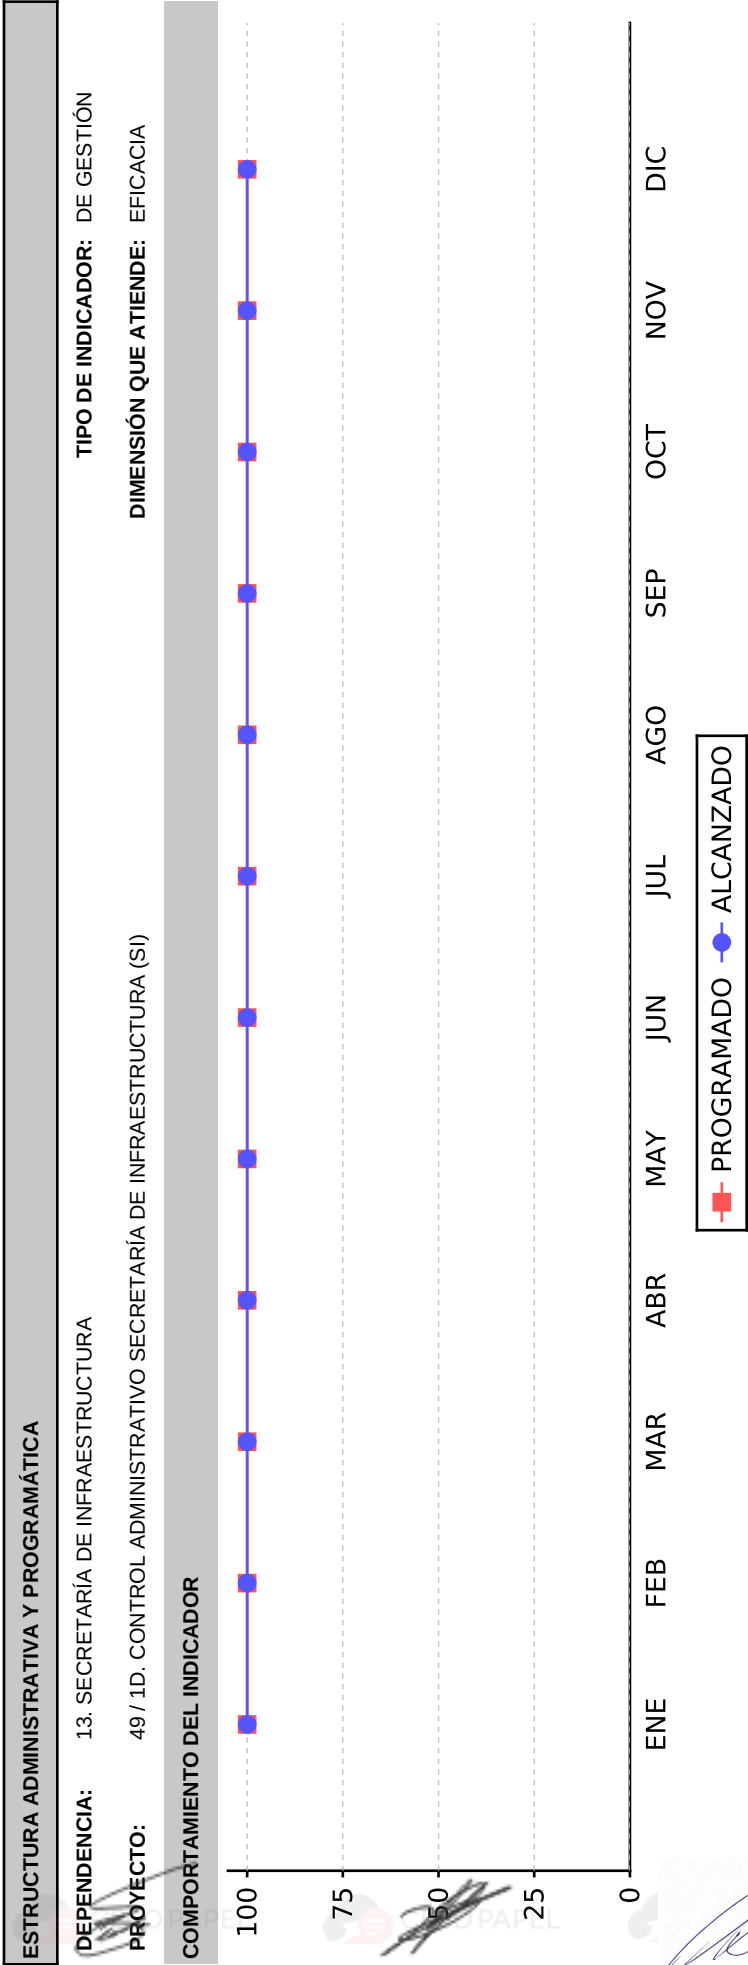

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		
DEPENDENCIA:	13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
PROYECTO:	49-CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
OBJETIVOS:	531-LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
INDICADOR:	1014-PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO	
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, PLANTILLA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA OMG 2025	
VARIABLE:	NUMEROS DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00
ALCANZADO	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00
% DE AVANCE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA			
DEPENDENCIA:	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
PROYECTO:	49 / 1D. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)	DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	ECONOMÍA
OBJETIVO:	532. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	FRECUENCIA DEL INDICADOR:	MENSUAL
INDICADOR:	1039. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE
MÉTODO DE CÁLCULO			

(PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PEM	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS
CONSTANTE	TPAE	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO	PESOS


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ADO	5.47	5.40	7.47	18.76	16.55	6.85	6.54	0.09	9.47	13.32	8.57	1.51
D	5.25	5.18	7.17	18.00	15.88	6.58	6.28	0.09	9.75	12.81	8.25	1.51



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA		
DEPENDENCIA:	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
PROYECTO:	49 / 1D. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR		

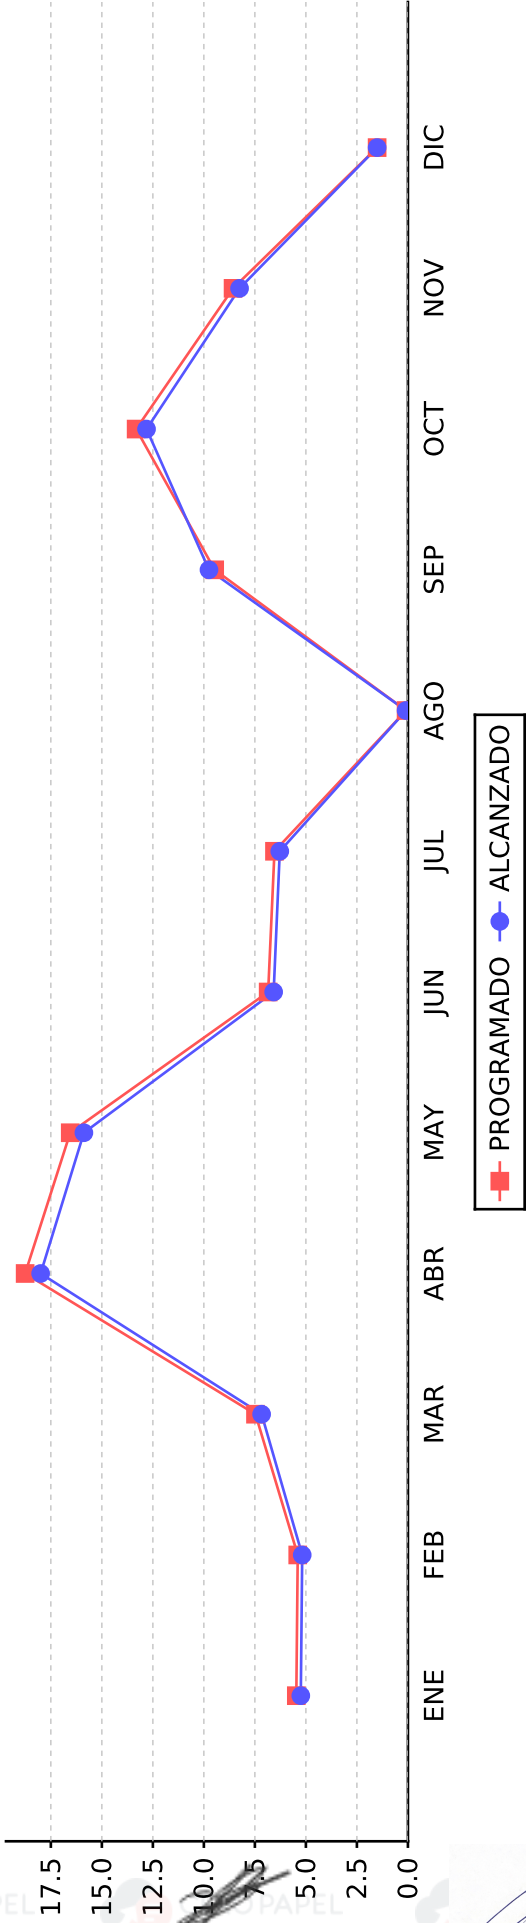

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE VARIABLE



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
DEPENDENCIA:	13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO:	49-CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)
OBJETIVOS:	532-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
INDICADOR:	1039-PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	CUENTA PÚBLICA TRANSPARENTADA PAGINA DEL GOBIERNO CENTRAL https://www.finanzastlax.gob.mx/portalsf/index.php/cuenta-publica-2025
VARIABLE:	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	5,819,934.00	5,742,334.00	7,947,040.00	19,953,214.00	17,599,600.00	7,287,023.00	6,957,660.00	92,121.00	10,071,685.46	14,164,984.00	9,115,481.00	1,606,187.66
ALCANZADO	5,819,934.00	5,742,334.00	7,947,040.00	19,953,214.00	17,599,600.00	7,287,023.00	6,957,660.00	92,121.00	10,071,685.46	14,164,984.00	9,115,481.00	1,606,187.66
% DE AVANCE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA			
DEPENDENCIA:	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN	
PROYECTO:	49 / 1D. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA	
OBJETIVO:	533. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES	FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO	
INDICADOR:	1060. PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE	
MÉTODO DE CÁLCULO			


(REQUISICIONES AURORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES/TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS OMG)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	RARM	REQUISICIONES AURORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN
CONSTANTE	TRSOMG	TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS OMG	REQUISICIÓN

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ADO	0.00	17.14	14.29	14.29	11.43	11.43	8.57	8.57	7.14	4.29	1.43	1.42
	0.00	17.14	14.29	14.29	11.43	11.43	8.57	8.57	7.14	4.29	1.43	1.43



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

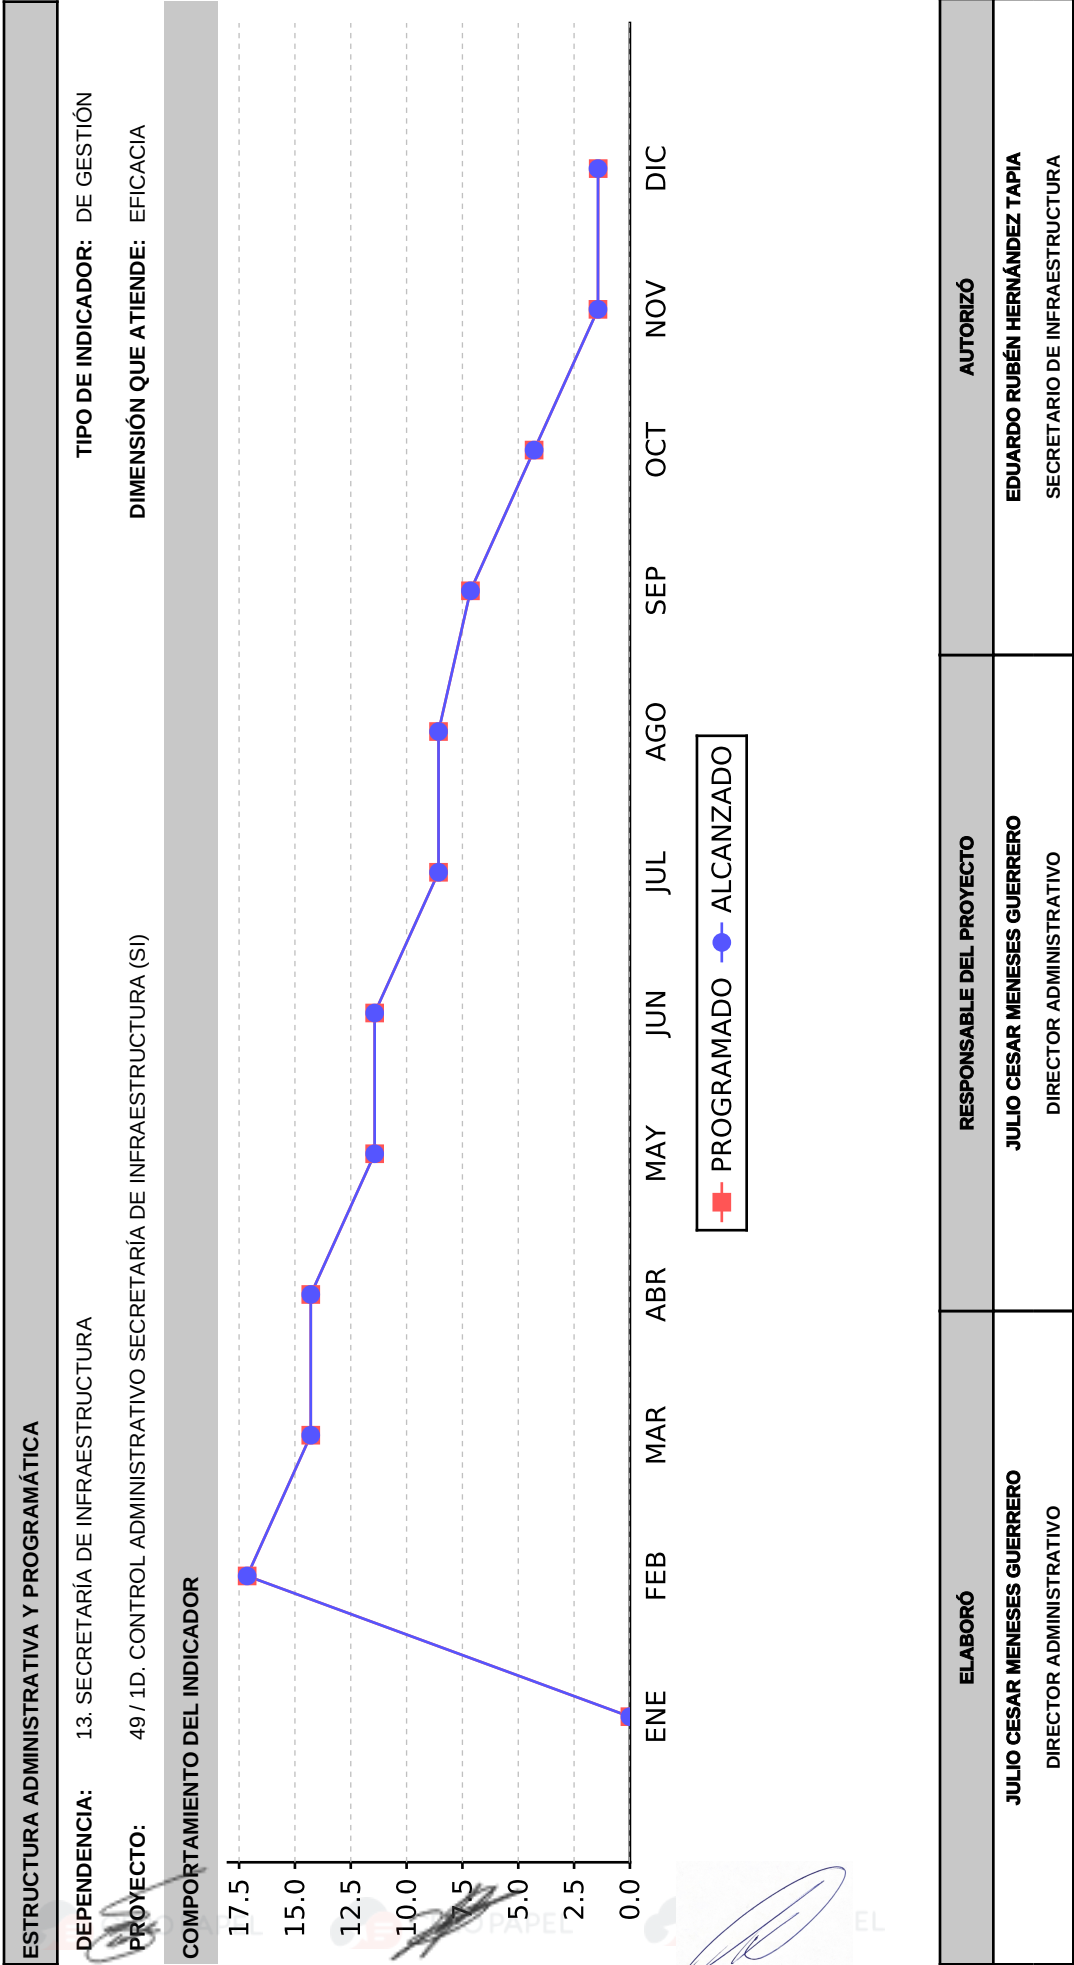



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												
DEPENDENCIA:		13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										
PROYECTO:		49-CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)										
OBJETIVOS:		533-GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES										
INDICADOR:		1060-PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN										
MEDIO DE VERIFICACIÓN:		REGISTROS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES INTEGRADOS CON SU SOLICITUD DE PAGO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA										
VARIABLE:		REQUISICIONES AURORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES										
	ENE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PROGRAMADO	0.00	12.00	10.00	8.00	8.00	6.00	6.00	5.00	3.00	1.00	1.00	
ALCANZADO	0.00	12.00	10.00	8.00	8.00	6.00	6.00	5.00	3.00	1.00	1.00	
% DE AVANCE	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
ELABORÓ		RESPONSABLE DEL PROYECTO					AUTORIZÓ					
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO		JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO					EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA					

Título / Title

indicadores diciembre 2025 A-2

Cero Papel ID

08289127-8066-4e71-8a86-5e1f3360d501

Folio

SI-JDDPF-2026-1849

Formato de fecha / Format date

DD / MM / YYYY

Historial de documento / Document history

**14 / 01 / 2026**

10:23:04 UTC

Creado por / Created by

Ricardo Perez Angelino

perez.angelino.ricardo@hotmail.com

IP: 189.167.19.184

**14 / 01 / 2026**

10:23:04 UTC

Firmado por / Signed by

Ricardo Perez Angelino

perez.angelino.ricardo@hotmail.com

IP: 189.167.19.184

**20 / 01 / 2026**

06:54:41 UTC

Leído por / Read by

JULIO CÉSAR MENESES

jmeneses.si@tlaxcala.gob.mx

IP: 189.167.19.184

**20 / 01 / 2026**

06:54:48 UTC

Firmado por / Signed by

JULIO CÉSAR MENESES

jmeneses.si@tlaxcala.gob.mx

IP: 189.167.19.184

**20 / 01 / 2026**

11:05:36 UTC

Leído por / Read by

Eduardo Ruben Hernandez Tapia

eduar_ruben@hotmail.com

IP: 189.167.19.184

**20 / 01 / 2026**

11:06:10 UTC

Firmado por / Signed by

Eduardo Ruben Hernandez Tapia

eduar_ruben@hotmail.com

IP: 189.167.19.184

**21 / 01 / 2026**

07:49:02 UTC

Leído por / Read by

Vicente Mazorra Herrera

vicente.mazorra@gmail.com

IP: 189.167.19.184

**21 / 01 / 2026**

07:49:10 UTC

Firmado por / Signed by

Vicente Mazorra Herrera

vicente.mazorra@gmail.com

IP: 189.167.19.184



Título / Title

indicadores diciembre 2025 A-2

Cero Papel ID

08289127-8066-4e71-8a86-5e1f3360d501

Folio

SI-JDDPF-2026-1849

Formato de fecha / Format date

DD / MM / YYYY

documentHistory



21 / 01 / 2026
07:49:10 UTC

Documento completado / Document is completed

