




TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



Tlaxcala, Tlax., a 16 de octubre de 2025

DESPACHO-SI-691/2025

ASUNTO: ENVÍO DE INDICADORES.



4 NOV 2025


RECIBIDO
10:12

DR. NOÉ RODRIGUEZ ROLDÁN
COORDINADOR GENERAL DE
PLANEACIÓN E INVERSIÓN
PRESENTE

En relación a los programas de obra pública que ejecuta esta Secretaría, para el presente Ejercicio Fiscal, y con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar a usted en forma digital firmado a través de la Plataforma de Cero Papel, el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable de los indicadores, generados por el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), correspondientes al mes de septiembre de 2025, conforme al siguiente listado:

No. de Oficio: 691	No. de Obra Específica	Nombre de la Obra
1 A	49/1D	Control Administrativo Secretaría de Infraestructura (SI)
2 B	329/95	Rehabilitación de Carretera La Soledad - Las Cuevas
3 C	331/97	Rehabilitación de Carretera Espíritu Santo-Alpotzonga
4 D	332/98	Rehabilitación de Carretera Perimetral Malintzi San Isidro Buen Suceso-Altamira Guadalupe (Primera Etapa)
5 E	333/99	Rehabilitación de Carretera Muñoz-La Trasquila
6 F	334/9A	Reconstrucción de Carretera Acceso a Tzompantepec (Primera Etapa)
7 G	338/9E	Reingeniería de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tlatempan (Segunda Etapa) y Construcción de Ecoparque y Zonas Recreativas Medioambientales
8 H	341/9H	Construcción de Puente Vehicular Almoloya, en Sección Tercera
9 I	348/9O	Rehabilitación del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud "ITAES" (Primera Etapa)
10 J	360/A0	Construcción del Laboratorio de la Secretaría de la Función Pública (Primera Etapa)
11 K	361/A1	Construcción de Barda Perimetral en el Zoológico del Altiplano
12 L	362/A2	Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de Salas de Oralidad Civiles y Familiares

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfono: 246 465 2960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

13	M	363/A3	Construcción de la Ciudad Administrativa de Tlaxcala (CIAT) (Tercera Etapa)
14	N	364/A4	Construcción del CRIT (Cuarta Etapa)
15	Ñ	366/A6	Rehabilitación de Carretera de Conexión Periferico-Carretera La Soledad
16	O	367/A7	Reconstrucción de Carretera Tlacomulco-Santa Cruz Tetela (Primera Etapa)
17	P	368/A8	Construcción de Infraestructura en Camino de Acceso al Banco de Alimentos
18	Q	369/A9	Construcción de la Ciudad de la Cultura y del Entretenimiento (Segunda Etapa)
19	R	372/AC	Construcción de Infraestructura en Calle Sin Nombre
20	S	373/AD	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Adoquín en Calle 6 de agosto, en Colonia 1901
21	T	375/AF	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples
22	U	376/AG	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Adoquín y Alcantarillado Sanitario en Calle Jacarandas
23	V-1	377/AH	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
24	V-2	377/AH	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
25	W	378/AI	Sustitución de Pavimento con Adoquín, Alcantarillado Sanitario y Alumbrado Público en Calle de Los Misterios (Primera Etapa)
26	X	382/AM	Construcción de Casa del Abuelo, en Chipilo
27	Y	383/AN	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Adoquín en Calle Lázaro Cárdenas
28	Z	384/AO	Adecuación de Inmueble para Cancha de Fútbol Rápido
29	AA	388/AS	Construcción de Pavimento con Adoquín en Calle Miguel Hidalgo (Primera Etapa)
30	AB	389/AT	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Adoquín y Agua Potable en Calle 16 de Septiembre (Tercera Etapa)
31	AC	390/AU	Construcción de Pavimento con Adoquín en Calle Domingo Arenas (Primera Etapa)
32	AD	391/AV	Construcción de Gimnasio Multideportivo en Unidad Deportiva "Tlahuicole" (Primera Etapa)
33	AE	392/AW	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Adoquín, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Calle Revolución (Primera Etapa), en Sección Tercera
34	AF	393/AX	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Repavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle Cañada Morelos (Primera Etapa), en Barrio Xaltipa
35	AG	394/AY	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Adoquín y Alumbrado Público en Calle Xicohténcatl
36	AH	395/AZ	Sustitución de Pavimento con Adoquín, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Calle Primero de Mayo

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfono: 246 465 2960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

37	AI	396/BO	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Concreto Hidráulico, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Calle Sin Nombre
38	AJ	397/B1	Ampliación y Rehabilitación de Presidencia Municipal (Primera Etapa)
39	AK	398/B2	Sustitución de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle Galeana (Primera Etapa)
40	AL	401/B5	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Adoquín y Alumbrado Público en Prolongación Los Linderos
41	AM	402/B6	Rehabilitación de Plaza de la Constitución, Plaza Xicohténcatl y Portales
42	AN	403/B7	Iluminación Arquitectónica de la Basílica de Ocotlán
43	AÑ	404/B8	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Adoquín y Agua Potable en Calle Lucio Cabañas, en N.C.P. Álvaro Obregón
44	AO	405/B9	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Adoquín y Alcantarillado Sanitario en Calle Fresnos (Primera Etapa)
45	AP	406/BA	Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Próspero Cahuantzi"
46	AQ	408/BC	Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)
47	AR	409/BD	Construcción de Barda Perimetral y Rehabilitación de Almacén en Inmueble del Gobierno del Estado
48	AS	410/BE	Sustitución de Pavimento con Adoquín en Calle Progreso (Primera Etapa)
49	AT	411/BF	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Adoquín, Agua Potable y Alumbrado Público en Calle División del Norte, en Colonia Venustiano Carranza
50	AU	412/BG	Construcción de guarniciones y pavimento con adoquín en calle 21 de Marzo (Primera Etapa)
51	AV	413/BH	Construcción de guarniciones, banquetas, pavimento con adoquín, agua potable y alcantarillado sanitario en calle Francisco I. Madero
52	AW	414/BI	Construcción de pavimento con adoquín en calle 2 de Noviembre
53	AX	415/BJ	Construcción de gradas, sanitarios y empastado de cancha de fútbol
54	AY	416/BK	Rehabilitación y construcción de espacios en Unidad Deportiva (Primera Etapa), en Sección Cuarta
55	AZ	417/BL	Sustitución de guarniciones y banquetas en calle República de Argentina (Primera Etapa), en Sección Primera Actipac y Sección Segunda Teotlalpan
56	BA	420/BO	Ampliación de Presidencia Municipal (Primera Etapa)
57	BB	421/BP	Sustitución de Pavimento con Adoquín en Calle Francisco I. Madero
28	BC	422/BQ	Construcción de Pavimento con Adoquín en Prolongación Reforma
59	BD	425/BT	Sustitución de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Concreto Hidráulico en Avenida 5 de Mayo y Calle Ciudadano Cuéllar Abaroa
60	BE	426/BU	Construcción de Guarniciones, Pavimento con Adoquín y Alumbrado Público en Calle Iturbide (Primera Etapa), en Barrio de San José



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

61	BF	427/BV	Construcción de la Central de Abastos y Rehabilitación de Mercado (Segunda Etapa)
62	BG	428/BW	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Adoquín en Calle Álamos (Primera Etapa)
63	BH	429/BX	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Calle Santa Cruz (Segunda Etapa)
64	BI	430/BY	Rehabilitación de Panteón Municipal
65	BJ	431/BZ	Sustitución y Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle y Cerrada Blanca Estela Pavón
66	BK	433/C1	Supervisión Técnica - Localidades Rurales
67	BL	434/C2	Proyectos Ejecutivos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
68	BM	435/C3	Proyectos Ejecutivos del Sistema de Agua Potable y Captación y Conducción de Aguas Residuales a Colectores y Emisores a PTAR Apizaco "A" y PTAR Tlatempan
69	BN	436/C4	Proyecto Ejecutivo para la Captación y Conducción de Aguas Residuales a Colector y Emisor de la Margen Derecha del Río Zahuapan a PTAR Tlaxcala
70	BÑ	437/C5	Equipamiento de Pozo para Agua Potable, Electrificación, Tren de Descarga, Línea de Conducción, Red de Distribución, Caseta y Cercado
71	BO	438/C6	Equipamiento de Pozo para Agua Potable, Electrificación, Tren de Descarga, Línea de Conducción, Red de Distribución, Caseta, Cercado y Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento
72	BP	439/C7	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Calle Jardín de las Bugambilias, en Barrio de Dolores Aquihuac
73	BQ	440/C8	Sustitución de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle 3 Norte
74	BR	441/C9	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Concreto Hidráulico y Empedrado en Calle Emiliano Zapata
75	BS	442/CA	Sustitución de Banquetas y Pavimento con Adoquín en Acceso a Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente
76	BT	443/CB	Mejoramiento de Imagen Urbana en Autopista Tlaxcala- Texmelucan, Tramo 23 Zona Militar-El Trébol
77	BU	446/CE	Sustitución de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Concreto Hidráulico y Agua Potable en Avenida Revolución (Primera Etapa)
78	BV	448/CG	Sustitución de Guarniciones y Banquetas y Repavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle Emiliano Zapata, en Sección Séptima
79	BW	449/CH	Rehabilitación de Unidad Deportiva (Primera Etapa)
80	BX	450/CI	Construcción de Barda Perimetral y Suministro y Colocación de Un Juego Infantil y Bancas en Unidad Deportiva
81	BY	451/CJ	Construcción de Panteón Municipal (Primera Etapa)
82	BZ	452/CK	Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Alumbrado en Unidad Deportiva
83	CA	453/CL	Construcción de Pavimento con Adoquín en Calle Emilio Sanchez Piedras (Segunda Etapa), en Barrio Xolalpan



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

84	CB	456/CO	Sustitución de Pavimento con Adoquín, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Calle Gavillero
85	CC	457/CP	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Adoquín y Alumbrado Público en Calle San Miguel Cuentla, en Sección Primera
86	CD	458/CQ	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Avenida Adolfo Ruiz Cortínez (Segunda Etapa)
87	CE	459/CR	Rehabilitación del Área de Recepción y Despacho de la Secretaría de Gobierno, Salón Verde, Salón Juárez y Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas
88	CF	460/CS	Equipamiento de Pozo para Agua Potable, Electrificación, Tren de Descarga, Línea de Conducción, Red de Distribución, Caseta, Cercado y Tanque de Almacenamiento
89	CG	461/CT	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Ampliación de Alcantarillado Sanitario
90	CH	466/CY	Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo de Alto Rendimiento Tlaxcala (CEDDART) (Tercera Etapa)
91	CI	467/CZ	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Adoquín en Calle 20 de Noviembre (Segunda Etapa)
92	CJ	468/D0	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Adoquín en Calle y Prolongación 10 de Mayo (Primera Etapa), en Barrio Estocapa
93	CK	469/D1	Construcción de Panteón Municipal (Primera Etapa)
94	CL	470/D2	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Calle 29 de Agosto
95	CM	471/D3	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento con Adoquín en Calle Sin Nombre (Primera Etapa)
96	CN	474/D6	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Calle Primera 5 de Mayo (Primera Etapa), en Barrio México
97	CÑ	475/D7	Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) (Primera Etapa)
98	CO	476/D8	Sustitución de Pavimento con Adoquín en Entronque de Calles Abasolo y Niños Héroes, en Barrio Guadalupe
99	CP	477/D9	Sustitución de Pavimento con Adoquín en Calle Venustiano Carranza (Primera Etapa)
100	CQ	478/DA	Rehabilitación y Ampliación de Pavimento Asfáltico y Construcción de Guarniciones en Calle Hidalgo
101	CR	479/DB	Alumbrado Público en Calles Independencia, Escolar y 4 Sur (Primera Etapa)
102	CS	480/DC	Rehabilitación de UBR
103	CT	481/DD	Repavimentación y Ampliación de Pavimento Asfáltico en Calle La Luz (Primera Etapa), en Sección Doceava
104	CU	482/DE	Construcción de Guarniciones y Pavimento con Adoquín en Calle Quimixtla (Primera Etapa)
105	CV	483/DF	Construcción de Guarniciones y Alumbrado Público en Avenida Fundadores Hermanos Vázquez

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfono: 246 465 2960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

106	CW	484/DG	Construcción de Pavimento con Adoquín en Calle Centenario (Primera Etapa), en Sección Tercera
107	CX	485/DH	Construcción de Cancha de Fútbol 7 en Unidad Deportiva
108	CY	486/DI	Construcción de Barda Perimetral en Unidad Deportiva "José Brindis"
109	CZ	487/DJ	Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimento con Adoquín y Alumbrado Público en Calles Tapia y Francisco I. Madero (Segunda Etapa)
110	DA	488/DK	Construcción de Museo Arqueológico de Tepeticpac
111	DB	489/DL	Sustitución de Alcantarillado Sanitario en Calles Colima, Francisco I. Madero y Aquiles Serdán

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SI



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ARQ. EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

c.c.p.-

- ✓ C.P. Julio Cesar Meneses Guerrero. – Director Administrativo – Para su Conocimiento
- ✓ Expediente
- ✓ ERHT/JCMG/RPA/mbrc

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfono: 246 465 2960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: 377. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PERIODO: SEPTIEMBRE

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE SUPERVISION DE OBRAS ADMINISTRADAS		
1.2	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS		
1.3	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS		
2.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO		
2.2	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE		


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA			
DEPENDENCIA:	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN	
PROYECTO:	377 / AH. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA	
OBJETIVO:	4418. SUPERVISIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO	
INDICADOR:	4691. PORCENTAJE DE SUPERVISION DE OBRAS ADMINISTRADAS	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE	
MÉTODO DE CÁLCULO			

(OBRAS SUPERVISADAS PROAGUA/TOTAL DE OBRAS ASIGNADAS PROAGUA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR											
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN					VALOR	UNIDAD DE MEDIDA			
VARIABLE	OSPROAGUA	OBRAS SUPERVISADAS PROAGUA					0.57	OBRA			
CONSTANTE	TOAPROAGUA	TOTAL DE OBRAS ASIGNADAS PROAGUA					4.00	OBRA			

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00

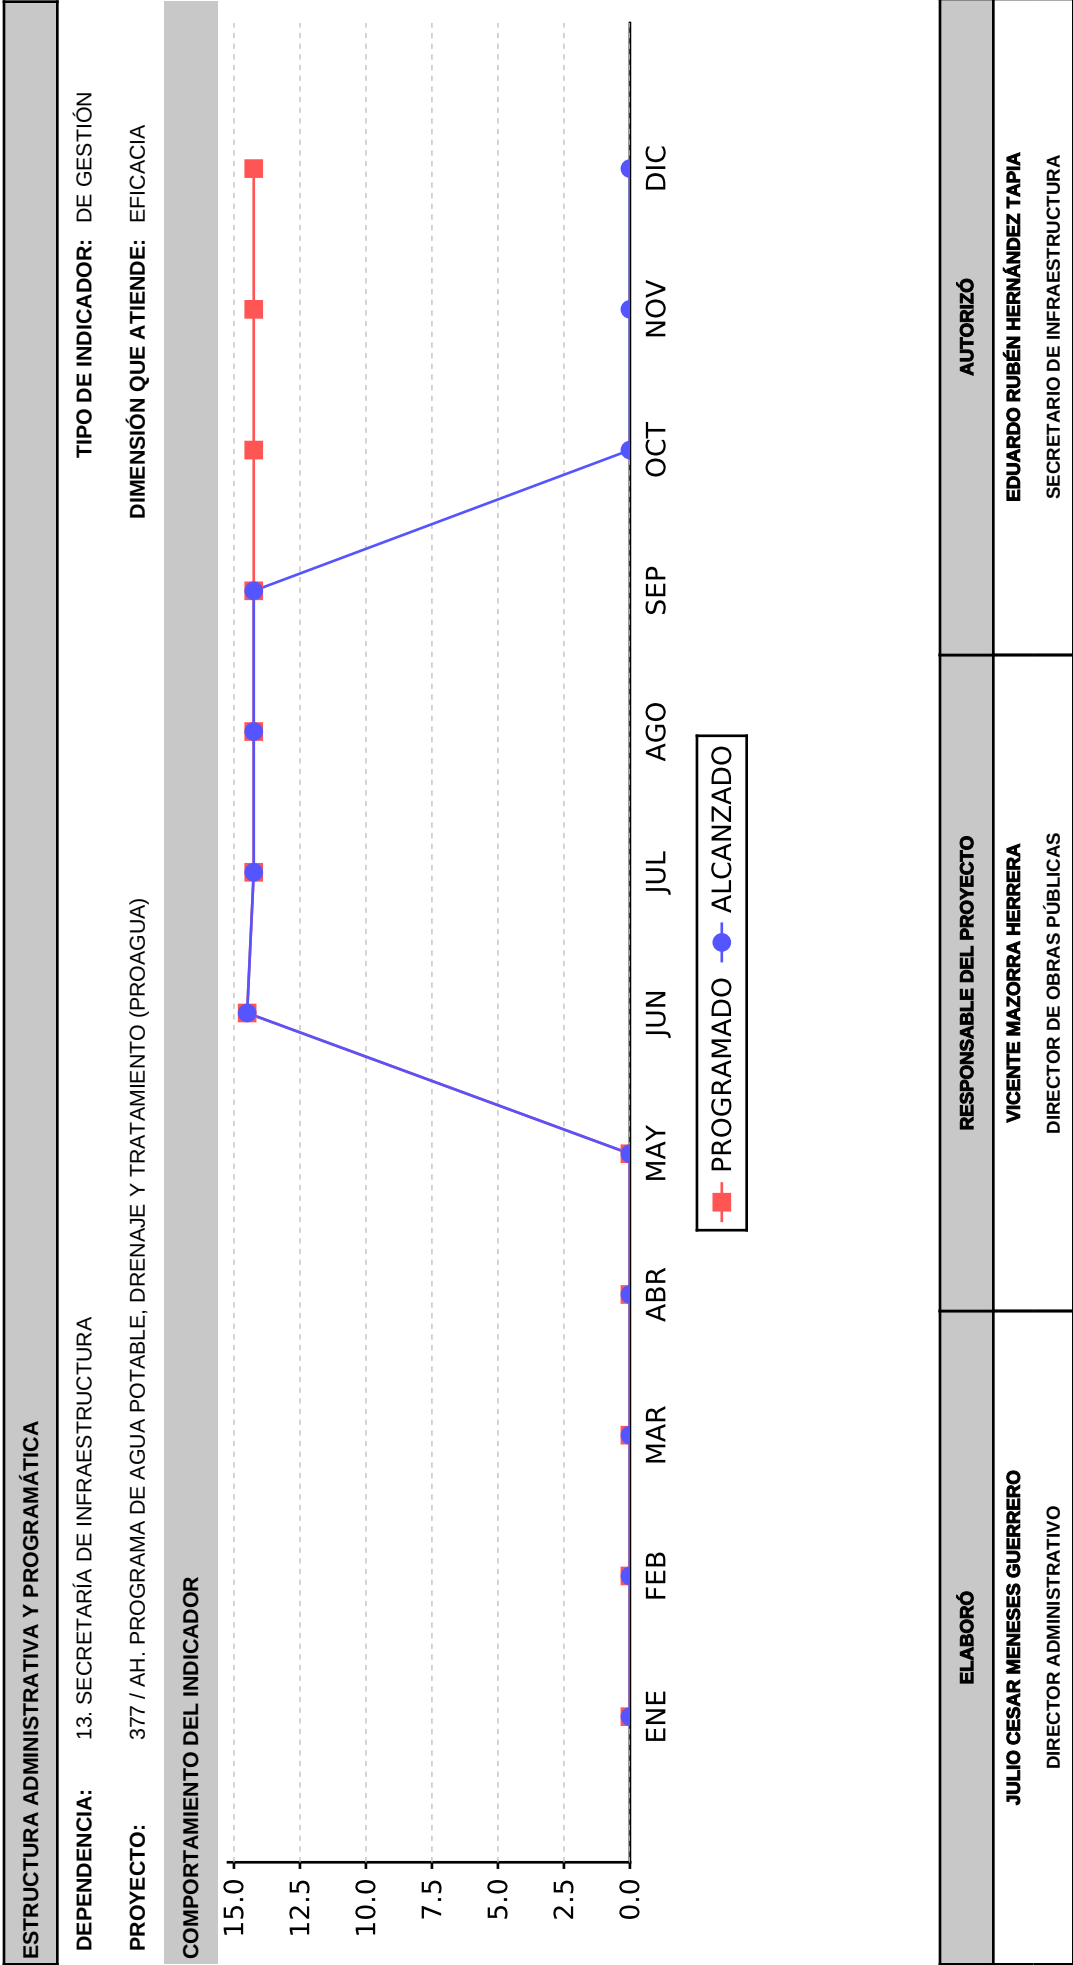

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												
DEPENDENCIA:	13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN	
PROYECTO:	377-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)										DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA	
OBJETIVOS:	4418-SUPERVISIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE; DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)										UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE	
INDICADOR:	4691-PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ADMINISTRADAS											
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	CONTRATO DIRECCIÓN DE PROYECTOS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA											
VARIABLE:	OBRAS SUPERVISADAS PROAGUA											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VICENTE MAZORRA HERRERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA			
DEPENDENCIA:	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN	
PROYECTO:	377 / AH. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA	
OBJETIVO:	4419. EJECUCIÓN DE CONTRATO DE Y/O EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO	
INDICADOR:	4692. PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE	
MÉTODO DE CÁLCULO			

(CONTRATOS EJECUTADOS PROAGUA/TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS PROAGUA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN					VALOR	UNIDAD DE MEDIDA				
VARIABLE	CEPROAGUA	CONTRATOS EJECUTADOS PROAGUA					0.57	CONTRATO				
CONSTANTE	TCAPROAGUA	TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS PROAGUA					4.00	CONTRATO				

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00

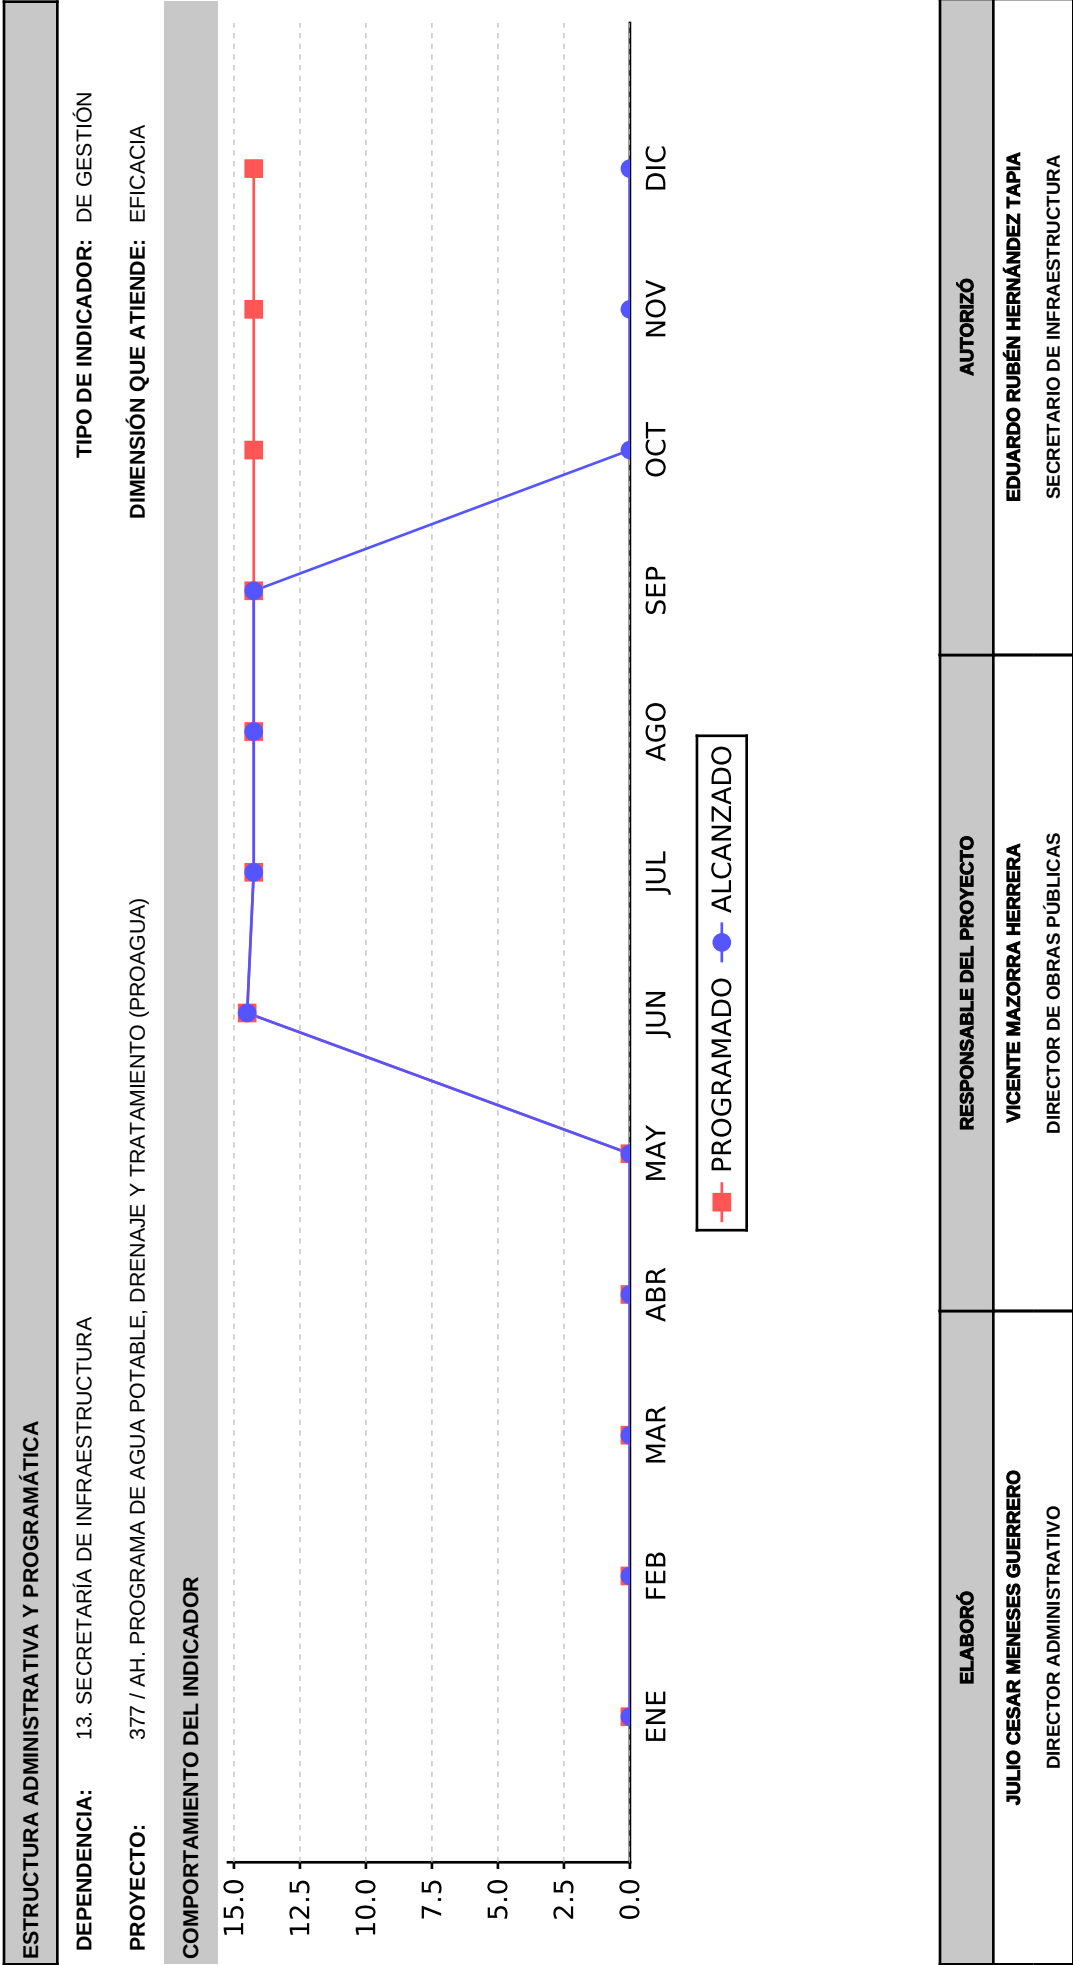


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												
DEPENDENCIA:	13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN	
PROYECTO:	377-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)										DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA	
OBJETIVOS:	4419-EJECUCIÓN DE CONTRATO DE Y/O EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)										UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE	
INDICADOR:	4692-PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS											
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	CONTRATO DIRECCIÓN DE PROYECTOS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA											
VARIABLE:	CONTRATOS EJECUTADOS PROAGUA											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VICENTE MAZORRA HERRERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA												
DEPENDENCIA:		13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN					
PROYECTO:		377 / AH. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)					DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA					
OBJETIVO:		4420. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)					FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO					
INDICADOR:		4693. PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS					UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE					
MÉTODO DE CÁLCULO												
(EXPEDIENTES ELABORADOS PROAGUA		/TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS PROAGUA)*100										
ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN					VALOR	UNIDAD DE MEDIDA				
VARIABLE	EEPROAGUA	EXPEDIENTES ELABORADOS PROAGUA					0.57	EXPEDIENTE				
CONSTANTE	TEAPROAGUA	TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS PROAGUA					4.00	EXPEDIENTE				
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00

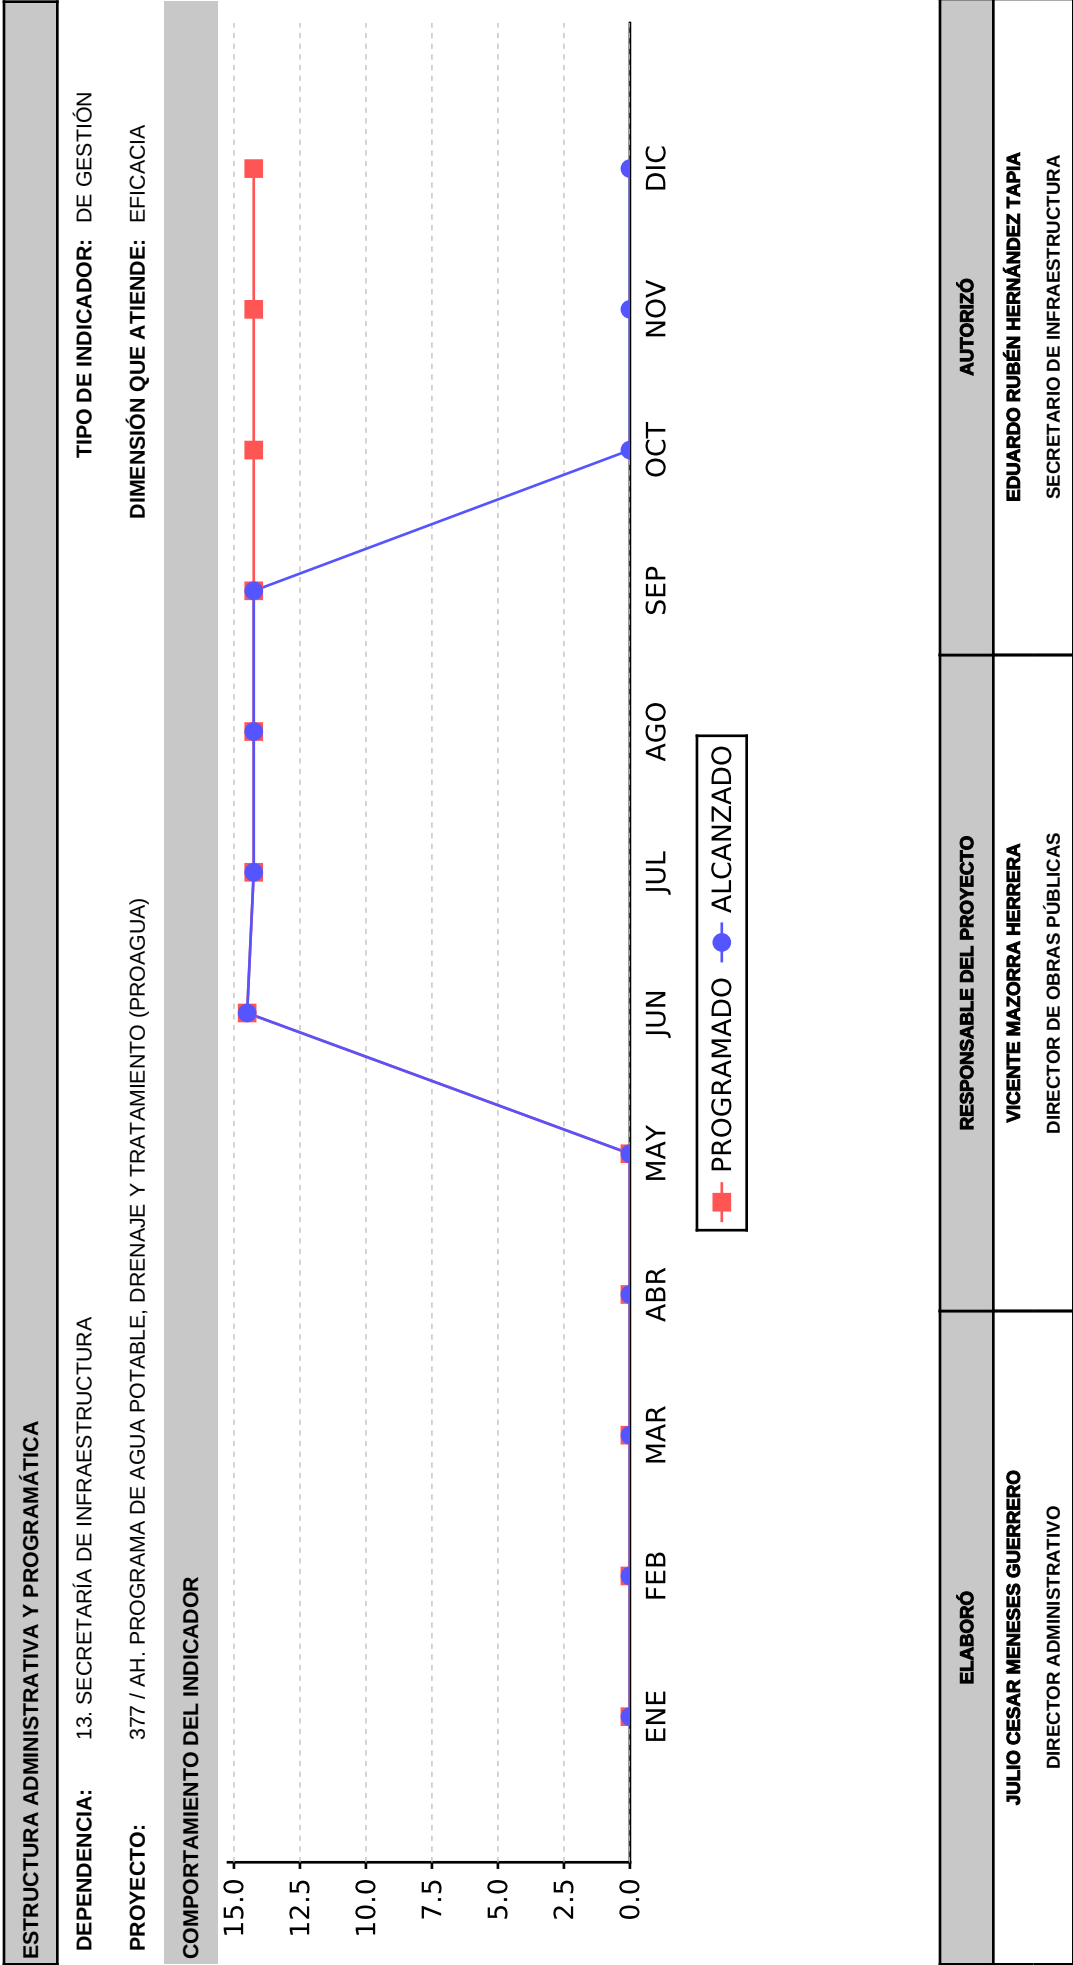

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												
DEPENDENCIA:	13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN	
PROYECTO:	377-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)										DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA	
OBJETIVOS:	4420-ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)										UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE	
INDICADOR:	4693-PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS											
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	CONTRATO DIRECCIÓN DE PROYECTOS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA											
VARIABLE:	EXPEDIENTES ELABORADOS PROAGUA											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00


ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VICENTE MAZORRA HERRERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA			
DEPENDENCIA:	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN	
PROYECTO:	377 / AH. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA	
OBJETIVO:	4421. EJECUCIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO	
INDICADOR:	4694. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE	
MÉTODO DE CÁLCULO			

ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	SPP	SERVICIOS PROGRAMADOS PROAGUA	0.43	SERVICIO
CONSTANTE	TSAP	TOTAL DE SERVICIOS ASIGNADOS PROAGUA	3.00	SERVICIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.02
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00

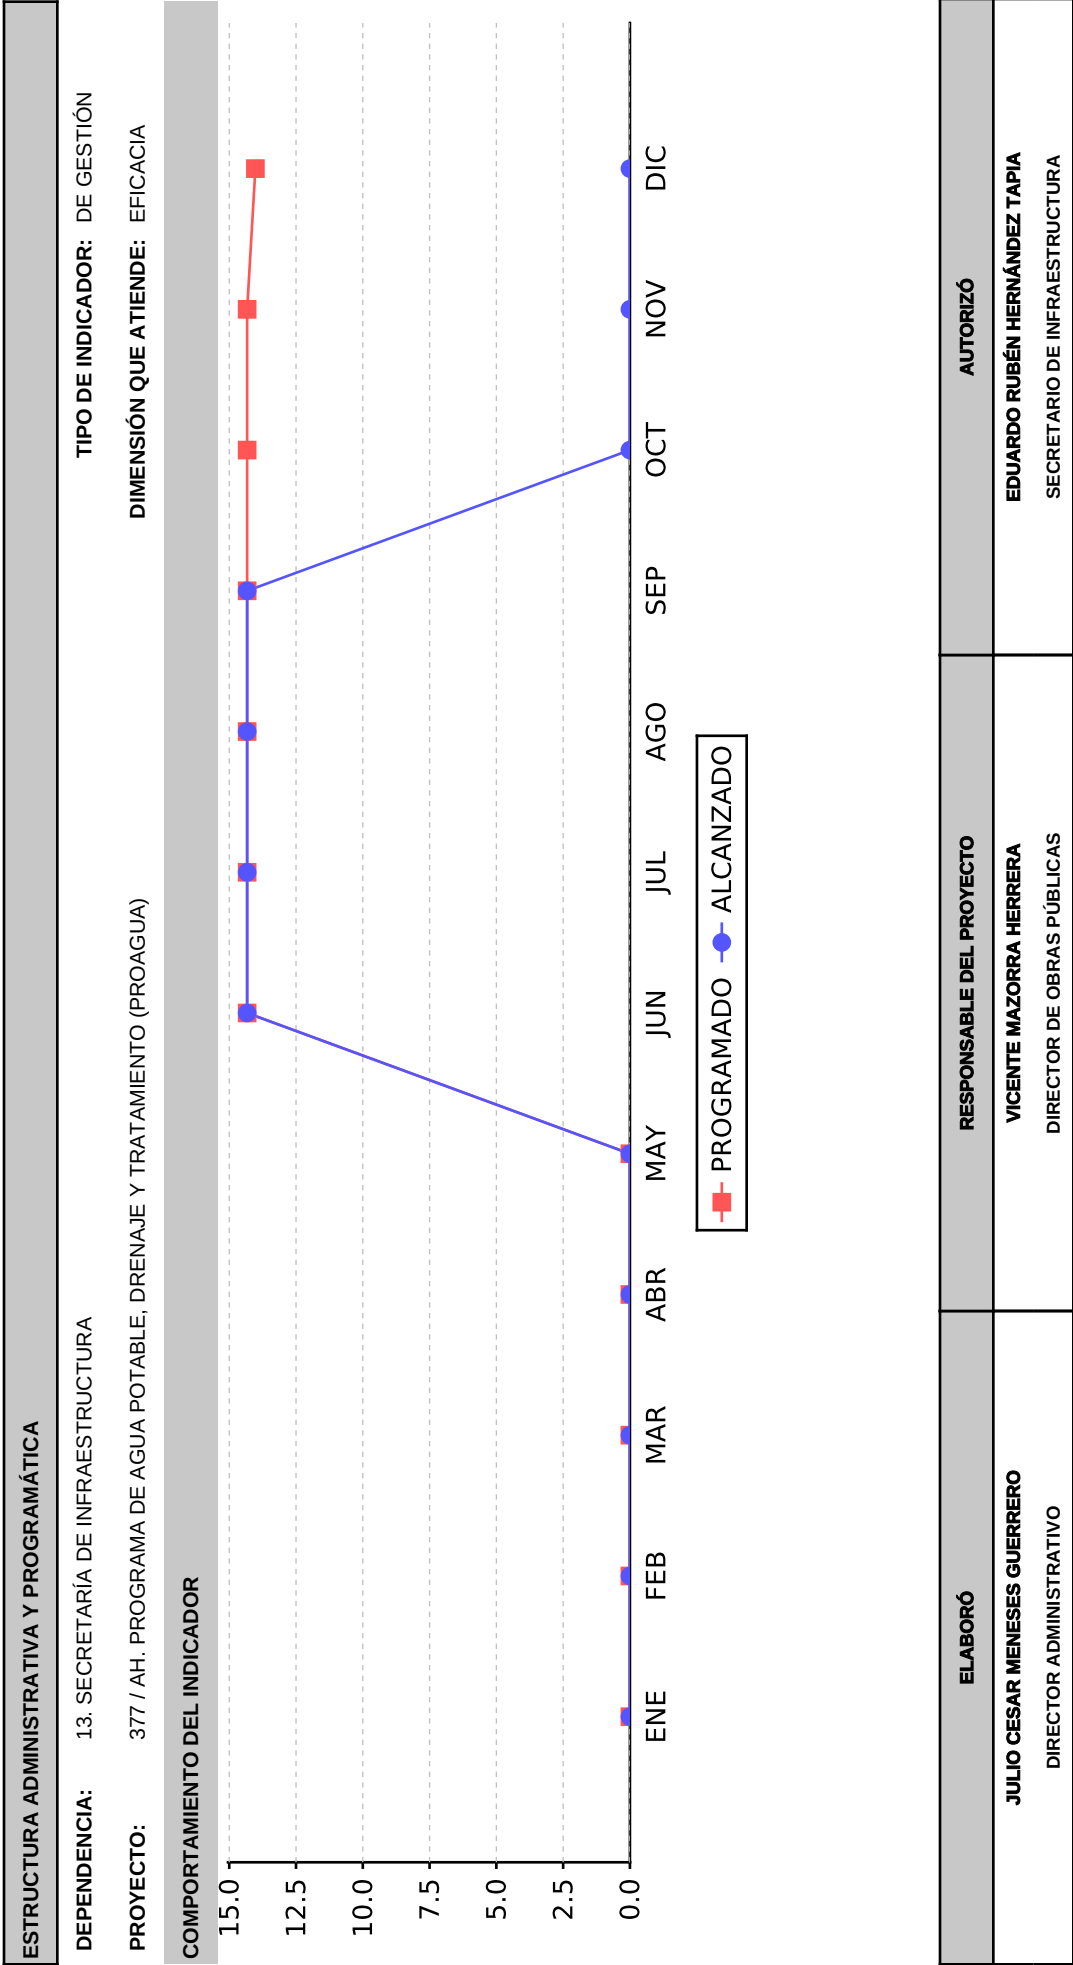

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												
DEPENDENCIA:	13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN	
PROYECTO:	377-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)										DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA	
OBJETIVOS:	4421-EJECUCIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)										UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE	
INDICADOR:	4694-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO											
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	CONTRATO/EXPEDIENTE DIRECCIÓN DE PROYECTOS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA											
VARIABLE:	SERVICIOS PROGRAMADOS PROAGUA											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VICENTE MAZORRA HERRERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA			
DEPENDENCIA:	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN	
PROYECTO:	377 / AH. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA	
OBJETIVO:	4422. EJECUCIÓN DE COMPONENTES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO	
INDICADOR:	4695. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE	
MÉTODO DE CÁLCULO			

(EXPEDIENTES TECNICOS DEL COMPONENTE PROAGUA/TOTAL DE EXPEDIENTES DE COMPONENTES ASIGNADOS PROAGUA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN					VALOR	UNIDAD DE MEDIDA				
VARIABLE	ETC PROAGUA	EXPEDIENTES TECNICOS DEL COMPONENTE PROAGUA					0.29	EXPEDIENTE				
CONSTANTE	TECAPROAGUA	TOTAL DE EXPEDIENTES DE COMPONENTES ASIGNADOS PROAGUA					2.00	EXPEDIENTE				

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50	14.50	14.50	14.00	14.00	14.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00

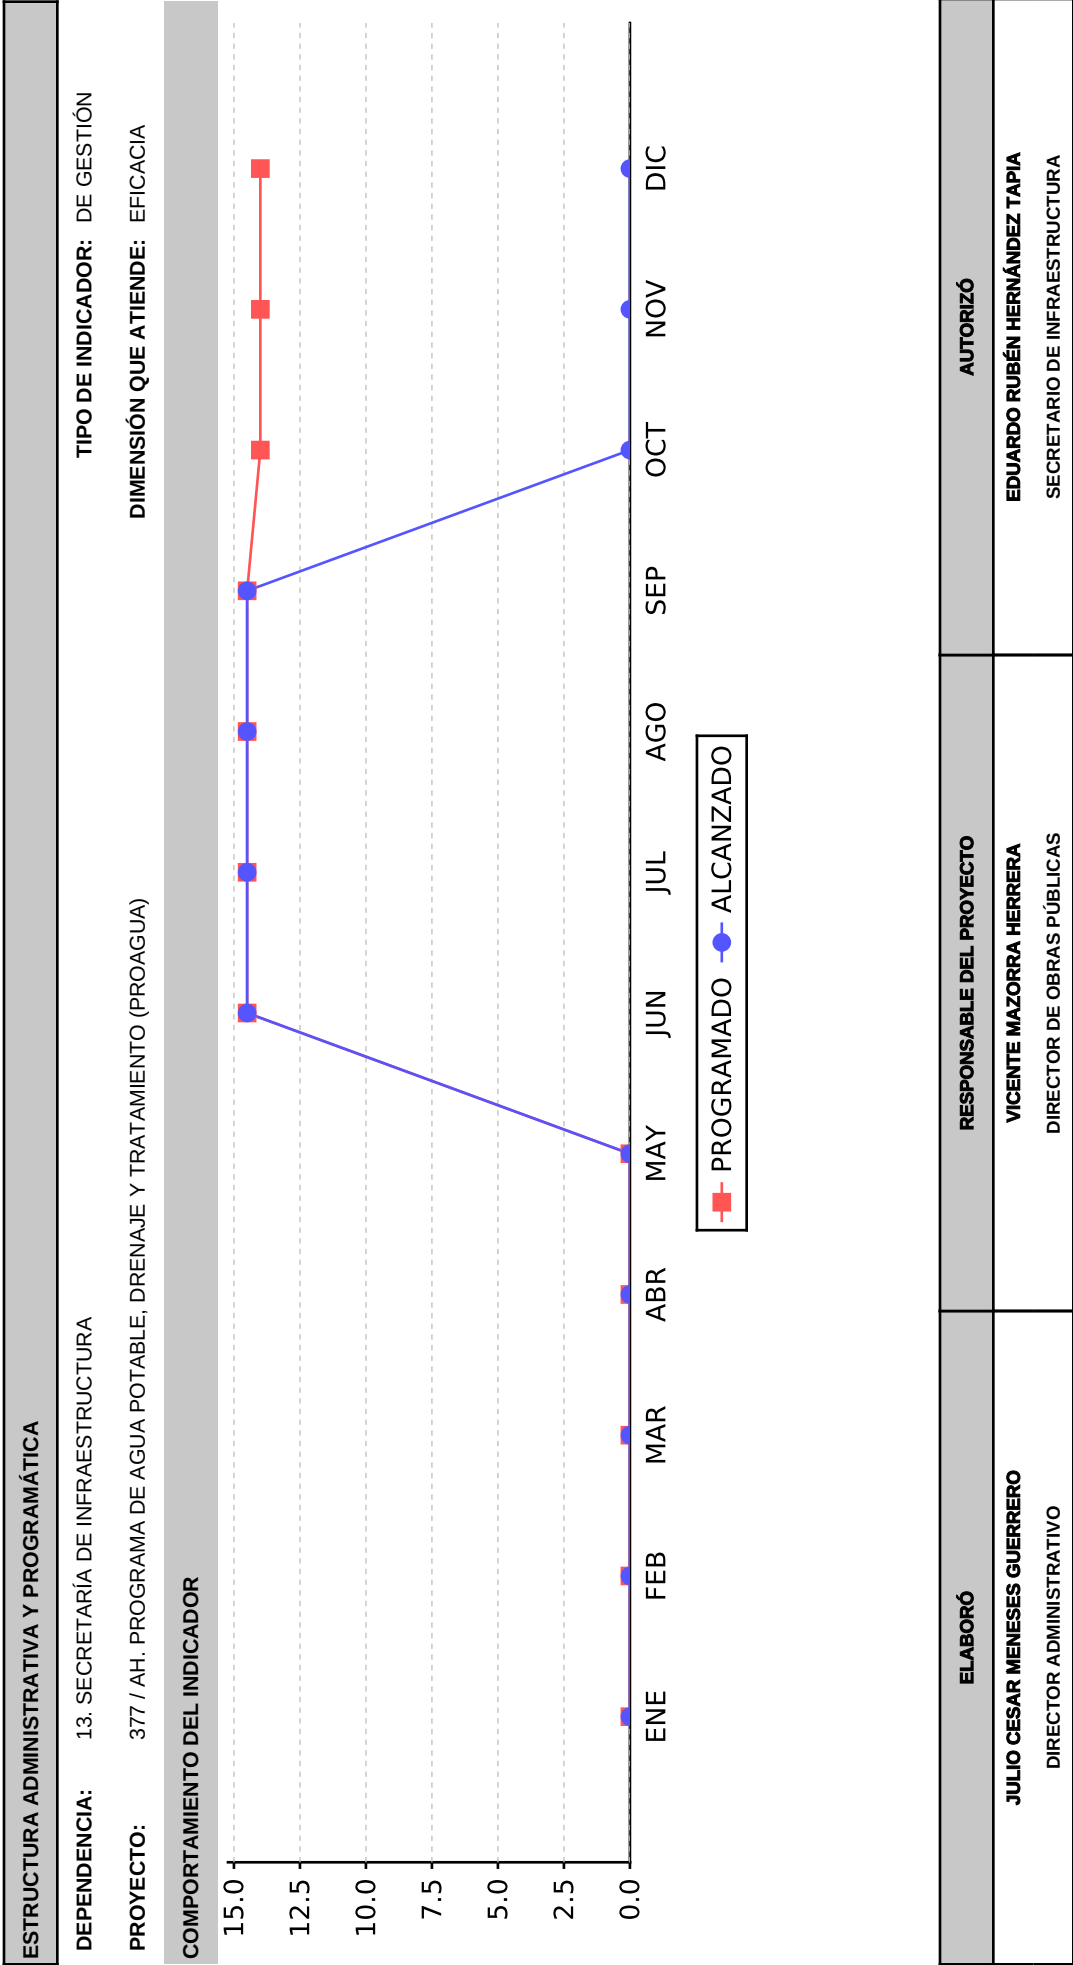

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												
DEPENDENCIA:	13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN						
PROYECTO:	377-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)					DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA						
OBJETIVOS:	4422-EJECUCIÓN DE COMPONENTES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)					UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE						
INDICADOR:	4695-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE											
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	CONTRATO/EXPEDIENTE DIRECCIÓN DE PROYECTOS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA											
VARIABLE:	EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL COMPONENTE PROAGUA											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JULIO CESAR MENESES GUERRERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VICENTE MAZORRA HERRERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
