

**Tlaxcala, Tlax., a 30 de mayo de 2022
Oficio. - SI-DA-1200/2022**

**MTRO. RODRIGO CERDA CORNEJO
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN
DE LA COORDINACIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
PRESENTE**

En relación al programa Integración Regional Ordena y Sustentable para el presente Ejercicio Fiscal y para dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar de forma impresa el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable de los indicadores generados por el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), correspondientes al mes de mayo del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

- 3 JUN 2022

TEKESA GLEZ. 11.03
RECIBIDO

**C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

c.c.p. Arq. Alfonso Sánchez García. – Titular de la Secretaría de Infraestructura. – Para su Conocimiento.
c.c.p. Archivo.
AAB/RPA

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala: la versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcalaenlinea.gob.mx:8080/cityfirma/verify.zul> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.



Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



DIRECCION ADMINISTRATIVA

<https://si.tlaxcala.gob.mx>



jsLDs77WqQRjIjICEgpA3EZY

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: 61. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

PERIODO: MAYO

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.		
1.2	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO VIAL		
1.3	ACTIVIDAD	NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRA MULTIANUAL		



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 61 / 1P. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 598. PROMOCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS - CULTURALES - SALUD MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 600. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA/OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO INFRAESTRUCTURA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	AOSEI	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA	3.00	OBRA
CONSTANTE	OSPI	OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO INFRAESTRUCTURA	15.00	OBRA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 61 / 1P. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

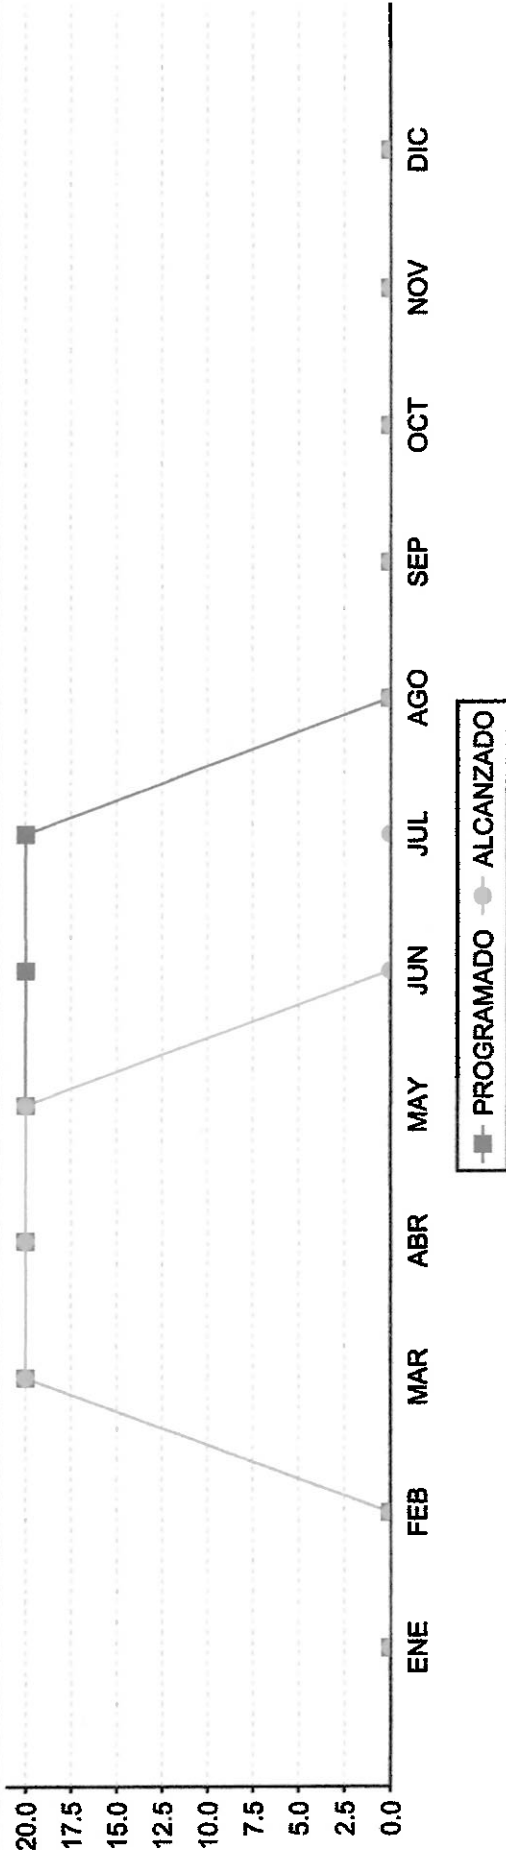

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 61-INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 598-PROMOCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS - CULTURALES - SALUD MULTIFUNCIONALES **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE
ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO

INDICADOR: 600-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTPS://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES](https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/seguimiento-de-indicadores)

VARIABLE: AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARC. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARC. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 61 / 1P. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 599. GESTIÓN E IMPULSO DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTES PEATONALES O PASOS VEHICULARES A DESNIVEL)

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 601. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO VIAL

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA VIAL/OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO INFRAESTRUCTURA VIAL)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	AOSEIV	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA VIAL	1.00	OBRA
CONSTANTE	OSPIV	OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO INFRAESTRUCTURA VIAL	2.00	OBRA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 61 / 1P. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

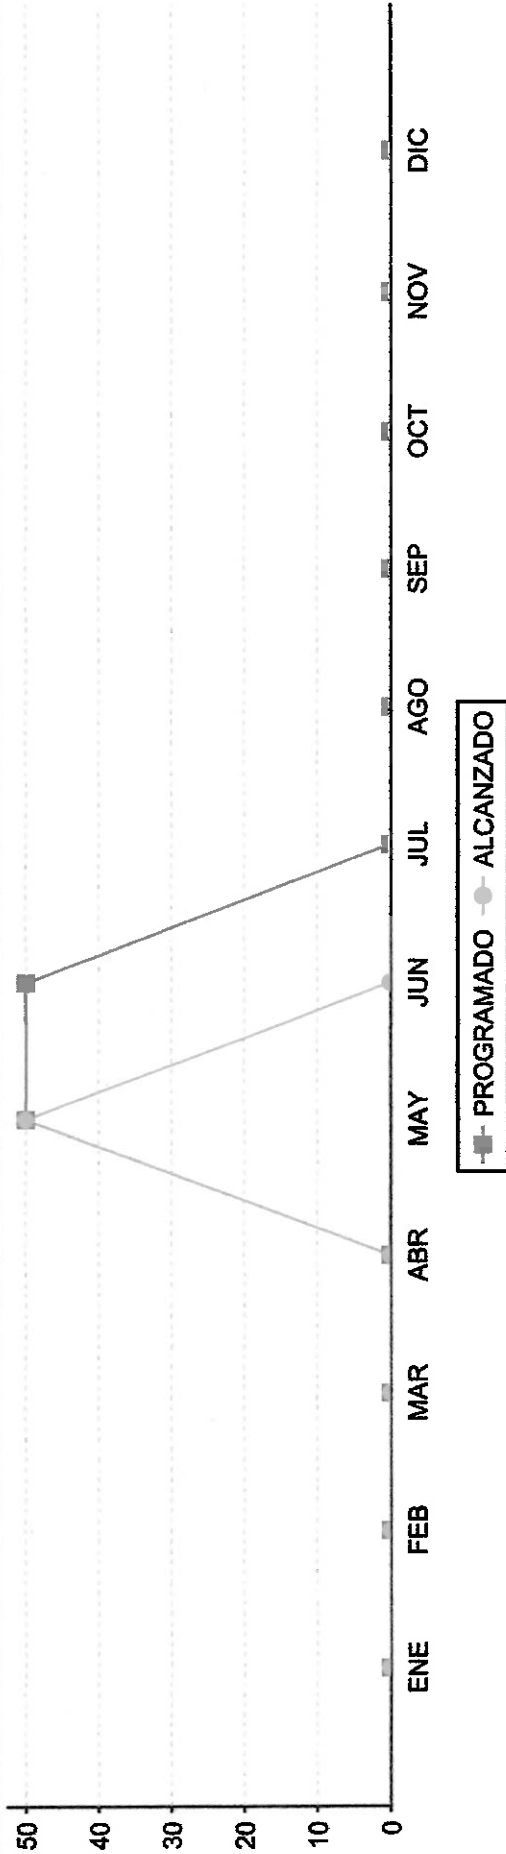

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARG. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARG. ALFONSO SANCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 61-INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 599-GESTIÓN E IMPULSO DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTES PEATONALES O PASOS VEHICULARES A DESNIVEL) **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 601-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO VIAL

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTPS://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/SEGUIMIENTO-DE-INDICADORES](https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/seguimiento-de-indicadores)

VARIABLE: AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA VIAL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARG. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARG. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 61 / 1P. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 600. SUPERVISIÓN DE OBRA AÑOS ANTERIORES

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 603. NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRA MULTIANUAL

UNIDAD DE MEDIDA: SUPERVISIÓN

MÉTODO DE CÁLCULO

CONTRATOS MULTIANUALES A EJECUTARSE EN EJERCICIO FISCAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR		DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
TIPO	ELEMENTO			
VARIABLE	CMEEF	CONTRATOS MULTIANUALES A EJECUTARSE EN EJERCICIO FISCAL	1.00	SUPERVISIÓN

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 61 / 1P. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

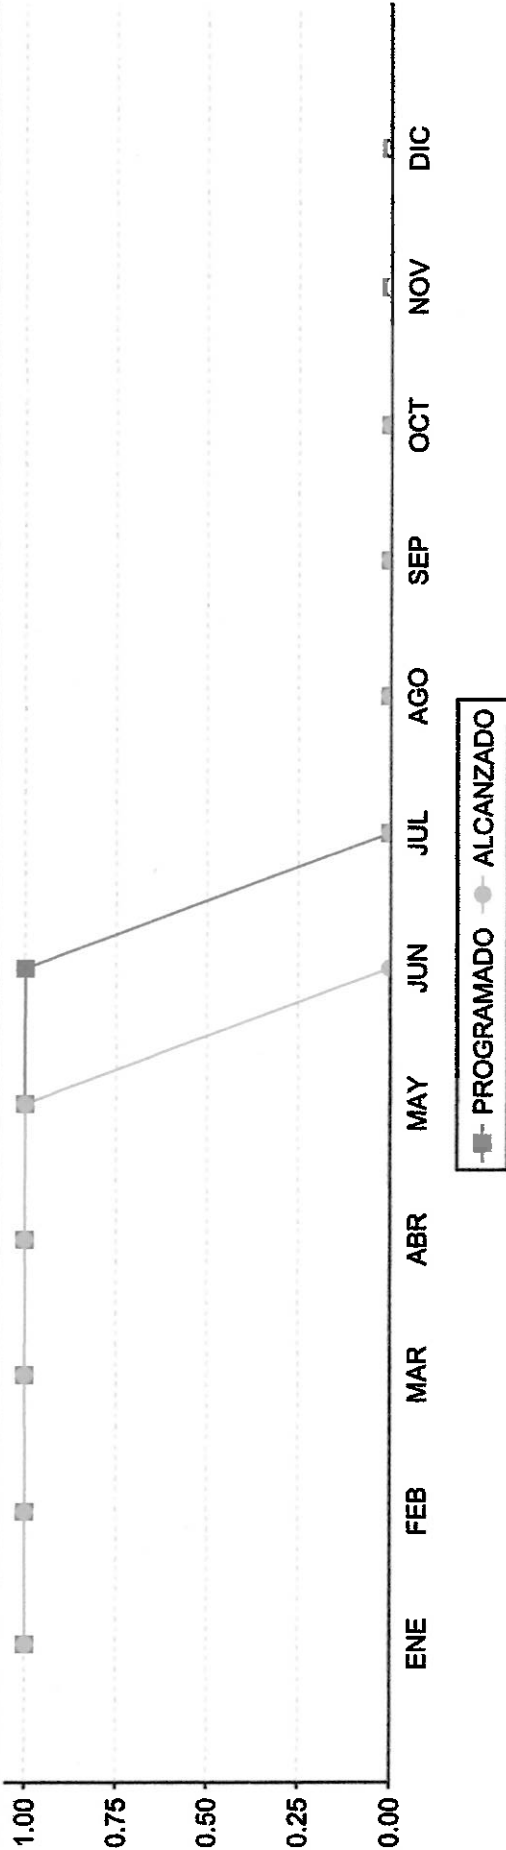

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
--------------------------------	--

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 61-INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 600-SUPERVISIÓN DE OBRA AÑOS ANTERIORES **UNIDAD DE MEDIDA:** SUPERVISIÓN

INDICADOR: 603-NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRA MULTIANUAL

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTPS://SI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/PROG-ANUAL-OBRA](https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/programa-anual-obra)

VARIABLE: CONTRATOS MULTIANUALES A EJECUTARSE EN EJERCICIO FISCAL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

