



Tlaxcala, Tlax., a 14 de octubre de 2019

SEC-DA-1884-2019

C.P. MARTHA AGUILAR TORRENTERA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

En relación al programa Integración Regional Ordena y Sustentable del Ejercicio Fiscal 2019, y para dar cumplimiento a la normatividad vigente, en anexo me permito enviar de forma impresa el formato de: Ficha de Avance de Indicador y Reporte de Variable, de los indicadores generados por el Sistema Integral de Información financiera (SIIF), correspondientes al mes de septiembre de 2019.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE


C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

c.c.p. Ing. Emiliano Alejandro Serrano García. - Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. - Para su Conocimiento. - Presente.

c.c.p. Archivo.

CST/LSV/rpa

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROYECTO: 13. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

PERIODO: SEPTIEMBRE

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.4	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.		
1.5	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.		

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROYECTO: 13 / 0D. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE
OBJETIVO: 721. PROMOCION DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS - CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO.
INDICADOR: 691. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA/OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO INFRAESTRUCTURA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	AOSEI	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA	6.00	OBRA
CONSTANTE	OSPI	OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO INFRAESTRUCTURA	18.00	OBRA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	33.34	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 13 / 0D. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

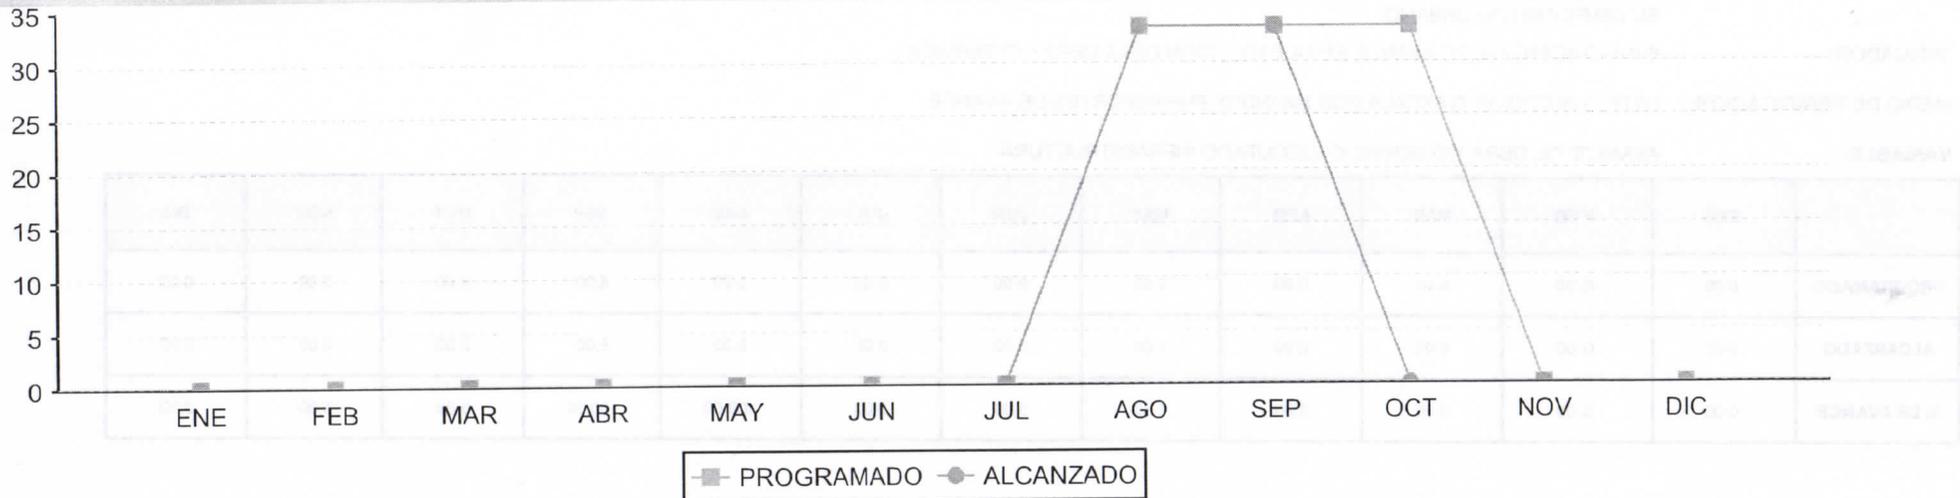

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZO
<p>C.P. CARLOS SANCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>ING PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>ING EMILIANO ALEJANDRO SERRANO GARCÍA TITULAR DE LA ENTIDAD</p>

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 13- INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 721 - PROMOCION DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS - CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 691 - PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: [HTTP://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE](http://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE)

VARIABLE: AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. CARLOS SANCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. EMILIANO ALEJANDRO SERRANO GARCÍA TITULAR DE LA ENTIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROYECTO: 13 / 0D. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE
OBJETIVO: 722. GESTION E IMPULSO DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTES PEATONALES O PASOS VEHICULARES A DESNIVEL).
INDICADOR: 692. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA VIAL/OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO INFRAESTRUCTURA VIAL)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	AOSEIV	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA VIAL	1.00	OBRA
CONSTANTE	OSPIV	OBRA Y/O SERVICIO PROGRAMADO INFRAESTRUCTURA VIAL	4.00	OBRA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 13 / 0D. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. CARLOS SANCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. EMILIANO ALEJANDRO SERRANO GARCÍA TITULAR DE LA ENTIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 13-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 13-INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 722-GESTION E IMPULSO DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTES PEATONALES O PASOS VEHICULARES A DESNIVEL). **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE




INDICADOR: 692-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: HTTP://SECODUVI.TLAXCALA.GOB.MX/INDEX.PHP/REPORTES-DE-AVANCE

VARIABLE: AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA VIAL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
 C.P. CARLOS SANCHEZ TAMAYO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	 EMILIANO ALEJANDRO SERRANO GARCÍA TITULAR DE LA ENTIDAD
